




**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT 9001272015

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0460-2021


2



**Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios
de Lebrija E.S.P.**

TERCER INFORME MENSUAL

"ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA A FIN DE REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"



RECIBIDO

DA	MES	AÑO	HORA
04	03	022	4:45

Camila O.

LEBRIJA, SANTANDER
ENERO DE 2022

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323.
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



CONTENIDO

CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	3
CAPITULO II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONVENIO.....	4
CAPITULO III. EJECUCIÓN CONTRACTUAL	6
CAPITULO IV. BALANCE FINANCIERO	24



CAPITULO I. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

NUMERO DE CONVENIO	0460-2021
FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA A FIN DE REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
CONVENIDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.
VALOR	MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.310.851.431,50)
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO
PRORROGA	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
CDP	CDP No. 21 -00748 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
SUPERVISOR	DONALDO ANDRES DURAN SANDOVAL
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	17 DE JUNIO DE 2022



CAPITULO II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONVENIO

CONTRATO DE OBRA No. 104-2021

FECHA ACTA INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021			
FECHA DE CELEBRACION	11 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CONTRATO No.	104-2021			
CLASE	CONTRATO DE OBRA			
MODALIDAD	INVITACION PRIVADA			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. NIT No. 800.137.201-5 R.L. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS			
CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. NIT No. 901236770-5 R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.			
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.220.014.433,41).			
OBJETO	"CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"			
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES			
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21C00098 21A00187	19 DE OCTUBRE DE 2021	21A00581 21C00338	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
POLIZA DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	NUMERO DE POLIZA		96-44-101167013 96-40-101058941	
	FECHA DE APROBACIÓN		16 DE NOVIEMBRE DE 2021	



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 106-2021

FECHA ACTA INICIO	16 DE NOVIEMBRE			
FECHA DE CELEBRACION	16 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CONTRATO No.	106-2021			
CLASE	CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. NIT No. 800.137.201-5 R.L. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS			
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga. NIT # 1098636067-0			
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)			
OBJETO	"INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA -SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER."			
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES			
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21A00203	16/11/2021	21A00584	16/11/2021
POLIZA DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL S.A.	
	NUMERO DE POLIZA		I-100007672	
	FECHA DE APROBACIÓN		16/11/2021	



CAPITULO III. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Contrato de Obra e Interventoría, se han realizado Comités de Obra con frecuencia mínima de 1 reunión quincenal y esporádicamente según la necesidad que se ha presentado; Comités de los cuales reposan Actas y se anexan a este informe.

Como parte de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 106-2021, se tiene la presentación de Informes semanales, los cuales han sido entregados a la empresa por parte del Contratista de Interventoría (Véase Anexos). Así mismo, el Contratista de Obra presentó informe quincenal de ejecución.

EJECUCION DE ACTIVIDADES

Las actividades realizadas por el contratista de obra a la fecha de 16 de diciembre con relación al objeto contractual del presente Convenio Interadministrativo fueron las siguientes:

AVANCE FISICO DE LA OBRA	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE	19%
---------------------------------	---	------------

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1.01	Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)	El contratista ejecutó la instalación de la valla informativa de la ejecución del proyecto CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.02	Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)	El contratista realizó la respectiva señalización en el área de trabajo con el objetivo de dejar en evidencia el riesgo que hay en la obra con sus respectivas prevenciones.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.03	Cerramiento con tela de polipropileno	El contratista ejecutó el cerramiento del contorno de la calle séptima, con la finalidad de impedir posibles accidentes de obra al aislar el área de trabajo del paso de peatones y automóviles.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.04	Campamento (Área min. 25,00 M2)	El contratista obtuvo el arriendo de un campamento aledaño a la obra, en donde está disponible para el almacenamiento de herramienta menor y equipos.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA




1.05	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	El contratista elaboro actividades diarias de topografía en la medición y replanteo para el control de la obra, garantizando la correcta instalación de tubería de alcantarillado y pluvial.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.09	Desinstalación de Tubería	El contratista ejecutó la labor de desinstalación de tubería existente de la calle séptima, por motivo de que se instaló una tubería nueva para realizar su funcionamiento.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.12	Entibados para excavación Prof. = o > a 1,60 mts	El contratista por cada avance de excavación de tubería se realizó la entibación de las zanjas para evitar cualquier movimiento de tierra que pueda perjudicar al personal de la obra.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
1.13	Manejo de Aguas	El contratista ejecutó el manejo de aguas a través de la instalación de tuberías.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.01	Excavación en material común	El contratista ejecutó la excavación en material común por medio de la utilización de retroexcavadora para llegar a la profundidad de la instalación de tubería de alcantarillado y aguas lluvias	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.02	Excavación manual en material común	El contratista hizo la excavación manual en material común para encontrar las domiciliarias y así realizar el respectivo cambio de tubería y cajas de inspección.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.03	Relleno compacto material común	El contratista elaboró Relleno compacto material común sobre la tubería principal y domiciliaria.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.04	Relleno con material seleccionado	El contratista realizó el relleno con material seleccionado sobre la tubería principal y domiciliaria.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.05	Relleno en arena para asentar tubería	El contratista realizó el Relleno en arena para asentar tubería sobre la tubería principal y domiciliaria.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
2.06	Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado	El contratista realizó el Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado por medio de camioneta de carga con ayuda de la retro excavadora.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
3.06	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24"	El contratista ejecutó el Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24" para el manejo de aguas lluvias	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
3.08	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16"	El contratista ejecutó el Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16" para el manejo de aguas residuales.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA
3.14	Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm	El contratista ejecutó las conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm para y así realizar el respectivo cambio de tubería y cajas	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA




	Longitud \leq a 6,0 m	de inspección.	
4.03	Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)	El contratista ejecutó la realización de pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts) para aguas sanitarias.	INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE AVANCE DE OBRA

ITEM 1.01: Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)



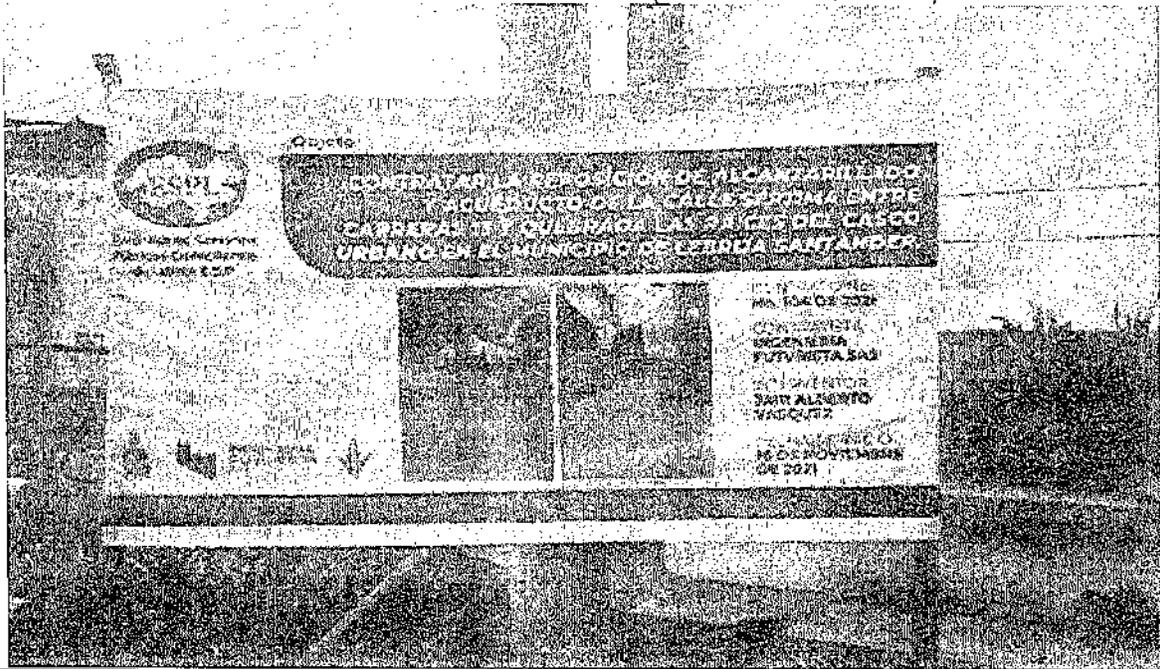


ITEM 1.02: Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)

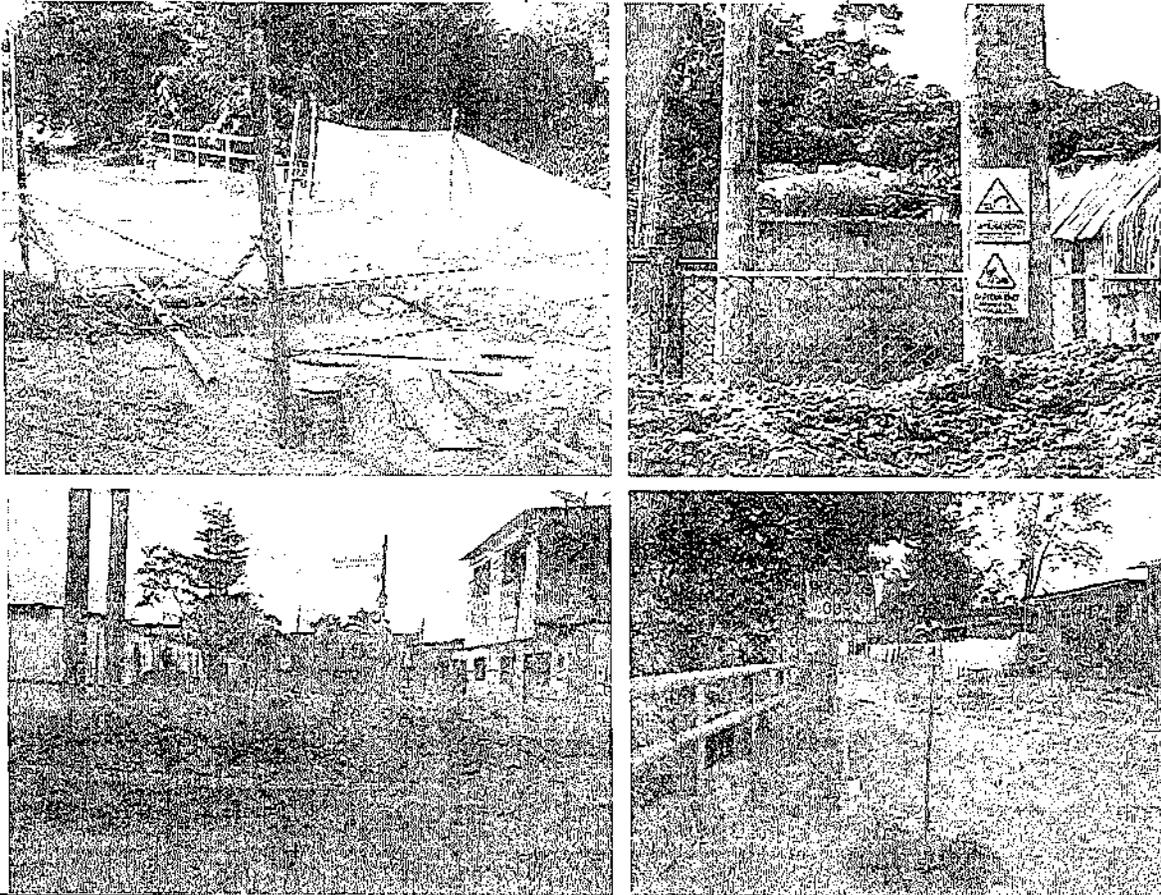




ITEM 1.03: Cerramiento con tela de polipropileno

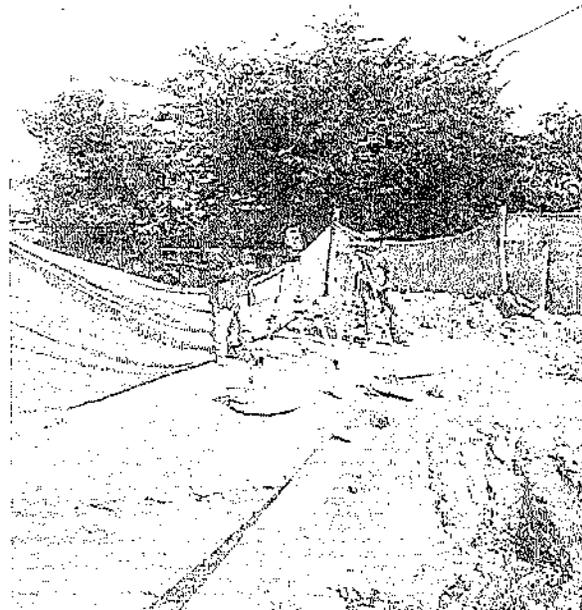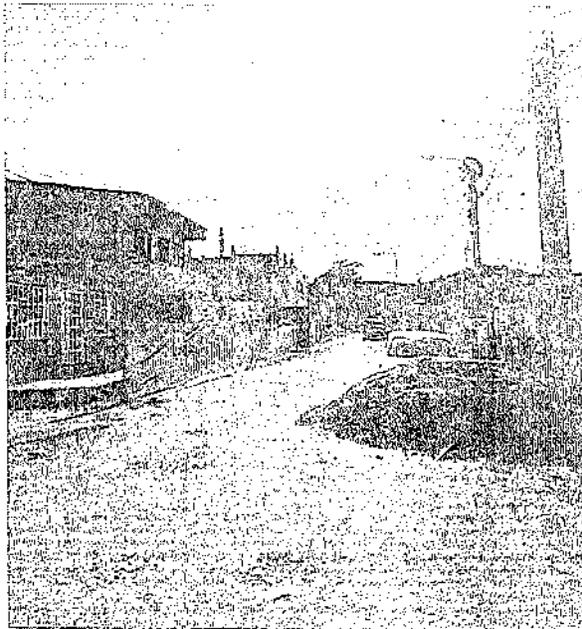
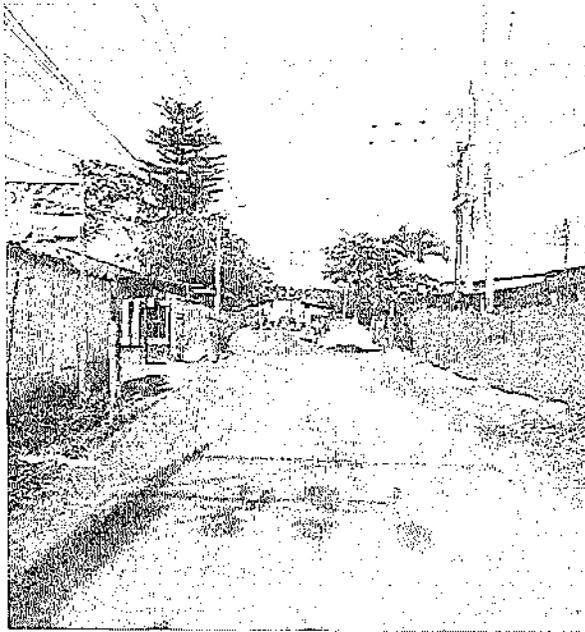


ITEM 1.04: Campamento (Área min. 25,00 M2)

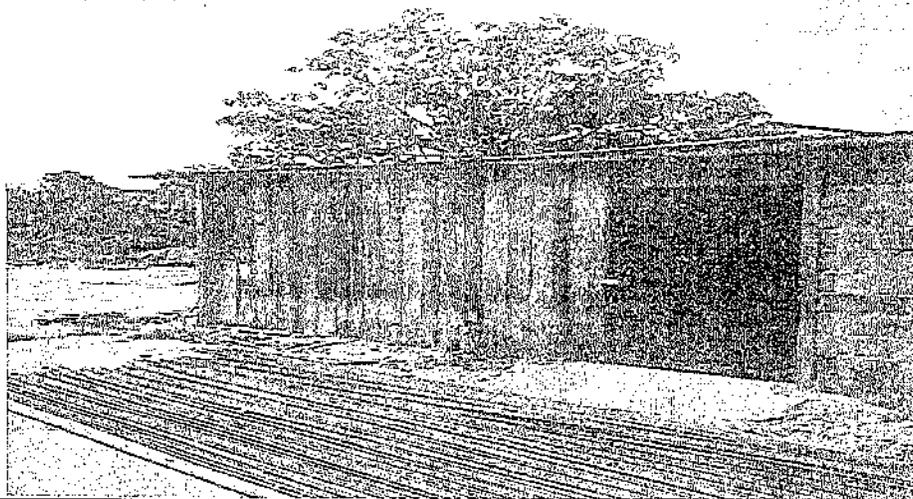



ITEM 1.05: Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)

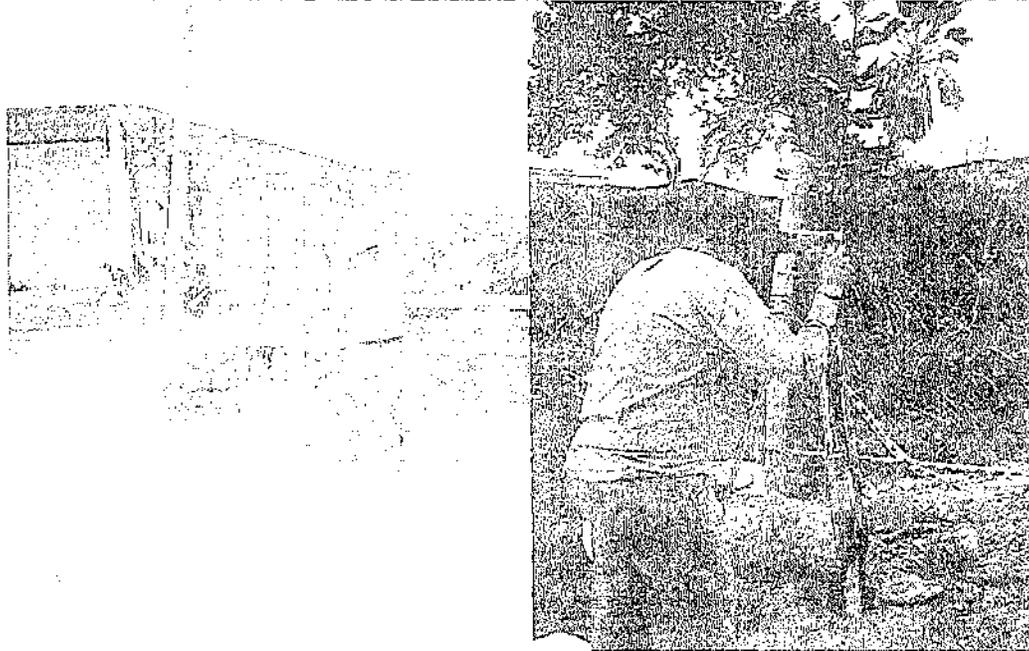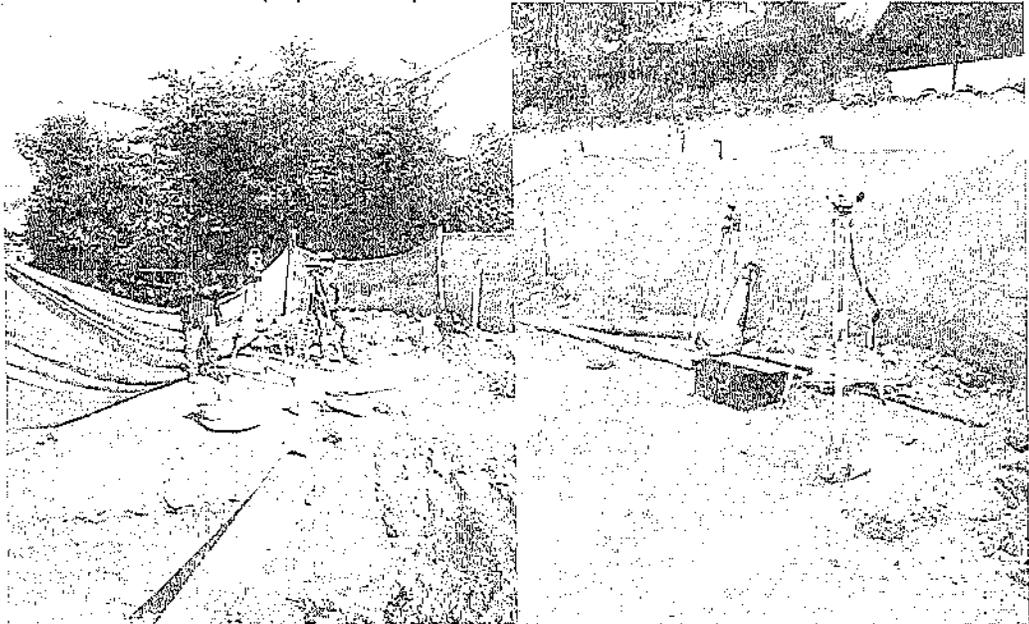



ITEM 1.09: Desinstalación de Tubería





ITEM 1.12: Entibados para excavación Prof. = o > a 1,60 mts




ITEM 1.13: Manejo de Aguas





ITEM 2.01: Excavación en material común

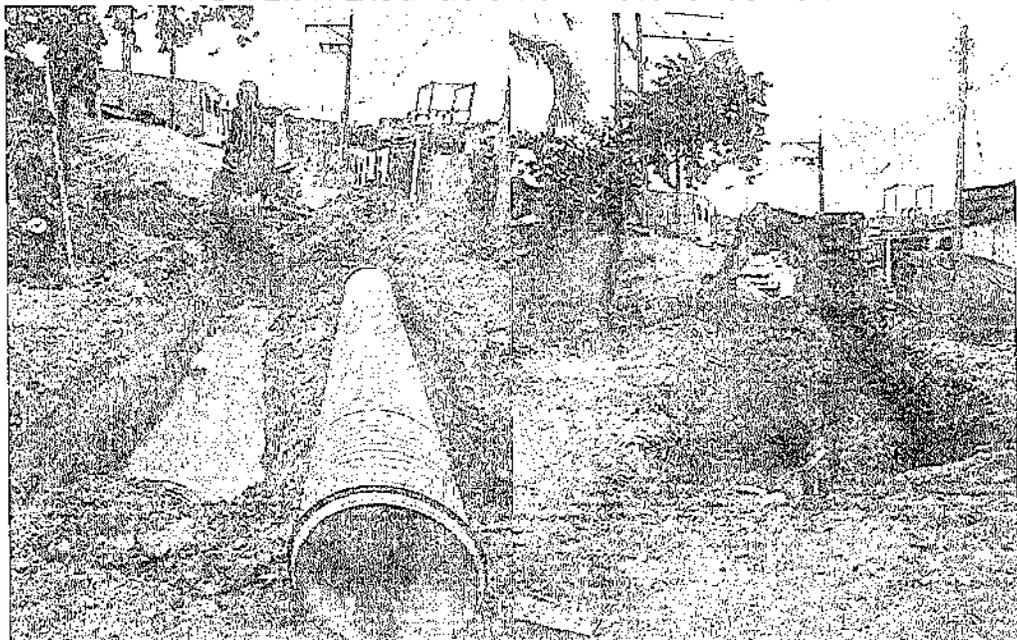




ITEM 2.02: Excavación manual en material común






ITEM 2.03: Relleno compacto material común

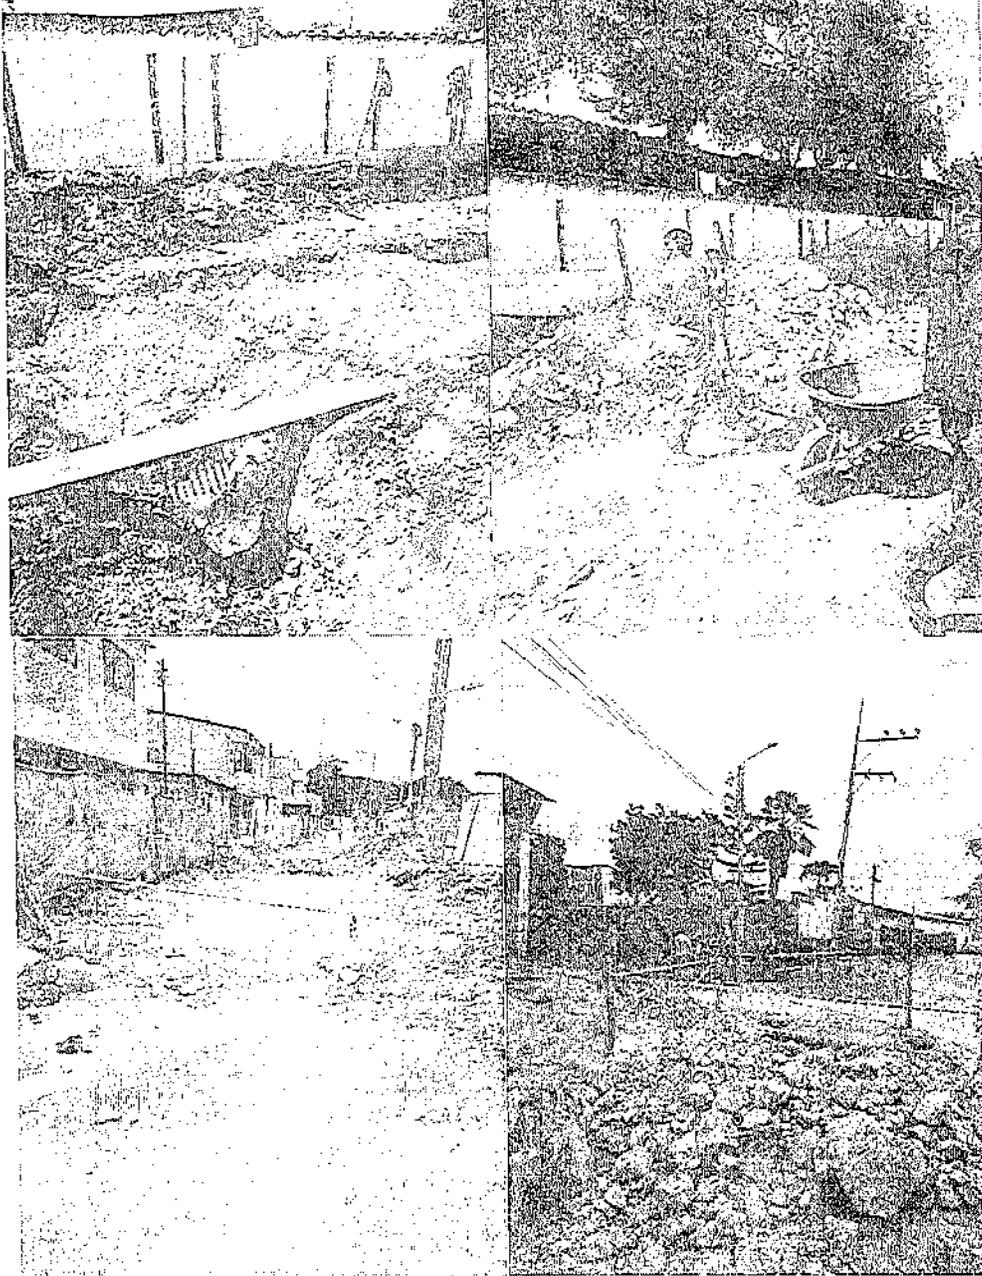

ITEM 2.04: Relleno con material seleccionado



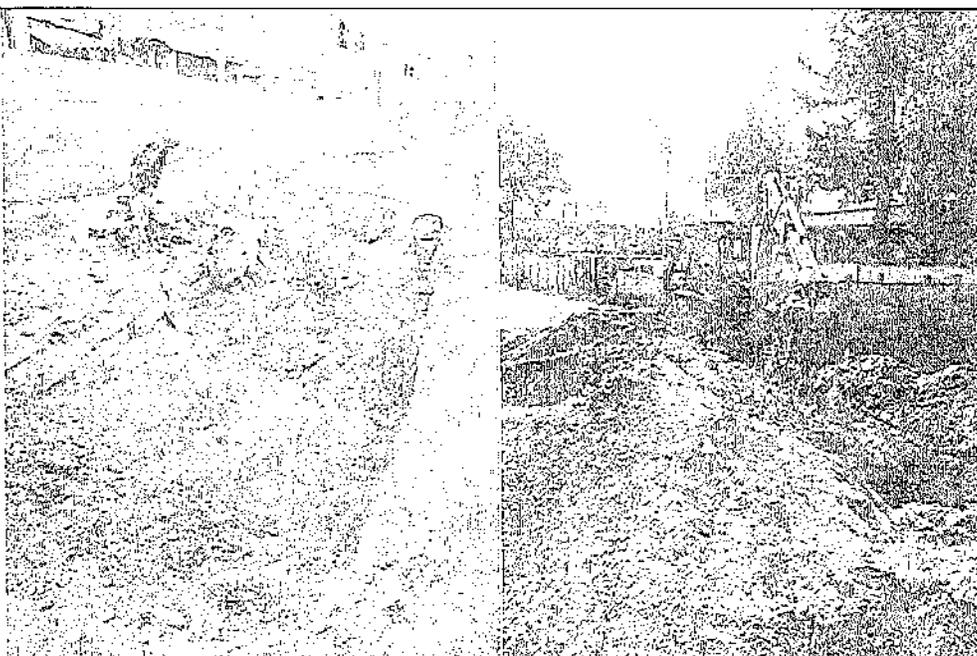


ITEM 2.05: Relleno en arena para asentar tubería





ITEM 2.06: Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado

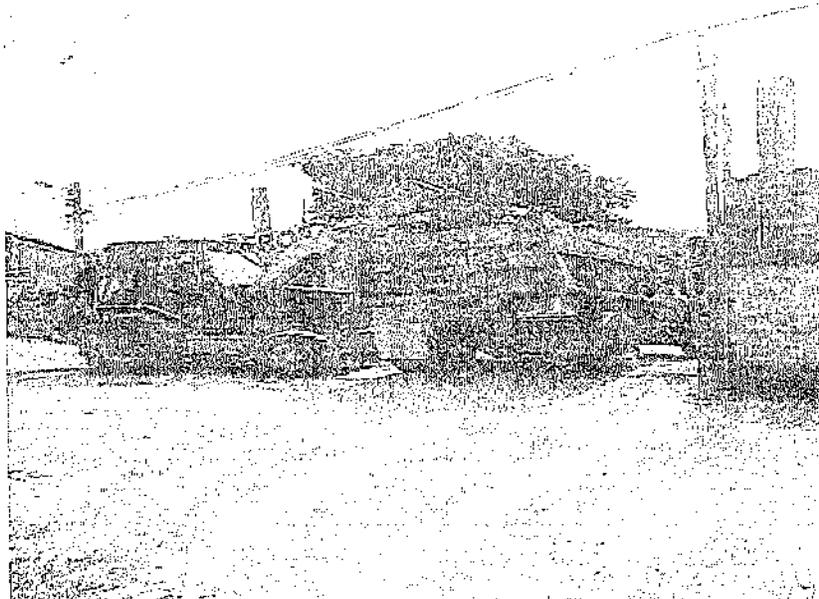

ITEM 3.06: Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24"






ITEM 3.08: Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16"






ITEM 3.08: Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm



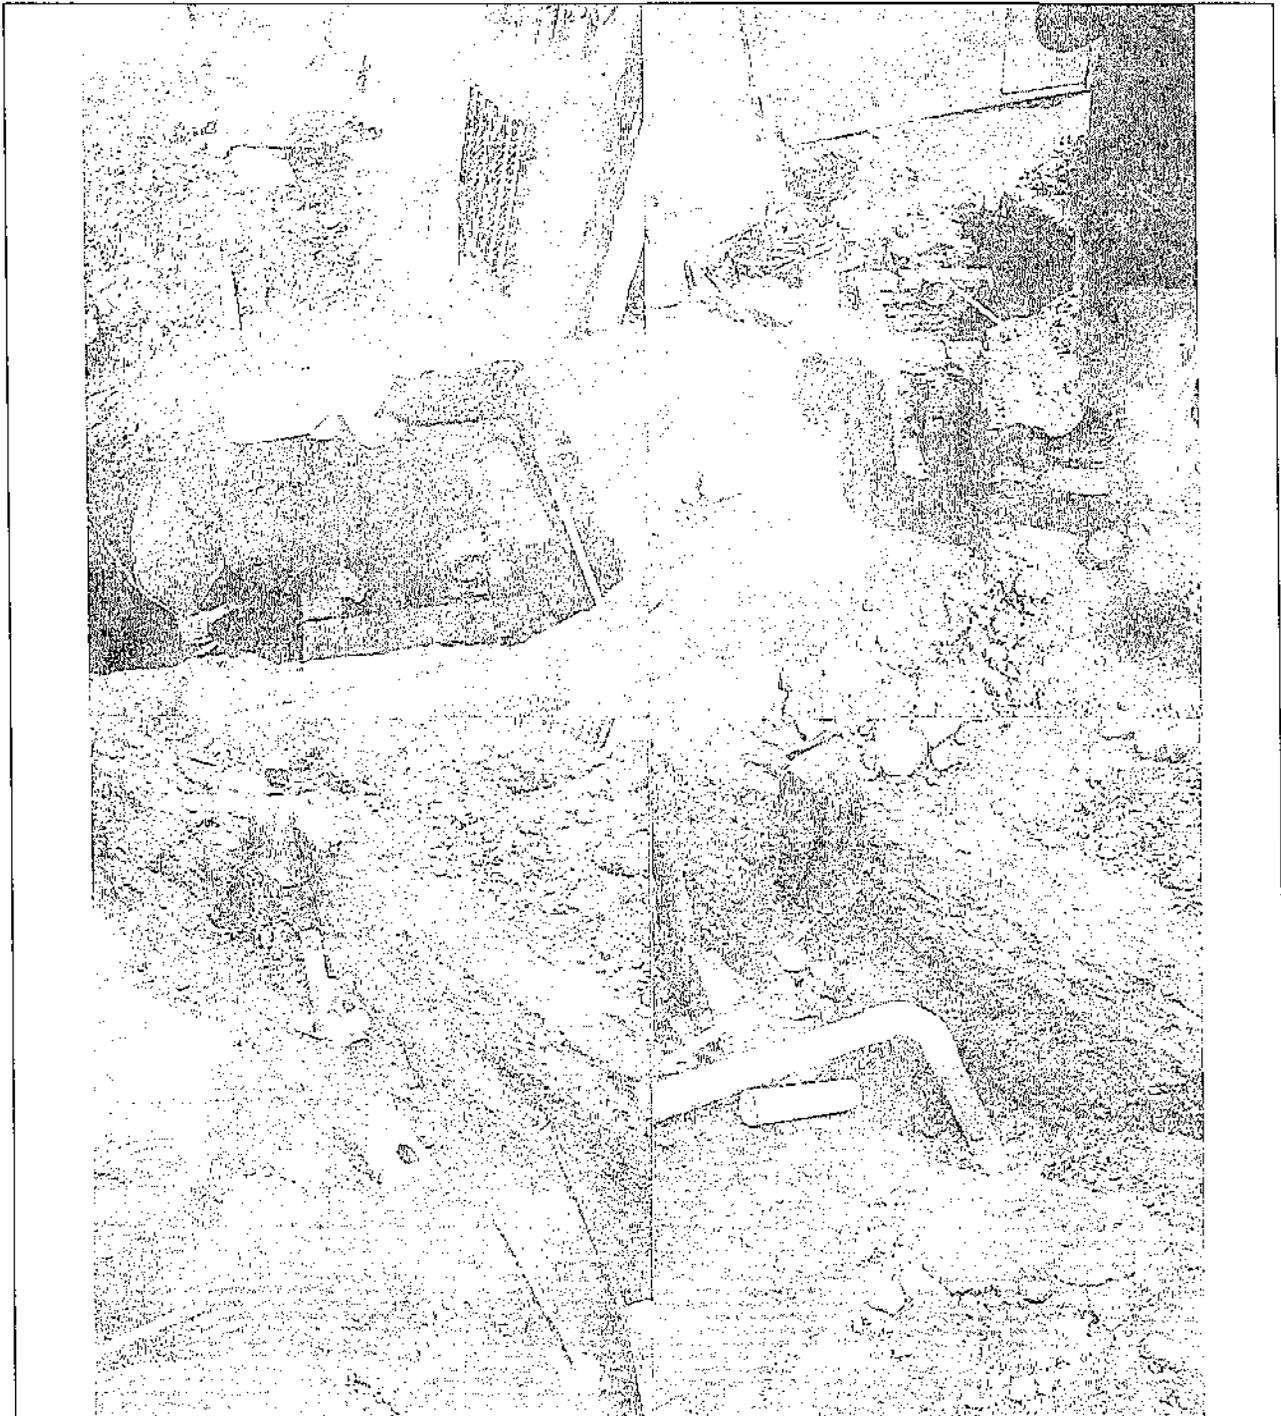

ITEM 4.03: Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)

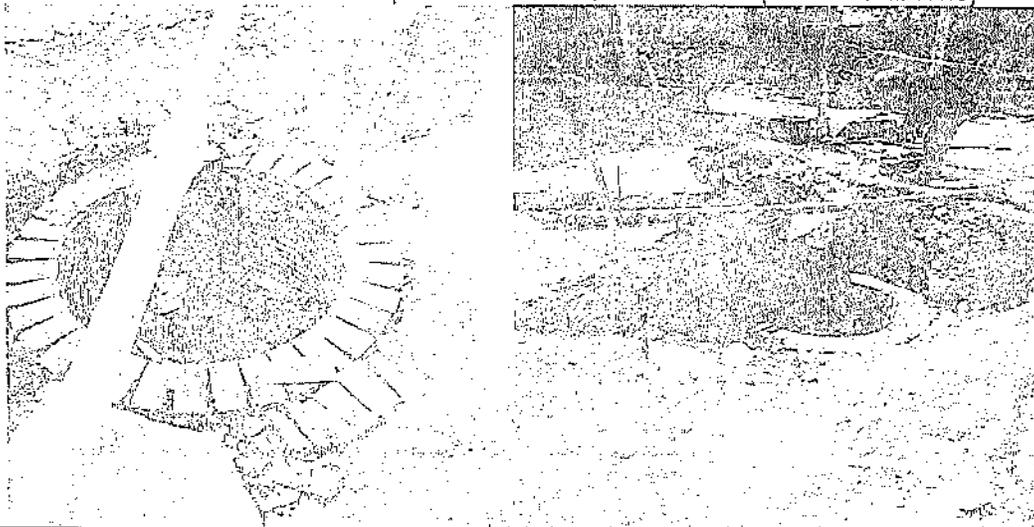



RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro. El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son: director de obra, residente de obra, siso y obreros.

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIAL DE OBRA	2
OBREROS	7
PERSONAL TOTAL	13



RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL No. 01	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
1.0	PRELIMINARES				\$ 128.638.931,62		\$ 30.980.595,00
1.01	Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)	UN	1,00	\$833.580,00	\$ 833.580,00	1,00	\$833.580,00
1.02	Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)	MES	2,00	\$2.057.500,00	\$ 4.115.000,00	1,00	\$2.057.500,00
1.03	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	550,50	\$22.770,00	\$ 12.534.885,00	180,00	\$4.098.600,00
1.04	Campamento (Area mín. 25.00 M2)	GLB	1,00	\$1.910.571,00	\$ 1.910.571,00	1,00	\$1.910.571,00
1.05	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	MES	4,00	\$4.734.800,00	\$ 18.939.200,00	1,00	\$4.734.800,00
1.06	Demolición de Pavimento Flexible	M2	164,12	\$16.350,00	\$ 2.683.362,00		\$ -
1.07	Corte de Pavimento con Máquina para E = 3 cm.	ML	44,20	\$ 5.073,00	\$ 224.226,60		\$ -
1.08	Demolición de Pozos existentes.	UND	3,00	\$440.550,00	\$ 1.321.650,00		\$ -
1.09	Desinstalación de Tubería.	ML	251,90	\$16.952,00	\$ 4.270.208,80	94,00	\$1.593.488,00
1.12	Entibados para excavación Prof. = o > a 1,60 mts.	ML	955,58	\$59.157,00	\$ 56.529.246,06	184,00	\$10.884.888,00
1.13	Manejo de Aguas	ML	955,58	\$26.452,00	\$ 25.277.002,16	184,00	\$4.867.168,00
2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 106.342.252,80		\$ 52.350.325,70
2.01	Excavación en material común	M3	591,06	\$ 42.860,00	\$ 25.332.831,60	341,65	\$14.643.119,00
2.02	Excavación manual en material común	M3	75,17	\$ 48.510,00	\$ 3.646.496,70	18,62	\$ 903.256,20
2.03	Relleno compacto material común	M3	387,99	\$ 59.760,00	\$ 23.186.282,40	98,60	\$ 5.892.336,00
2.04	Relleno con material seleccionado	M3	226,42	\$ 94.455,00	\$ 21.386.501,10	147,90	\$13.969.894,50
2.05	Relleno en arena para asentar tubería	M3	152,75	\$ 98.940,00	\$ 15.113.085,00	64,40	\$ 6.371.736,00
2.06	Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado	M3	460,34	\$38.400,00	\$ 17.677.056,00	275,26	\$10.569.984,00
3.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA				\$ 301.964.185,20		\$ 82.547.048,00
3.02	Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM	ML	481,00	\$106.051,00	\$ 51.010.531,00		\$ -
3.04	Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 2" Incl. Accesorios UM	ML	6,00	\$ 58.736,00	\$ 352.416,00		\$ -
3.06	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24"	ML	222,70	\$ 588.909,00	\$ 131.150.034,30	90,00	\$53.001.810,00
3.07	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 20"	ML	22,10	\$ 396.855,00	\$ 8.770.495,50		\$ -
3.08	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16"	ML	229,80	\$ 249.063,00	\$ 57.234.677,40	94,00	\$23.411.922,00
3.10	Suministro e Instalación Válvula Compuerta de cierre 4" 300 psi	UNID	4,00	\$1.337.206,00	\$ 5.348.824,00		\$ -
3.11	Suministro e Instalación Válvula purga 2"	UNID	1,00	\$ 760.610,00	\$ 760.610,00		\$ -
3.14	Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud < o = a 6,0 m	UNID	29,00	\$876.188,00	\$ 25.409.452,00	7,00	\$6.133.316,00
3.15	Conexiones domiciliarias Hidraulicas de 1/2" Longitud < o = a 6,0 m	UNID	29,00	\$ 750.937,00	\$ 21.777.173,00		\$ -
3.16	Conexión a Pozos Existentes (Incluy. Demolicion y embone)	UNID	1,00	\$ 149.972,00	\$ 149.972,00		\$ -
4.0	OBRAS DE DRENAJE				\$ 69.871.304,00		\$ 4.586.048,00
4.02	Sumidero SL-200	UND	8,00	\$3.001.353,00	\$ 24.010.824,00		\$ -
4.03	Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)	UND	10,00	\$4.586.048,00	\$ 45.860.480,00	1,00	\$ 4.586.048,00
5.0	ESTRUCTURA PAVIMENTO				\$ 289.452.913,50		\$ -
5.01	Base Granular Compactada	M3	279,60	\$133.670,00	\$ 37.374.132,00		\$ -

Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagra@empulebrija.gov.co



5.02	Pavimento en concreto hidráulico vehicular de 4500 psi	M3	279,60	\$787.464,00	\$ 220.174.934,40	\$ -
5.03	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	3160,10	\$ 7.061,00	\$ 22.313.466,10	\$ -
5.04	Juntas para pavimento rígido longitudinal	ML	233,00	\$ 13.681,00	\$ 3.187.673,00	\$ -
5.05	Juntas para pavimento rígido transversal	ML	468,00	\$ 13.681,00	\$ 6.402.708,00	\$ -
6.0	ENSAYOS DE LABORATORIO				\$ 7.444.808,00	\$ -
6.01	Ensayos de laboratorio de Proctor Modificado y CBR en muestra inalterada	UND	2,00	\$762.092,00	\$ 1.524.184,00	\$ -
6.02	Ensayos de laboratorio de densidad de campo	UND	48,00	\$108.392,00	\$ 5.202.816,00	\$ -
6.03	Ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión	UND	14,00	\$ 51.272,00	\$ 717.808,00	\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 903.714.395,12	\$ 170.464.016,70
ADMINISTRACIÓN			29%		\$ 262.077.174,58	\$ 49.434.564,84
IMPREVISTOS			1%		\$ 9.037.143,95	\$ 1.704.640,17
UTILIDAD			5%		\$ 45.185.719,76	\$ 8.523.200,84
TOTAL (AIU)			35%		\$ 316.300.038,29	\$ 59.662.405,85
ACUMULADO COSTO TOTAL					\$ 1.220.014.433,41	\$ 230.126.422,55



CAPITULO IV. BALANCE FINANCIERO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0460-2021	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$1.310.851.431,50
Valor Aporte Municipio pagado	\$1.300.851.431,50
Valor Aporte Empulebrija	\$10.000.000
VALOR COMPROMETIDO	\$1.310.385.872,41
Valor Contrato Obra	\$1.220.014.433,41
Valor contrato Interventoría	\$90.371.439,00
Valor No Comprometido	\$465.559,09

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA No. 104-2021	
Valor total del contrato	\$1.220.014.433,41
Valor anticipo	\$366.004.430,02
Valor Acta de pago No. 01	\$230.126.422,55
Saldo por cancelar	\$623.883.580,84

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 106-2021	
Valor total del contrato	\$90.371.439,00
Valor total pagado	\$0,0
Saldo por cancelar	\$90.371.439,00

De esta forma se presenta el Tercer Informe Mensual con relación a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0460-2021 en Lebrija, a los 26 días del mes de enero de 2021,

Atentamente,

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General E.S.P.L.

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico-Operativo

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y
