

Lebrija, 18 de agosto de 2022

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Ate.: Ing. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ

Supervisor

Calie 11 No. 8-73 Lebrija - Santander

Ref.: Contrato de Interventoría N.º 06-2021, cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N.º 04-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION INFORME No. 11

Yo, **JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO**, me permito hacer entrega del informe No. 11, del contrato en cuestión, comprendido en el periodo entre el 01 de agosto y 15 de agosto del 2022.

El siguiente informe contiene la información de los contratos de obra e interventoría del objeto en cuestión, así como las actividades realizadas en cada uno de los contratos en el periodo del presente informe.

Me declaro responsable por toda la información aquí reportada.

Cordialmente



JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
C.C. 1898.638.067 de Bucaramanga
INTERVENTOR

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA E.S.P.

INTERVENTORIA PARA EL
CONTRATO DE OBRA N° 104-2021
QUE TIENE COMO OBJETO
CONTRATAR LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE
CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS
RAICES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 11

LEBRIJA, SANTANDER

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2022



INTRODUCCIÓN

El proyecto "**CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**", se encuentra localizado en el municipio de Lebrija, en el Departamento de Santander, específicamente en la calle 7 con carrera 13 y quebrada Las Raíces.

Localización geográfica de proyecto - Departamento de Santander - Municipio de Lebrija

El proyecto "**CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**", contempla las siguientes actividades generales:

CALLE 7 se va a reponer la red matriz de alcantarillado sanitaria (existente), y paralelo se va a construir el alcantarillado pluvial, para iniciar la separación de las aguas conducidas a flujo libre, de la misma manera se va a hacer el cambio de la tubería de acueducto, con el fin de garantizar las diferentes presiones en cada una de las viviendas, para luego aplicar capa de pavimento rígido, y cambiar por completo estado actual de la vía en mención.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	106 DEL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO	\$90,371.439.00
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	QUE NO SUPERE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 2	17 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 3	16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 4	31 DE AGOSTO DE 2022
PERIODO EJECUTADO	01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2022
POR EJECUTAR	16 DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	64.45%

RECURSOS FÍSICOS

Materia: de oficina: Los profesionales a cargo de llevar a cabo la interventoría, cuentan con todos los recursos físicos necesarios para realizar el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares con cámara.

RECURSOS HUMANOS

PROFESIONALES INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	SIERVO ANTONIO GALLO REY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA

FECHA	CLASE	OBSERVACION
16-11-21	INICIO	Se da inicio al contrato de interventoría 106 de 2021.
24-12-21	SUSPENSIÓN	Se suspende el contrato de interventoría 106 de 2021 hasta el 10 de enero de 2022.
11-01-22	REINICIO	Se reinicia el contrato de interventoría 106 hasta el 16 de enero de 2022.
13-01-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 4 meses, hasta el 17 de mayo de 2022.
17-05-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 2 meses, hasta el 16 de julio de 2022.
15-07-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 45 días, hasta el 31 de agosto de 2022.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Aseguradora: Compañía mundial de seguros S.A.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
1-100007672	CUMPLIMIENTO	15/07/2022	31/12/2022
1-100007672	PRESTACIONES SOCIALES	15/07/2022	31/08/2025
1-100007672	CAUDAL DEL SERVICIO	31/08/2022	31/08/2027

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	No. 104 DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.220.014.433,41
CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA SAS
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA S.S.P.
INTERVENTOR	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No 1	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 2	17 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 3	16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 4	31 DE AGOSTO DE 2022
PERIODO EJECUTADO	01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2022
POR EJECUTAR	16 DÍAS
% DE AVANCE EJECUTADO	64.67%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

La interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, llevar un control del estado del proyecto, y validar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, durante el desarrollo de los comités técnicos de obra, emite informe mensual de seguimiento a la programación de obra propuesta por el contratista, donde se presenta la programación mensual y atraso/avance asociado.

RECURSOS FÍSICOS

Maquinaria: Para la ejecución de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el periodo, el contratista ha contado con el equipo mínimo necesario para la ejecución de estos, tales como:

- 1 volquete de capacidad mínima de 7 metros cúbicos
- 1 retrocargador de lantías
- 1 apisonador

Material de oficina: Al igual que el personal de interventoría, el personal administrativo del contratista de obra cuenta con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas.

RECURSOS HUMANOS

La Interventoría luego de revisar la seguridad social, certifica que cada uno de los profesionales y empleados del contratista se encuentra afiliado a la seguridad social.

NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	GPS	ARL	PENSIÓN
1	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO FABIÁN	DIRECTOR	91.263.481	SABANAGRA	POSITIVA	PROTECCIÓN
2	SERRANO MENÉZES JESÚS PEDRO NIL	RESIDENTE	91.513.165	SURA	SURA	PROVENIR
3	HERRERA BAHAMÓN JAVIER FRANCISCO	SEC	7.632.408	NUOVA EPS	SURA	COMPENSACIONES
4	GONZALEZ TENJO MIGUEL MANUEL	TOPOGRAFIA	1.055.812.981	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR
5	ANULLO JEREZ KAROLL DANYESA	AUXILIO	1.025.345.138	COOSALUD	POSITIVA	PROVENIR
6	GONZALEZ LUIS JOAQUÍN	MAESTRO	91.466.686	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR
7	SANCHEZ D. ARTE LUIS CARLOS	CERERO	1.059.582.535	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR
8	GOMEZ BALTISTA JOHÁN SEBASTIÁN	CERERO	1.079.375.951	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR
9	HERNÁNDEZ SANDOVAL DIEGO ALBERTO	CERERO	1.049.576.024	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR
10	GUSTAVO POJAS	CERERO	0.112.879	NUOVA EPS	POSITIVA	COMPENSACIONES
11	VILLAMIZAR HERNÁNDEZ JUAN DAVID	CERERO	1.005.335.783	COOSALUD	POSITIVA	PROVENIR
12	JAMES CAMARGO JESÚS ALEJANDRO	CERERO	88.111.978	COOSALUD	POSITIVA	PROVENIR
13	GARCÍA ROJAS MICHAEL ANDRÉS	CERERO	1.003.740.745	NUOVA EPS	POSITIVA	PROVENIR

Nota: las planillas de seguridad social pagadas por el contratista serán anexadas al informe de obra.

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

FECHA	CLASE	OBSERVACIÓN
16-11-21	INICIO	Se da inicio al contrato de obra 104 de 2021.
24-12-21	SUSPENSIÓN	Se suspende el contrato de obra 104 de 2021 hasta el 10 de enero de 2022.
11-01-22	REINICIO	Se reinicia el contrato de obra 104 hasta el 17 de enero de 2022.
13-01-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 104 de 2021 por 4 meses, hasta el 17 de mayo de 2022.
17-05-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 2 meses, hasta el 16 de julio de 2022.
15-07-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 45 días, hasta el 31 de agosto de 2022.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Durante el periodo no se han hecho cambios y/o modificaciones al contrato de obra.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
96-44-101167013	CUMPLIMIENTO	16/11/2021	31/12/2022
96-44-101167013	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/11/2021	31/12/2022
96-44-101167013	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Se ampara 5 años, 0 meses, 0 días.	
96-44-101167013	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/08/2023
96-40-101058941	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/11/2021	16/07/2022
96-40-101058941	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/11/2021	16/07/2022
96-40-101058941	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/11/2021	16/07/2022

EJECUCIÓN DE OBRA

OBRAS EJECUTADAS:

Durante el periodo del 01 de agosto al 15 de agosto de 2022, se ejecutaron las siguientes actividades:

RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ PROGRAMADO	% PROGRAMADO
01/08/2022	15/08/2022	\$ 62,151,004.89	5.09%

Actividades programadas para el periodo:

- Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheras, cintas reflectivas, alfiler de señalización)
- Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)
- Desinstalación de tubería.
- Enlizados para excavación Prof. = o > a 1,60 mts.
- Manejo de Aguas
- Excavación en material común
- Excavación manual en material común
- Relleno compacto material común
- Relleno con material seleccionado
- Relleno en arena para asentar tubería
- Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado
- Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4' Incl. Accesorios UM
- Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 2' Incl. Accesorios UM
- Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 20"
- Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 12"
- Suministro e Instalación Válvula Compuerta de cierre 4' 300 psi
- Suministro e Instalación Válvula purga 2'
- Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud < o = a 6.0 m
- Conexiones domiciliarias Hidráulicas de 1/2" Longitud < o = a 6.0 m
- Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)
- Instalación de Base Granular Compactada
- Ensayos de laboratorio de densidad de campo
- Pozo de Inspección para domiciliarios de alcantarillado

INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ EJECUTADO	% EJECUTADO
01/08/2022	15/08/2022	\$ 5.124.060.62	0.42%

Actividades ejecutadas durante el periodo:

- Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)
- Demolición de Pozos existentes.
- Excavación en material común
- Relleno con material seleccionado
- Relleno en arena para asentar tubería
- Suministro e instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios LM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Las actividades ejecutadas corresponden principalmente a excavación, relleno y suministro de tubería para las redes de acueducto.
- A la fecha de cierre, se presenta una ejecución del 0.42% en el periodo de ejecución.
- A la fecha de cierre, se presenta atraso 8.54% en el porcentaje de avance según cronograma de obra.
- A la fecha de cierre, se presenta una ejecución del 64.67%.
- El porcentaje de avance es poco significativo debido a que el contratista no cuenta con personal de obra, materiales y equipos suficientes para ejecutar actividades dado que desde el 03 de agosto no se cuenta con retrocargador para las excavaciones, además no ha llegado material para los sumideros laterales y demás actividades programadas.
- A la fecha no se ha presentado ningún accidente laboral ni problema alguno relacionado con el orden público durante la ejecución de los trabajos.
- Se presentan precipitaciones constantes durante el periodo de ejecución que no repercuten considerablemente en el cumplimiento del cronograma de obra.
- Hasta el momento no se ha recibido informe de obra por parte del contratista con respecto al periodo de ejecución.


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
C.C. 1.098.806.027 de Bucaramanga
INTERVEN CRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO








2022/8/10 10:57



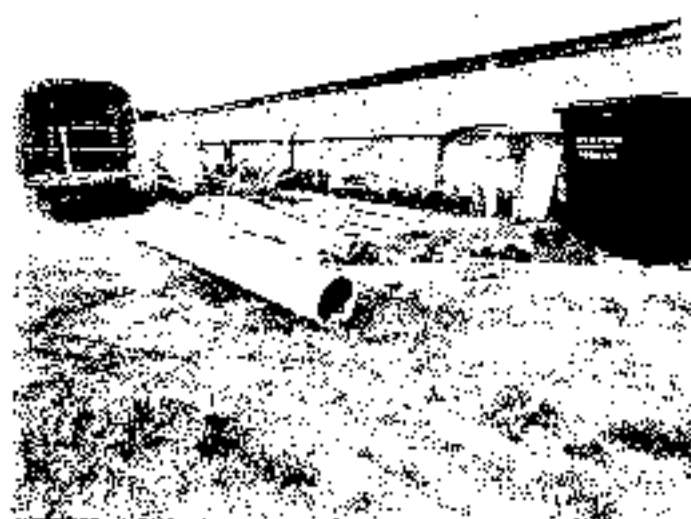





EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA E.S.P.

INTERVENTORIA PARA EL
CONTRATO DE OBRA N° 104-2021
QUE TIENE COMO OBJETO
CONTRATAR LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE
CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS
RAICES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 12

LEBRIJA, SANTANDER

PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Lebrija, 15 de septiembre de 2022

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

Atte.: Ing. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ

Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría N.106-2021, cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION INFORME No. 12

Yo, **JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO**, me permito hacer entrega del informe No. 12, del contrato en cuestión, comprendido en el periodo entre el 16 de agosto y 31 de agosto del 2022.


El siguiente informe contiene la información de los contratos de obra e interventoría de objeto en cuestión, así como las actividades realizadas en cada uno de los contratos en el periodo del presente informe

Me declaro responsable por toda la información aquí reportada.

Cordialmente




JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
C.C. 1.298.425.067 de Bucaramanga
INTERVENTOR



INTRODUCCIÓN

El proyecto **"CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**, se encuentra localizado en el municipio de Lebrija, en el Departamento de Santander, específicamente en la calle 7 con Cra 13 y quebrada Las Raíces.



Localización geográfica del proyecto – Departamento de Santander – Municipio de Lebrija

El proyecto **"CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**, contempla las siguientes actividades generales:

CALLE 7 se va a reconstruir la red matriz de alcantarillado sanitario (existente), y paralelo se va a construir el alcantarillado pluvial, para iniciar la separación de las aguas conducidas a flujo libre, de la misma manera se va a hacer el cambio de la tubería de acueducto, con el fin de garantizar las diferentes presiones en cada una de las viviendas, para luego aplicar capa de pavimento rígido, y cambiar por completo estado actual de la vía en mención.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	104 DEL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO	\$90.371.439,00
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	QUE NO SUPERE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 2	17 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 3	16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 4	31 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 5	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO EJECUTADO	16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
POR EJECUTAR	20 DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	93.10%

RECURSOS FÍSICOS

Materia de oficina: Los profesionales a cargo de llevar a cabo la interventoría, cuentan con todos los recursos físicos necesarios para realizar el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares con cámara.

RECURSOS HUMANOS

PROFESIONALES INTERVENTORIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: SIERVO ANTONIO GALLO REY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

BOGOTÁ

RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA

FECHA	CLASE	OBSERVACION
16-11-21	INICIO	Se da inicio al contrato de interventoría 106 de 2021.
24-12-21	SUSPENSIÓN	Se suspende el contrato de interventoría 106 de 2021 hasta el 10 de enero de 2022.
11-01-22	REINICIO	Se reinicia el contrato de interventoría 106 hasta el 16 de enero de 2022.
13-01-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 4 meses, hasta el 17 de mayo de 2022.
17-05-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 2 meses, hasta el 16 de julio de 2022.
15-07-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 45 días, hasta el 31 de agosto de 2022.
31-08-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se amplía el contrato de interventoría 106 de 2021 por 20 días, hasta el 20 de septiembre de 2022.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Aseguradora: Compañía mundial de seguros S.A.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
H-00007672	CUMPLIMIENTO	31/08/2022	20/01/2023
H-100007672	PRESTACIONES SOCIALES	31/08/2022	20/09/2025
H-100007672	CANTIDAD DEL SERVICIO	20/09/2022	20/09/2027

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	No. 104 DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.220.014.433,41
CONTRATISTA	INGENIERÍA FUTURISTA SAS
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
INTERVENTOR	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 2	17 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 3	16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 4	31 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN No 5	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERÍODO EJECUTADO	16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022
POR EJECUTAR	20 DÍAS
% DE AVANCE EJECUTADO	8,11%

PROGRAMACIÓN DE OBRA


La interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, llevar un control del estado del proyecto, y validar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, durante el desarrollo de los comités técnicos de obra rinde informe mensual de seguimiento a la programación de obra propuesta por el contratista, donde se presenta la programación mensual y atraso/avance asociado.

RECURSOS FÍSICOS

Maquinaria: Para la ejecución de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el periodo, el contratista ha contado con el equipo mínimo necesario para la ejecución de estas, tales como:

- 1 volqueta de capacidad mínima de 7 metros cúbicos
- 1 retrocargador de lantas
- 1 apisonador

Material de oficina: Al igual que el personal de interventoría, el personal administrativo del contratista de obra cuenta con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas.



RECURSOS HUMANOS

La Interventoría luego de revisar la seguridad social, certifica que cada uno de los profesionales y empleados del contratista se encuentra afiliado a la seguridad social.

AGOSTO			
NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CEDULA
1	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE	DIRECTOR	91,265,482
2	SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL	RESIDENTE	91,518,165
3	HERRERA BAHAMON JAVIER FRANCISCO	SISO	7,692,498
4	GELVEZ TENJO WILLIAM ANDRES	TOPOGRAFO	1,095,812,981
5	ANGULO JEREZ KAROLL DANYOSA	AUX SISO	1,005,345,108
6	GONZALEZ LUIS JOANI	MAESTRO	91,466,669
7	SANCHEZ QUARTE LUIS CARLOS	OBRERO	1,099,382,536
8	GOMEZ BAUTISTA JOHAN SEBASTIAN	OBRERO	1,099,376,953
9	HERRERA SANDOVAL DIEGO ALBERTO	OBRERO	1,099,376,022
10	GUSTAVO ROJAS	OBRERO	2,122,879
11	VILLAMIZAR HERNANDEZ ILAN DAVID	OBRERO	1,005,331,783
12	JAIME CAMARGO JESUS ALONSO	OBRERO	88,310,978
13	GARCIA ROJAS MICHAEL ANDRES	OBRERO	1,007,740,745
14	SARMIENTO ARIZA JHON ALEXANDER	OBRERO	1,005,345,932
15	PICO MEDINA EMMANUEL	OBRERO	6710458 PT
16	MAYDRA PACHANO GILBERTO	OBRERO	5065223 PT
17	PEREZ MORILLO FREDY JESUS	OBRERO	6549496 PT
18	MUÑOZ PABON EDWING ARNULFO	OBRERO	1,098,705,804
19	MAIZ RODRIGUEZ DANNY ALEXANDER	OBRERO	7020079 PT
20	CARREÑO PABÓN DIEGO ARMANDO	OBRERO	1,098,798,666

SEPTIEMBRE			
NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CEDULA
1	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE	DIRECTOR	91,265,482
2	SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL	RESIDENTE	91,518,165
3	HERRERA BAHAMON JAVIER FRANCISCO	SISO	7,692,498
4	GELVEZ TENJO WILLIAM ANDRES	TOPOGRAFO	1,095,812,981
5	ANGULO JEREZ KAROLL DANYOSA	AUX SISO	1,005,345,108
6	GONZALEZ LUIS JOANI	MAESTRO	91,466,669
8	GOMEZ BAUTISTA JOHAN SEBASTIAN	OBRERO	1,099,376,953
9	HERRERA SANDOVAL DIEGO ALBERTO	OBRERO	1,099,376,022
10	GUSTAVO ROJAS	OBRERO	2,122,879
11	JAIME CAMARGO JESUS ALONSO	OBRERO	88,310,978
12	SARMIENTO ARIZA JHON ALEXANDER	OBRERO	1,005,345,932
13	PICO MEDINA EMMANUEL	OBRERO	6710458 PT
14	MAYDRA PACHANO GILBERTO	OBRERO	5065223 PT
15	PEREZ MORILLO FREDY JESUS	OBRERO	6549496 PT
16	MUÑOZ PABON EDWING ARNULFO	OBRERO	1,098,705,804
17	MAIZ RODRIGUEZ DANNY ALEXANDER	OBRERO	7020079 PT
18	CARREÑO PABÓN DIEGO ARMANDO	OBRERO	1,098,798,666

Nota: las planillas de seguridad social pagadas por el contratista serán anexadas al informe de obra.



RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

FECHA	CLASE	OBSERVACION
16-11-21	INICIO	Se da inicio al contrato de obra 104 de 2021.
24-12-21	SUSPENSIÓN	Se suspende el contrato de obra 104 de 2021 hasta el 10 de enero de 2022.
11-01-22	REINICIO	Se reinicia el contrato de obra 104 hasta el 17 de enero de 2022.
13-01-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 104 de 2021 por 4 meses, hasta el 17 de mayo de 2022.
17-05-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 2 meses, hasta el 16 de julio de 2022.
15-07-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 45 días, hasta el 31 de agosto de 2022.
31-08-22	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 20 días, hasta el 20 de septiembre de 2022.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se amplía el contrato de obra 106 de 2021 por 20 días, hasta el 20 de septiembre de 2022.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: Seguros de estado S.A.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
96-44-101167013	CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTIC-PO	16/11/2021	20/01/2023
96-44-101167013	ESTABILIDAD Y CALIDA DE LA OBRA	16/11/2021	20/01/2023
96-44-101167013	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Sin amparo 5 años, 0 meses, 0 días.	
96-44-101167013	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	20/09/2025
96-40-101058941	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/11/2021	20/09/2022
96-40-101058941	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/11/2021	20/09/2022
96-40-101058941	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/11/2021	20/09/2022

EJECUCIÓN DE OBRA

OBRAS EJECUTADAS:


Durante el periodo del 16 de agosto al 31 de agosto de 2022, se ejecutaron las siguientes actividades:

RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ PROGRAMADO	% PROGRAMADO
16/08/2022	15/09/2022	\$ 390,760,198.63	32.03%

Actividades programadas para el periodo:

- Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)
- Localización, Medición, Realce y Control de Obra (incluye equipos de precisión y/o topografía)
- Excavación en material común



- Excavación manual en material común
- Relleno con material seleccionado
- Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado
- Suministro e instalación Válvula Compuerta de cierre 4" 300 psi
- Suministro e Instalación Válvula burgo 2"
- Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud < o = a 6,0 m
- Conexiones domiciliarias Hidráulicas de 1/2" Longitud < o = a 6,0 m
- Sumidero SL-200
- Pozo de inspección D=1,20m de H (1 m/s a 2 m/s)
- Base Granular Compactada
- Pavimento en concreto hidráulico vehicular de 4500 psi
- Acero de Refuerzo Grado 60
- Ensayos de laboratorio de densidad de campo
- Ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión
- Pozo de inspección para domiciliarias de alcantarillado
- Bordillo en concreto

INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ EJECUTADO	% EJECUTADO
16/05/2022	15/09/2022	\$ 205.742,286.47	16.86%

Actividades ejecutadas durante el periodo:

- Cerramiento con tela de polipropileno
- Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (incluye equipos de precisión y/o Topografía)
- Demolición de Pozos existentes.
- Excavación en material común
- Excavación manual en material común
- Relleno con material seleccionado
- Relleno en arena para asentar tubería
- Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado
- Suministro e instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM
- Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 2" Incl. Accesorios UM
- Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 12'
- Suministro e Instalación Válvula Compuerta de cierre 4" 300 psi
- Sumidero SL-200
- Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 m/s a 2 m/s)
- Base Granular Compactada
- Pavimento en concreto hidráulico vehicular de 4500 psi

1000
 900
 800
 700
 600
 500
 400
 300
 200
 100
 0

NOTAS

- Acero de Refuerzo Grado 60
- Bordillo en concreto
- Suministro e instalación TEE en HD de 4"x 4"
- Suministro e instalación TEE en HD de 4"x 2"
- Suministro e instalación codo en HD de 4"
- Conexiones domiciliarias Hidráulicas de 3/4" Longitud $\leq a = a 6.0$ m
- Conexiones Hidráulicas de 3/4" para ramificación/proyección
- Suministro e instalación tubería PVC RDE-21 DE 1" Incl. Accesorios JM

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES


- Durante el periodo de ejecución se finalizaron las actividades correspondientes a redes de alcantarillado sanitario y pluvial además de la red de acueducto, con actividades pendientes de conexión de algunas domiciliarias.
- Se realizaron pruebas de presión hidrostática a la red de acueducto la cual arrojó un resultado favorable para las condiciones medidas.
- Se da inicio a actividades de pavimento rígido, para lo cual se realizan ensayos de densidad de campo y resistencia del concreto, además los ensayos de Proctor modificado y CBR para la base granular.
- A la fecha de cierre, se presenta una ejecución del 16.86% en el periodo de ejecución.
- A la fecha de cierre, se presenta atraso 15.17% en el porcentaje de avance según cronograma de obra.
- A la fecha de cierre, se presenta una ejecución del 81.11%.
- A la fecha no se ha presentado ningún accidente laboral ni problema alguno relacionado con el orden público durante la ejecución de los trabajos.


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
C.C. 1.098.636.067 de Bucaramanga
INTERVENTORIA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11-10-57

REGISTRO FOTOGRÁFICO

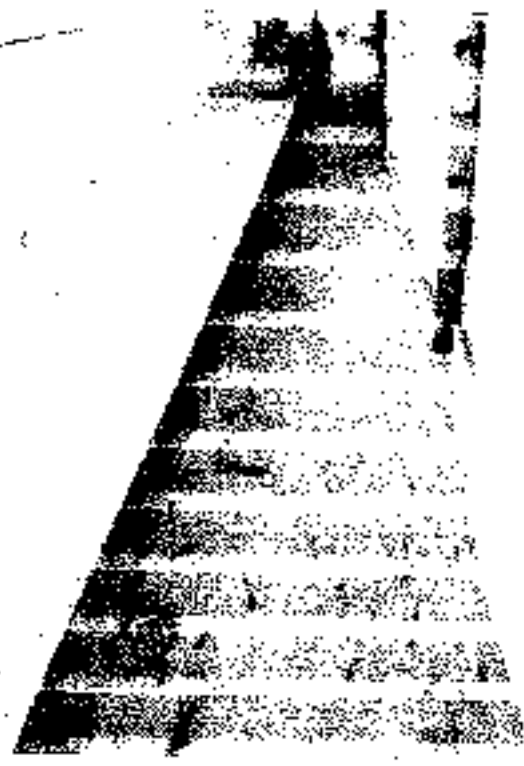

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



100-100000



100-100000

100-100000



100,000



ALDOREZ



POLICE



SECRET

SECRET




SECRET


OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL



11-11-1964

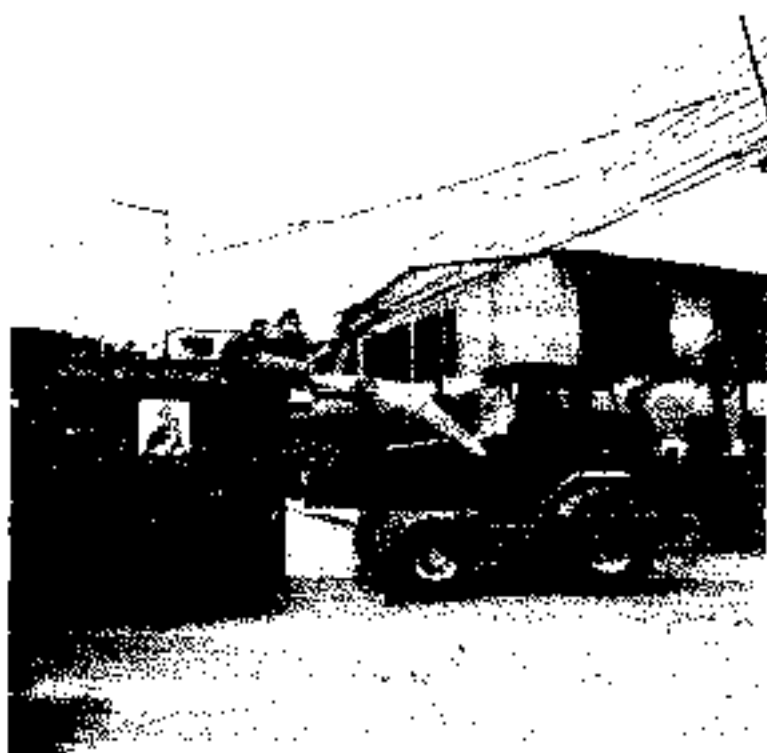


2012/8/27

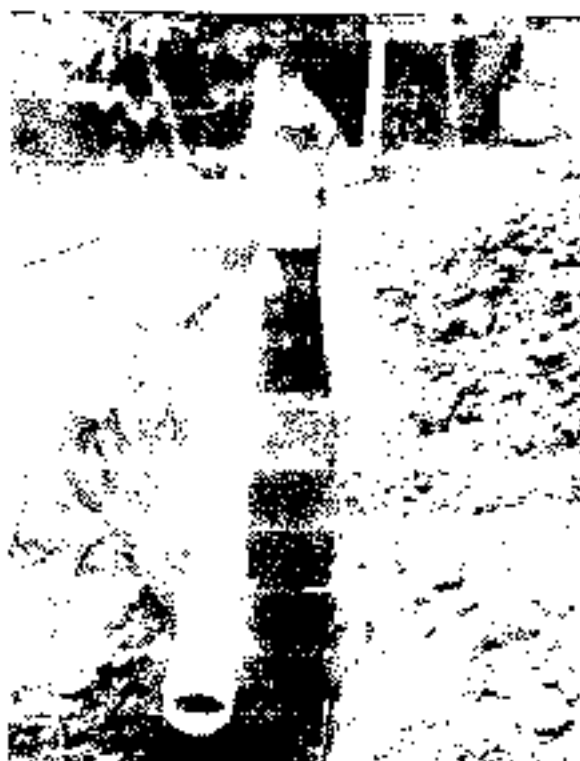


1901



1000000

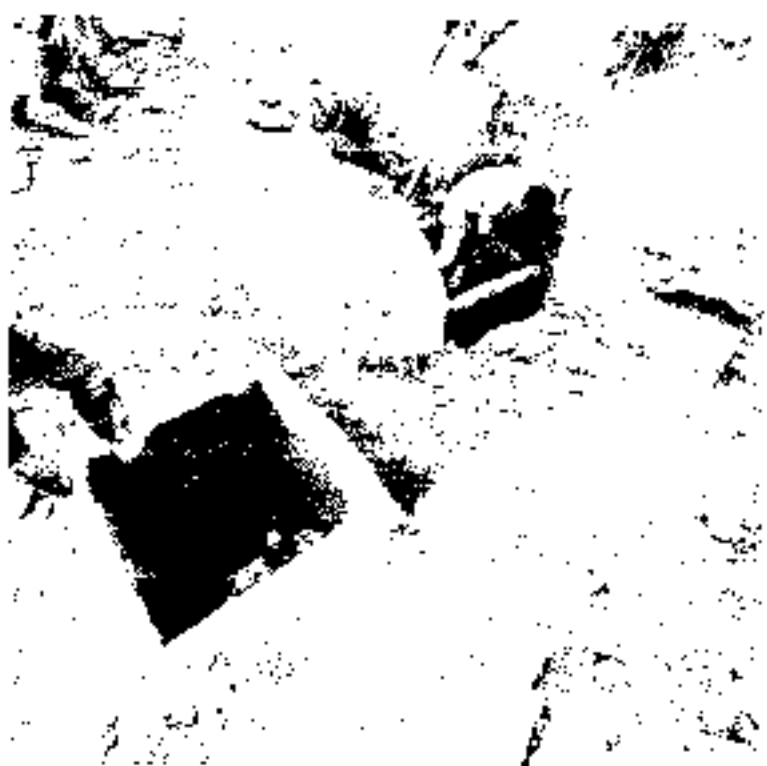


14-00000

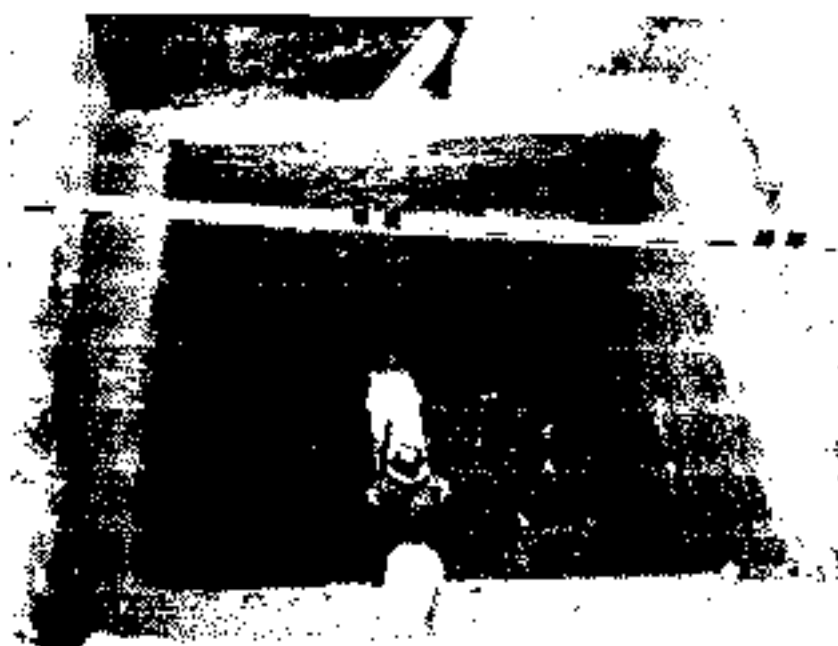

14-00000



14-00000





SOLVEZ




.....

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

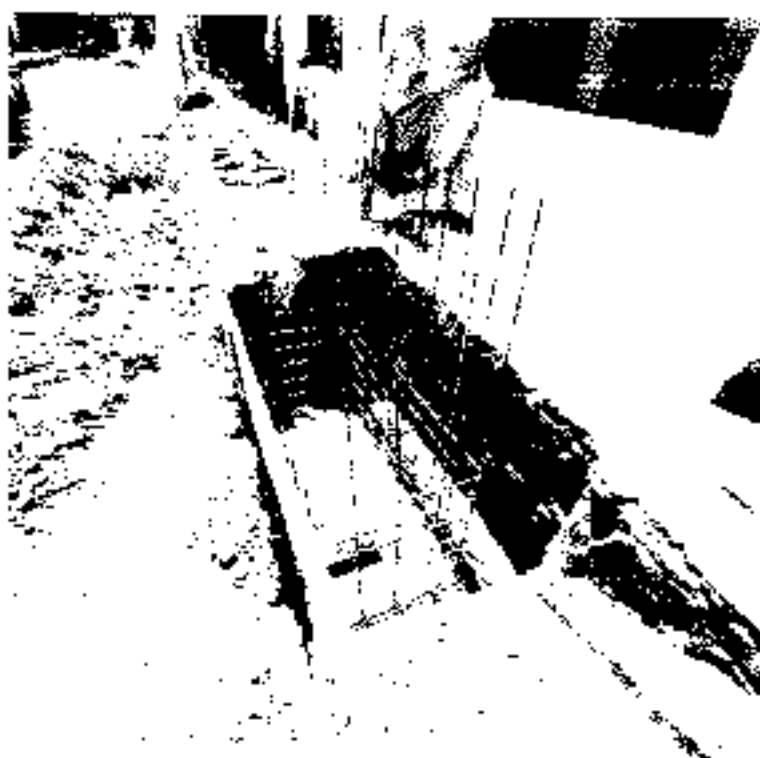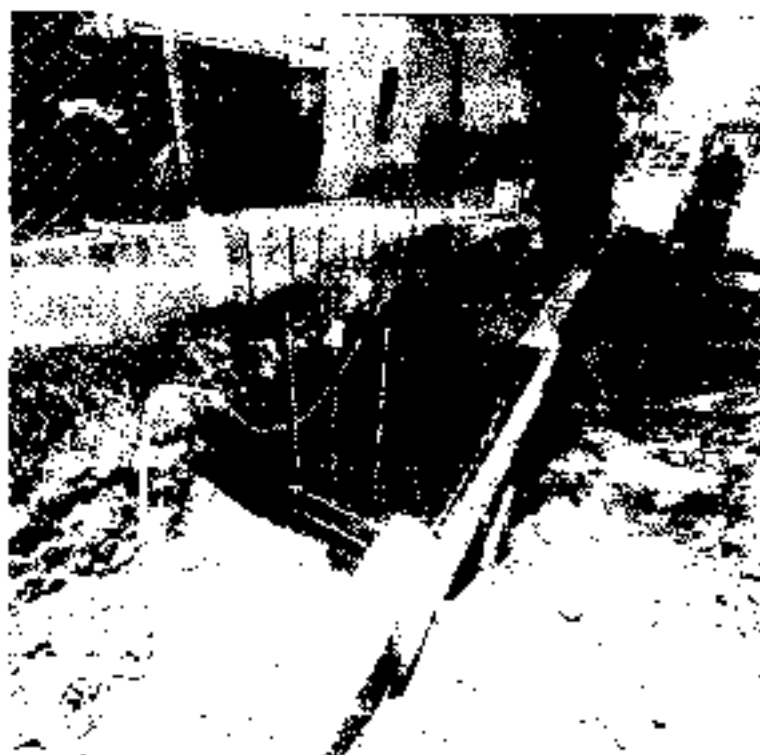

THE
MUSEUM



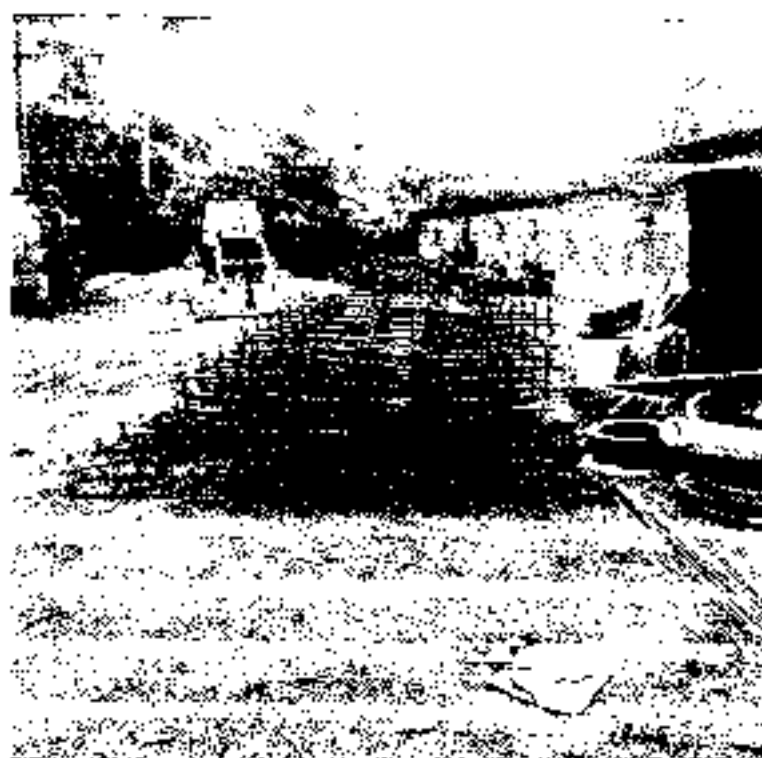

1012

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

1012



PAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24325972
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha pago Planilla: 2022-09-20

DATOS DEL APORTANTE					
Razón Social	Ingeniería Futurista S.A.S	Tipo de persona	Jurídica	Tipo de Documento	NIT
Nro. de Identificación	901236770	D.V.	5	Tipo de Aportante	8 menor a 200 empleados
Dirección de Correspondencia	CALLE 49 27 A 65 OF 404	Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Actividad Económica	4290	Código Electrónico	INNOVANTOINGENIERIASASASGMAIL.COM	Teléfono	3123051274
FAX	0	Sucursal	4290	Nombre Sucursal	FUTURISTA
Tipo de Entidad	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Employer

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. de Identificación	3098701729	Primer Apellido	RUEDA
Primer Nombre	JOSE	Segundo Nombre	MANUEL
		Segundo Apellido	GARCIA

PERÍODO COTIZACIÓN PÉNSIÓN			FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mar: 08	Año: 2022	Mar: 09	[Sucesos]
Mto. de Trabajadores		Vlr. Total Nómina		Nro. de Retención
16		\$10.533.337		24325972

IDENTIFICACIÓN DEL ASIGNADO										Salario
Identificación	Tipo de Virreulación	Sub tipo o cot	Ext no olli	Colombi uno epi	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombre	Salario Basico	
CC-1005315108	01	No	No	No	SR	406	FLJO	ARMANDO JERRE KAROLL DANECOA	\$1.000.000	
CC-1098796666	01	No	No	No	SR	406	FLJO	CARRERO JARON PABLO BERNARDO	\$1.000.000	
CC-1007740740	01	No	No	No	SR	406	FLJO	MARIA ROSA MICHAEL ANTONIO	\$1.000.000	
CC-1095812981	01	No	No	No	SR	406	FLJO	DELIVER TERRE WILLIAM ANTONIO	\$1.000.000	
CC-1099376951	01	No	No	No	SR	406	FLJO	CONNY BRUTISTA JONAS SEBASTIAN	\$1.000.000	
CC-91466669	01	No	No	No	SR	406	FLJO	CONCELE LUIS JONAS	\$1.000.000	
CC-1009376024	01	No	No	No	SR	406	FLJO	HERRERA MANOVAL DIEGO ALBERTO	\$1.000.000	
CC-88310979	01	No	No	No	SR	406	FLJO	JAINES GERMARDO JUAN ALONSO	\$1.000.000	
PT-7020079	01	No	No	No	SR	406	FLJO	MARY ROUSIGUER DANNY ALEXANDER	\$1.000.000	
PT-5065223	01	No	No	No	SR	406	FLJO	MAYORA PACHANO GILBERTO JONATAN	\$1.000.000	
CC-1098765004	01	No	No	No	SR	406	FLJO	ARMANDO PABLO EDUARDO ARMANDO	\$1.000.000	
PT-6680456	01	No	No	No	SR	406	FLJO	PEREZ MONTELLA ERIKINX JESUS	\$1.000.000	
PT-6710458	01	No	No	No	SR	406	FLJO	PICO MEDERA BENAMARIEL	\$1.000.000	
CC-91265482	01	No	No	No	SR	406	FLJO	RODRIGUES RUIZ ROMARCO ENRIQUE	\$1.000.000	
CC-2111879	01	No	No	No	SR	406	FLJO	MOYAS JONAS GUSTAVO	\$1.000.000	
CC-1099372536	01	No	No	No	SR	406	FLJO	SANCHEZ EDUARDO LUIS GUSTAVO	\$1.000.000	
CC-1005374502	01	No	No	No	SR	406	FLJO	SANTANA ANITA JONAS ALEXANDER	\$1.000.000	
CC-1005331783	01	No	No	No	SR	406	FLJO	VILLANUEVA BERNARDO JOAN DAVID	\$1.000.000	

MOVILIDADES										Fecha	
Identificación	Y	Fecha	Y	Fecha	Y	Fecha	Y	Fecha	Y	Fecha	Fecha
CC-1005315108	X	2022-08-20									
CC-1098796666	X	2022-08-20									
CC-1007740740	X	2022-08-20									
CC-1095812981											
CC-1099376951											
CC-91466669											
CC-1099376022	X	2022-08-20									
CC-88310978											
PT-7020079	X	2022-08-20									
PT-5065223	X	2022-08-20									
CC-1098765004	X	2022-08-20									

NOVIEMBRE											
Identificación	I R C	P a c h o I n i c i o	R e c e p t o P a c h o F i n	T i p o P a c h o I n i c i o	T i p o P a c h o F i n	V e n e r a b i l i d a d P a c h o I n i c i o	V e n e r a b i l i d a d P a c h o F i n	P a c h o I n i c i o	P a c h o F i n	P a c h o I n i c i o	P a c h o F i n
PT - 6649996	X	2023-08-25									
PT - 6720458	X	2023-08-25									
CC - 91265482											
CC - 1112879											
CC - 109977436	X	2023-08-25									
CC - 100534832	X	2023-08-25									
CC - 1005331703	X	2023-08-25									

SISTEMA GENERAL DE INGRESOS											
Identificación	ART	Días Cotización	IMP Cotización	Tarifa	Cot 001	Cot Vol Aclil	Cot Vol Apport	Total Isol	Fondo 201	Subtotal 201	Fecha Izq Fin
CC - 1005345109	FORVENER	5	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 1000798656	FORVENER	5	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 1007740745	PROTECCION	20	2565.557	0.1600000	2106.700	20	20	2106.700	20	20	20
CC - 1005022981	FORVENER	30	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
CC - 1099376253	FORVENER	30	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
CC - 91466642	FORVENER	30	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
CC - 1099376022	FORVENER	30	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
CC - 04110970	FORVENER	30	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
PT - 7036072	FORVENER	8	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
PT - 5065221	FORVENER	1	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 1098765804	FORVENER	11	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
PT - 6649996	PROTECCION	8	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
PT - 6720458	PROTECCION	11	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 91265482	PROTECCION	20	21.000.000	0.1600000	2150.000	20	20	2150.000	20	20	20
CC - 2112879	SINAPP	0	20	0.0000000	20	20	20	20	20	20	20
CC - 1099374336	PROTECCION	27	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 100534832	FORVENER	3	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20
CC - 1005331703	FORVENER	20	2155.557	0.1600000	226.700	20	20	226.700	20	20	20

SISTEMA GENERAL DE SALUD												SISTEMA GENERAL DE RESCOS PROFESIONALES				
Identificación	RPE	D2 As Co	TIC Análisis	Tarifa	Cot Ob1	UPU Adic	Núm Aut As	Valor BG	Núm Aut Tar	Valor Lic	D1 As Co	IMP Rescos	C6 CT	Tarifa	Cot Ob1	
CC - 1005345108	RPE-A COBESALUD	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$166.667	42	0.0696000	\$11.700	
CC - 1008798666	RPE-B COBESALUD	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$166.667	42	0.0696000	\$11.700	
CC - 1007740742	NUOVA E.P.S. S.A.	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500	
CC - 1095812981	NUOVA E.P.S. S.A.	20	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
CC - 1098376953	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
CC - 91066669	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
CC - 1099375022	NUOVA E.P.S. S.A.	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500	
CC - 8810978	RPE-C COBESALUD	20	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
PT - 7030079	NUOVA E.P.S. S.A.	0	\$266.667	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$266.667	42	0.0696000	\$24.800	
PT - 5065223	NUOVA E.P.S. S.A. NOV	1	\$33.333	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.333	42	0.0696000	\$24.800	
CC - 1098765804	NUOVA E.P.S. S.A.	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$366.667	42	0.0696000	\$24.800	
PT - 6699496	NUOVA E.P.S. S.A.	6	\$266.667	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$266.667	42	0.0696000	\$24.800	
PT - 6710450	NUOVA E.P.S. S.A.	8	\$266.667	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$266.667	42	0.0696000	\$24.800	
CC - 91265482	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
CC - 2112879	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600	
CC - 109937536	RPE-S COBESALUD	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$900.000	42	0.0696000	\$62.700	
CC - 1005345332	NUOVA E.P.S. S.A. NOV	3	\$130.000	0.0400000	\$4.400	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	42	0.0696000	\$7.000	
CC - 1005311783	RPE-N COBESALUD	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500	

Página 4 2022-08-26 14:51:10 ASOPACOS SA

APORTES PARTICIPACIONES											
Identificación	CON	Plan Cot a COP	INC Cajas	Tarifa INC	Aporte COP	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa EPS	Aporte EPS
CC-1005145104	CAJASAM	5	\$166.567	0.000000	\$6.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
UU-1090728506	CAJASAM	5	\$166.567	0.000000	\$6.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-1007240745	CAJASAM	20	\$666.567	0.000000	\$26.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-10925812901	CAJASAM	30	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-1093176951	CAJASAM	10	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC 9146660	CAJASAM	30	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
UU-1099170022	CAJASAM	20	\$666.567	0.000000	\$26.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-88310978	CAJASAM	30	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
PT-7020078	CAJASAM	8	\$266.567	0.000000	\$10.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
PU-5065223	CAJASAM	1	\$33.334	0.000000	\$1.400	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-1090765004	CAJASAM	11	\$366.567	0.000000	\$14.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
PT-6643446	CAJASAM	0	\$266.567	0.000000	\$10.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
PT-6710458	CAJASAM	8	\$266.567	0.000000	\$10.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-91243402	CAJASAM	30	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-2112374	CAJASAM	30	\$1.000.000	0.000000	\$40.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-109372536	CAJASAM	27	\$200.000	0.000000	\$8.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-100345932	CAJASAM	3	\$100.000	0.000000	\$4.000	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0
CC-1003311781	CAJASAM	20	\$666.567	0.000000	\$26.700	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0

TOTALS AREA EL VAJONCO 2022 - 00											
TOTAL APORTES IVA, PENSIÓN A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NºM APTIL	VLR TOTAL COV CON	VLR COVIFICACIÓN VOL APTIL	VLR COVIFICACIÓN VOL APTIL	VLR APORTES COV CON	VLR APORTES COV CON	DÍAS NOMA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD
PROTECCION	4	9453.100	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$1.700	\$0	\$0	\$455.100
FINANYP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0
PCBVBTE	13	\$1.072.300	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$3.200	\$0	\$0	\$1.076.200

CONCEPTO	TOTAL ENTIDAD	TOTAL A PAGAR
CARGO DE COMPENSACIÓN		
BENA	1	\$421,300
ICAF	1	320,100
BSAU	1	830,200
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$0
		\$3,250,400
