



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

INTERVENTORIA PARA EL
CONTRATO DE OBRA N° 104-2021
QUE TIENE COMO OBJETO
CONTRATAR LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE
CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS
RAICES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1

LEBRIJA, SANTANDER

PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021





Lebrija, 02 de diciembre de 2021

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJAE.S.P.

Atte.: Ing. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ

Supervisor

Calle 11 No. 8-73 Lebrija – Santander

Ref.: Contrato de Interventoría N.106-2021, cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA


ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION INFORME No. 1

Yo, **JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO**, me permito hacer entrega del informe No. 1, del contrato en cuestión, comprendido en el periodo entre el 16 de noviembre y 1 de diciembre del 2021.

El siguiente informe contiene la información de los contratos de obra e interventoría del objeto en cuestión, así como las actividades realizadas en cada uno de los contratos en el periodo del presente informe.

Me declaro responsable por toda la información aquí reportada

Cordialmente



JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
C.C 1.098.636.067 de Bucaramanga
INTERVENTOR





INTRODUCCIÓN

El proyecto **"CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**, se encuentra localizado en el municipio de Lebrija, en el Departamento de Santander, específicamente en la calle 7 con cra 13 y quebrada Las Raíces.



Localización geográfica del proyecto – Departamento de Santander – Municipio de Lebrija

El proyecto **"CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**, contempla las siguientes actividades generales:

CALLE 7 se va a reponer la red matriz de alcantarillado sanitario (existente), y paralelo se va a construir el alcantarillado pluvial, para dar inicio a la separación de las aguas conducidas a flujo libre, de la misma manera se va a hacer el cambio de la tubería de acueducto, con el fin de garantizar las diferentes presiones en cada una de las viviendas, para luego aplicar capa de pavimento rígido, y cambiar por completo estado actual de la vía en mención.



INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	106 DEL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO	\$90,371,439.00 Peso Colombiano
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	QUE NO SUPERE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO EJECUTADO	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021
POR EJECUTAR	15 DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	33%

RECURSOS FÍSICOS

Material de oficina: Los profesionales a cargo de llevar a cabo la interventoría, cuentan con todos los recursos físicos necesarios para realizar el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares con cámara.



RECURSOS HUMANOS

PROFESIONALES INTERVENTORIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ASESOR SISO
ASESOR AMBIENTAL
COMISIÓN TOPOGRÁFICA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	No. 104 DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.220.014.433,41
CONTRATISTA	INGENIERÍA FUTURISTA
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
INTERVENTOR	JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
SUPERVISORES	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
PLAZO INICIAL	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021



PERIODO EJECUTADO	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021
POR EJECUTAR	15 DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	33%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

La interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, llevar un control del estado del proyecto, y validar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, durante el desarrollo de los comités técnicos de obra rinde informe semanal de seguimiento a la programación de obra propuesta por el contratista, donde se presenta la programación semanal y atraso/avance asociado.

RECURSOS FÍSICOS

Maquinaria: Para la ejecución de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el periodo, el contratista ha contado con el equipo mínimo necesario para la ejecución de las mismas, tales como:

2 volqueta de capacidad mínima de 7 metros cúbicos
1 retroexcavadora de llantas
1 apisonador
1 martillo demoledor

Material de oficina: Al igual que el personal de interventoría, el personal administrativo del contratista de obra cuenta con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas.



RECURSOS HUMANOS

La Interventoría luego de revisar la seguridad social, certifica que cada uno de los profesionales y empleados del contratista se encuentra afiliado a la seguridad social.

Nombre	Cargo	Novedad
Roberto Enrique Rodríguez Ruiz	Director de obra	-
Jesús Pedro Nel Serrano Meneses	Residente de obra	-

NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉGULA	FECHA DE INGRESO	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL
1	Luis Eduardo Paez Almeida	91.463.016	18/11/2021	SI
2	Braven Stiven Bohorquez Rodriguez	1.003.653.046	23/11/2021	SI
3	Jose Manuel Paez Almeida	5.725.251	29/11/2021	SI
4	Jose de Jesus Rojas Restrepo	1.099.377.791	19/11/2021	SI
5	Alexander Bueno Mejia	1.099.363.214	17/11/2021	SI
6	Helmer Salinas Puentes	1.099.375.355	21/11/2021	SI
7	Vicente Plata Romero	5.670.428		SI
8	Andres Parra Rodriguez	1.005.346.541	19/11/2021	SI
9	Mauricio Vanegas Cristancho	13.537.062	17/11/2021	SI
10	Jose Barragan Perez	1.099.365.441	26/11/2021	SI

Nota: las planillas de seguridad social pagadas por el contratista serán anexadas al informe de obra del próximo periodo. Esto debido a que aún no se cumple el plazo de pago de este.

EJECUCIÓN DE OBRA

OBRAS EJECUTADAS:

Durante el período del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2021, se ejecutaron las siguientes actividades:



RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

SEMANA	INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ PROGRAMADO	% PROGRAMADO
S1-S2	16/11/2021	22/12/2020	\$406.671.477,8	33%

SEMANA	INICIO SEMANA	FIN SEMANA	\$ EJECUTADO	% EJECUTADO
S1-S2	23/11/2021	01/12/20201	\$169.486.020,86	14%

Nota: a la fecha de cierre, se presenta un atraso del 19%



OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Se empiezan labores por el puente que pasa por la quebrada las Raíces, donde se instala tubería sanitaria de 16" y pluvial de 24"
- Al instalar la tubería pluvial la cual debe entregar en la quebrada, se percibe la construcción de un muro de contención que obstruye el paso del tubo, por lo cual después de hacer el requerimiento necesario, se autoriza su demolición y posterior reconstrucción con el fin de darle espacio a la red, y así poder avanzar con las demás actividades del contrato
- Se hizo necesario el cierre total de la vía, que teniendo en cuenta la profundidad y expansión de las excavaciones que se han venido realizando, no permiten el paso de vehículos, por otro lado, el contratista dispuso de pasos peatonales a los extremos de la calle, encerrados en tela verde, para garantizar la integridad de los peatones
- Muchos de los materiales en PVC, necesarios para las diferentes reparaciones, e instalaciones del contrato, han sido complicados de encontrar, toda vez que muchos de los proveedores, en este momento de pandemia, no poseen en sus establecimientos comerciales, los inventarios suficientes, para suplir con este tipo de accesorios, lo que ha generado, que algunos de los accesorios, se envíen aeropuerto – aeropuerto, desde la ciudad de Bogotá, para poder dar cumplimiento con el objeto contractual.
- Lo anterior sumado a que se avecinan días no hábiles propios de la temporada navideña, nos hace pensar que el constructor no podrá cumplir con el alcance del contrato en el tiempo pactado.


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
C.C-1.098.636.067 de Bucaramanga
INTERVENTOR



**INFORME DE INTERVENTORÍA A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE
CARRERA 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA.**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OBRA DURANTE LA SEMANA DEL 16 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021**

En este informe se describen de manera detallada las actividades relacionadas con el control técnico y administrativo de las actividades, que se han venido adelantando dentro de la obra, por parte, tanto del contratista de obra como de la Interventoría.

Control de Equipo

Los equipos empleados por el contratista de obra son los siguientes:

2 volqueta de capacidad mínima de 7 metros cúbicos

1 retroexcavadora de llantas

1 apisonador

1 martillo demoledor

La interventoría ha verificado que esta maquinaria se encuentre en buenas condiciones para su operación. Se requiere kit de derrames.



Control de Personal:

Se sigue trabajando con el siguiente personal en obra:

- Ingeniero Residente de Obra e Interventoría
- SISO Contratista e Interventoría
- Personal Operario de maquinaria (Retroexcavadora)
- Cuadrilla de trabajo para construcción
- Personal de oficina para obra e interventoría

Control Técnico:

Se ha tenido atención para el cumplimiento con los requisitos de Ley, en lo referente a la afiliación a EPS, ARP y AFP del personal empleado en esta obra. Además de los exámenes médicos de ingreso correspondientes.

Se verificó las competencias del personal involucrado en obra para trabajo en altura mediante la validez del curso en la página del ministerio.

También se verifica que el personal en obra cuente con la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos.



Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Siempre la interventoría vela porque se cumplan todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y se exige al contratista el cumplimiento de estas con el personal a su cargo, durante el desarrollo de los trabajos.

Se supervisa la prevención de accidentes en cuanto a:

- Riesgo, prevención y utilización de implementos personales de seguridad: Casco, Guantes, Gafas, Botas, Arnés, etc.
- Se pide kit anti derrames en área de trabajo.
- Señalización en zanjas de excavación.
- Capacitación diaria a trabajadores sobre los riesgos y peligros de las tareas realizadas.
- Creación de Matriz de riesgo para mitigar cualquier incidente. Aún el contratista no ha hecho entrega de esta.

Aspectos Administrativos

Se está trabajando en obra con el siguiente personal, utilizado por la Interventoría para desarrollar sus funciones Técnicas y Administrativas:



- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría
- SISO Interventoría

Hay control diario del personal en obra y de su seguridad social. Aplicación de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y normas de bioseguridad en contra del COVID-19.

Condiciones Climáticas

Durante el mes de diciembre el desarrollo de la obra se ha dado en unas condiciones normales, ya que no se han presentado condiciones climáticas adversas, así que no se ve afectado el avance y programación de la obra.

Condiciones De Orden Público

A la fecha no se ha presentado problema alguno relacionado con el orden público con la ejecución de los trabajos.



OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La interventoría deja constancia de los requerimientos faltantes con respecto al informe entregado por el contratista para el área de seguridad y salud en el trabajo:

- Se requiere presentar notificación del riesgo al personal.
- Se requieren los exámenes de ingreso del personal operativo y administrativo.
- Se requiere Lista de chequeo relacionadas a sst.
- Se requieren preoperacionales de maquinaria y equipo.
- Se requieren ATS de actividades excavaciones profundas.
- Se requieren reportes e investigación de accidentes de trabajo.
- Se requiere lista de asistencia de capacitación Bioseguridad
- Se requiere lista de entrega de elementos de Bioseguridad.
- Se precisa con urgencia la Matriz De Riesgo y Medevac por parte del contratista.

Realizó:

WILMER ALEXANDER CABARICO CORTES

ASESOR SISO

e-Mail: alexcaba3671@gmail.com



REGISTRO FOTOGRÁFICO




Excavación mecánica para reposición de tubería de red de alcantarillado sanitario.




Supervisión por parte de comisión topográfica en procesos de excavación.




Acopio de material y maquinaria en obra.

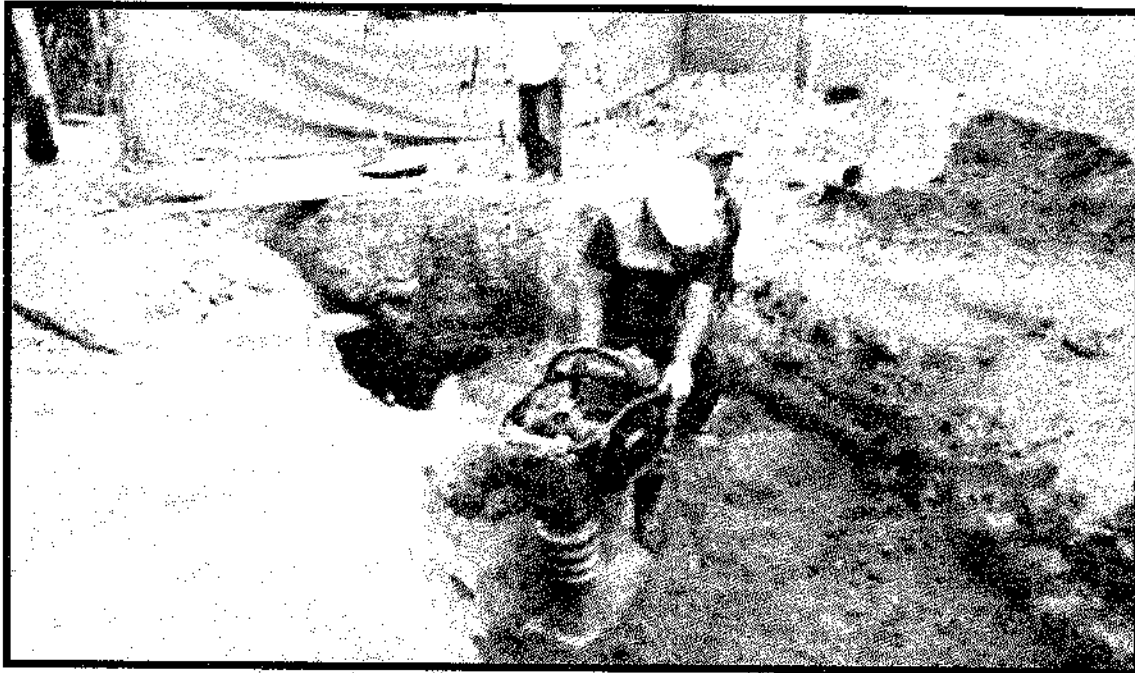

Compactación de material seleccionado.

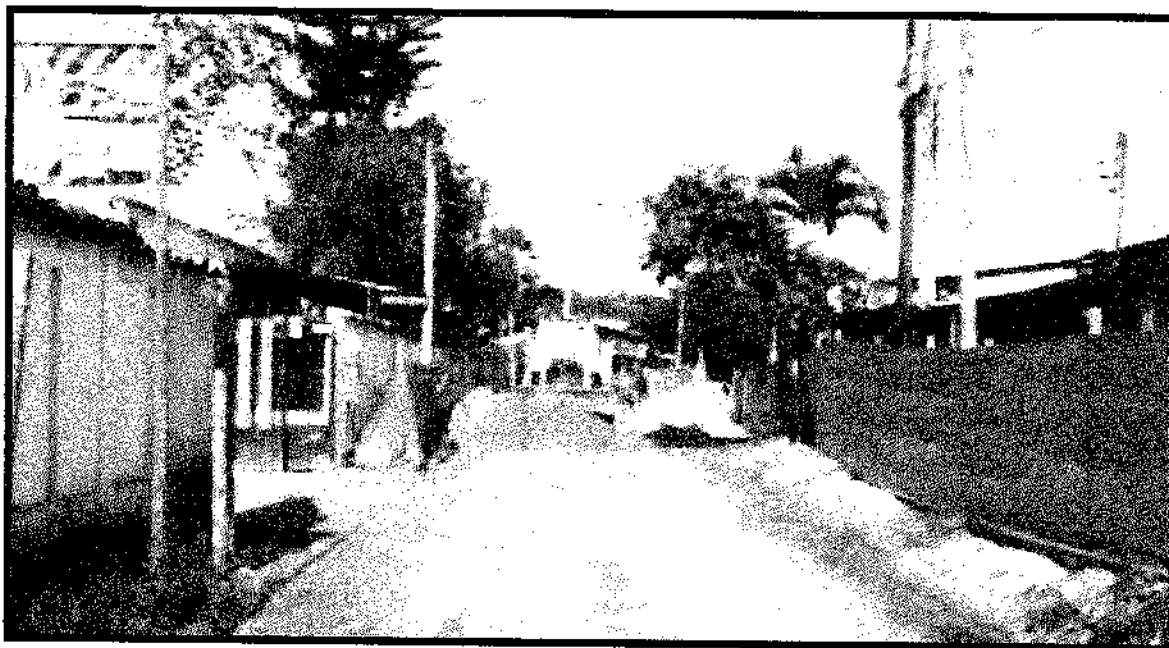

Cerramiento de área de intervención.

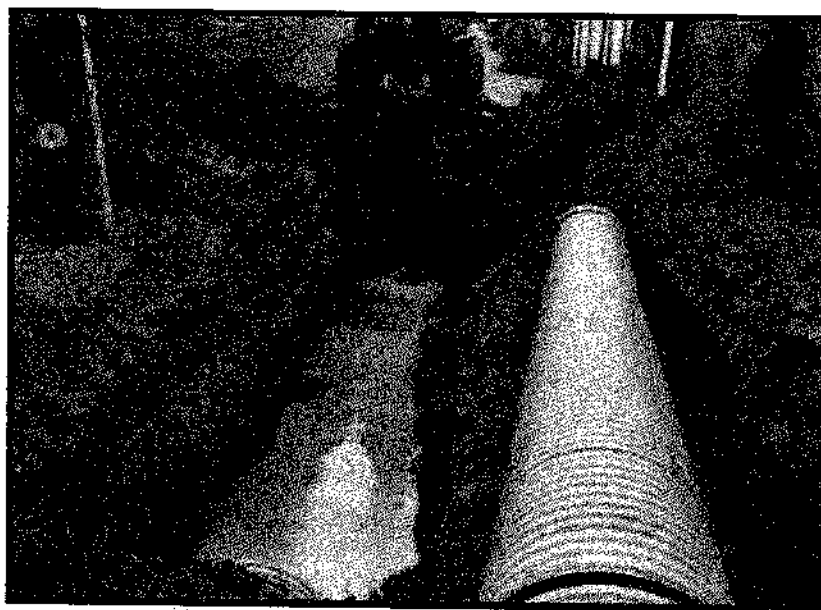

Retiro de tubería de gres de red antigua y manejo de aguas.




Socialización y actas de vecindad por parte del contratista.



Socialización y actas de vecindad por parte del contratista.



Excavación manual para conexiones domiciliarias.

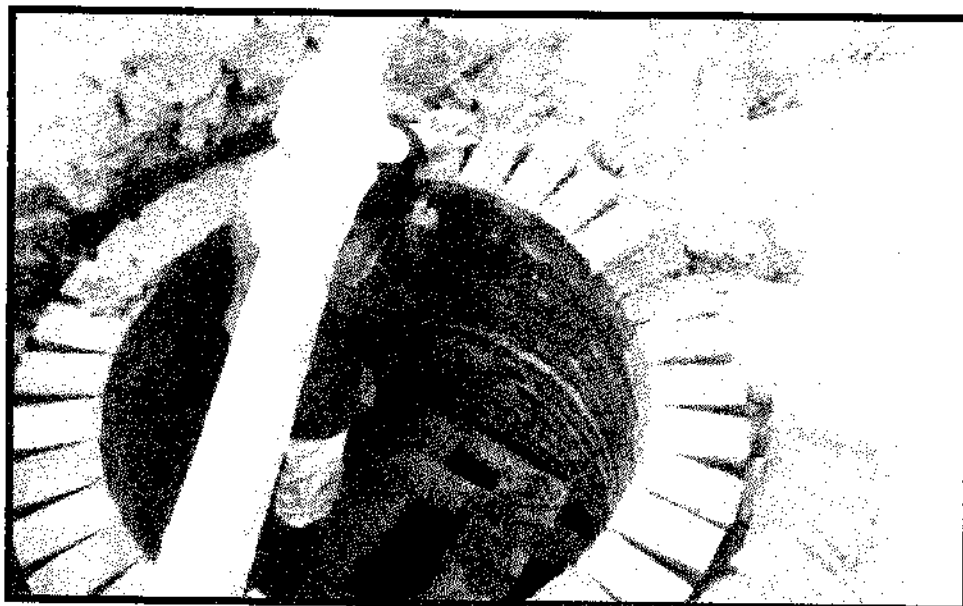

Construcción de pozo de red de alcantarillado sanitario.




Excavación mecánica para redes de alcantarillado sanitario y pluvial.



Relleno en arena para asentar tubería.




Acopio de material de relleno seleccionado.

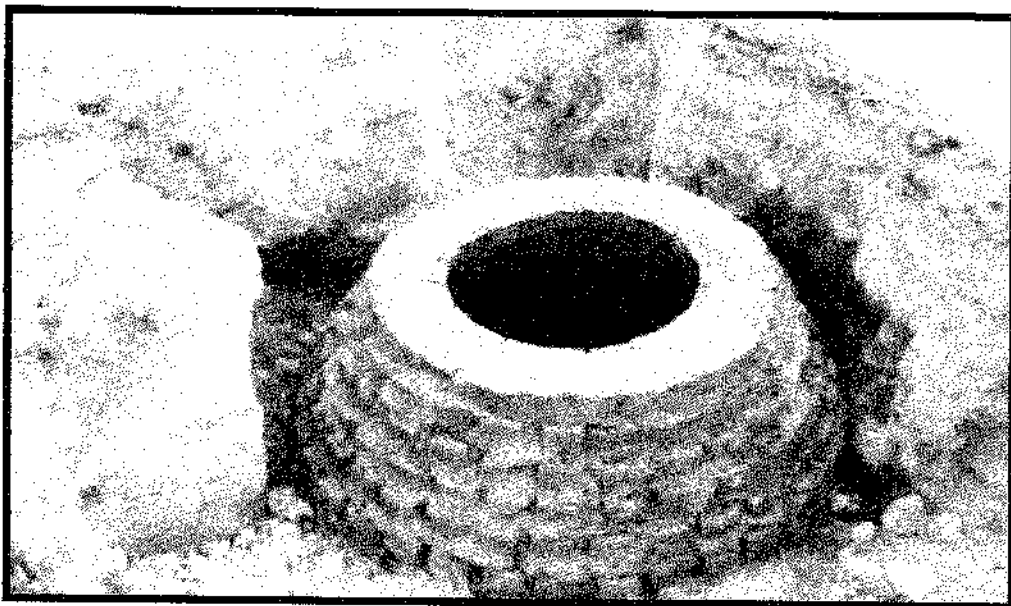

Terminado de pozo de red de alcantarillado sanitario.



Señalización de áreas de excavación.

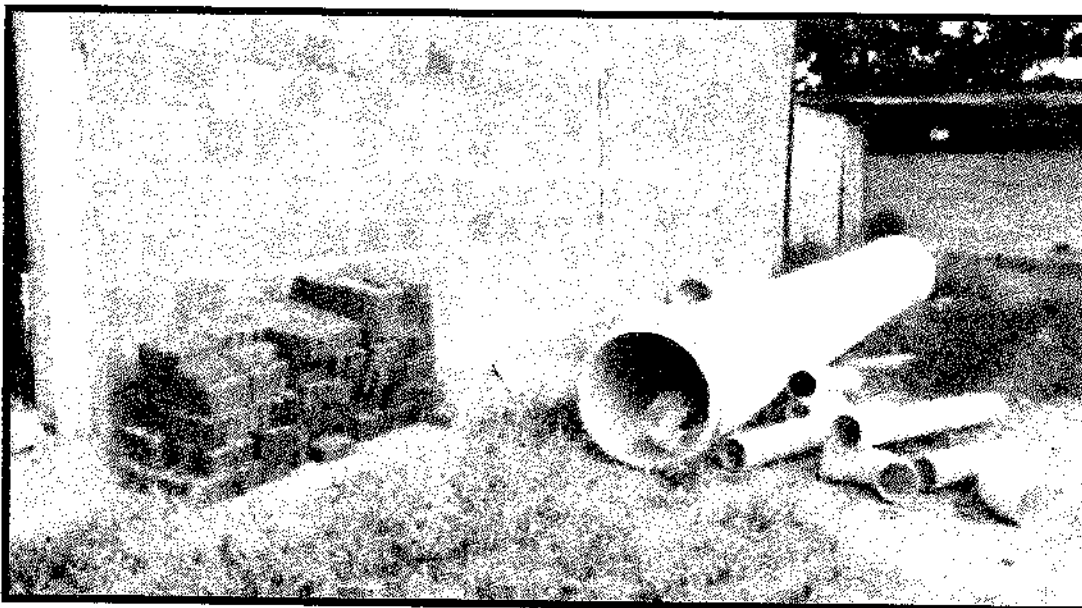


Acopio de tubería para redes de alcantarillado.



Señalización de áreas de excavación.



Demolición sección de muro de contención para paso de tubería de red de alcantarillado sanitario.



Demolición sección de muro de contención para paso de tubería de red de alcantarillado sanitario.

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDADES	COSTO EN MILES	MES 1					MES 2					MES 3					MES 4			
			Sept. 1	Sept. 2	Sept. 3	Sept. 4	Sept. 5	Sept. 6	Sept. 7	Sept. 8	Sept. 9	Sept. 10	Sept. 11	Sept. 12	Sept. 13	Sept. 14	Sept. 15	Sept. 16			
1	PRELIMINARES	\$ 128,950.687	\$ 16,120,000.81	\$ 16,120,000.81	\$ 16,120,000.81	\$ 16,120,000.81	\$ 16,120,000.81														
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$ 104,342.283	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53	\$ 9,667,477.53							
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	\$ 301,984.186	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56	\$ 27,451,289.56							
4	OBRAS DE DRENAJE	\$ 49,871.354																			
5	ESTRUCTURA PAVIMENTO	\$ 288,452.944																			
6	ENSAYOS DE LABORATORIO	\$ 7,444.602																			
	ALU 35%	\$ 318,412.416																			
	DIVERSION SEMANAL DEL PROYECTO	\$ 1,220,447,686.000	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87	\$ 71,872,336.87							
	INTERVENCIÓN	\$ 88,408,547.000	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69	\$ 6,602,211.69							
	INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 1,310,061,432.00	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14	\$ 104,594,781.14							
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN		0.01%	13.92%	19.80%	26.65%	33.48%	40.27%	47.09%	53.91%	60.73%	67.55%	74.38%	81.20%							

ING. DIEGO FERNANDO
AROLA GÓMEZ
SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL ESPL

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL ESPL

AL INTERVENTORIA
JAB. N. BENTO
VAZQUEZ CARULLO

**R.L. CONTRATISTA
JOSE MANUEL RUEDA
GARCIA INGENIERIA
FUTURISTA S.A.S**

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021

FECHA ACTA INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021			
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE			
CONTRATO No.	104-2021			
FECHA DE CELEBRACION	11 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CLASE	CONTRATO DE OBRA			
MODALIDAD	INVITACION PRIVADA			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS			
CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. NIT No. 901236770-5 R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.			
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.220.014.433,41).			
VALOR ANTICIPO	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$366.004.330)			
OBJETO	"CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"			
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES			
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.			
INTERVENTORIA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21C00098	19 DE OCTUBRE DE 2021	21A00581	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
	21A00187		21C00338	
POLIZA DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	NUMERO DE POLIZA		96-44-101167013 96-40-101058941	
	FECHA DE APROBACIÓN		16 DE NOVIEMBRE DE 2021	

En el Municipio de Lebríja, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2021, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisor administrativo y técnico de la ESPL respectivamente, y, **JOSE MANUEL RUEDA GARCIA**, representante legal de **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** como **CONTRATISTA**, y el representante de interventoría, el señor **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO** y considerando que se encuentran cumplidos todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación,

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO

Que el día dieciséis (16) de noviembre de 2021, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASEGURADO
		DESDE (DIA/MES/AÑO)	HASTA (DIA/MES/AÑO)			
CUMPLIMIENTO	96-44-101167013	11/11/2021	30/04/2022	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$349.661.488,60
BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101167013	11/11/2021	30/04/2022	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos	100% DEL VALOR DEL ANTICIPO

Calle 10 No. 9 – 73 Lebríja – Santander / Tel: 856 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebríja.gov.co



					Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	\$366.004.330,02
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101167013	11/11/2021	31/12/2024	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$122.001.443,34
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101167013	11/11/2021	30/12/2026	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$122.001.443,34
RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	96-40-101058941	11/11/2021	31/12/2021	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	200 SMMLV \$181.705.200

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
C.D.P.	21C00098	19/10/2021	2.3.3.01.02.004.02 2.3.2.02.01.003.01	CONVENIO INVERSIÓN	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$907.603.002,50 \$10.000.000
C.D.P.	21A00187	19/10/2021	2.3.3.01.02.004.05	CONVENIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$302.844.882
R.P.	21C00338	16/11/2021	2.3.3.01.02.004.02 2.3.2.02.01.003.01	CONVENIO INVERSIÓN	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$907.603.002,50 \$9.566.549,91
R.P.	21A00581	16/11/2021	2.3.3.01.02.004.05	CONVENIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$302.844.882


ACUERDAN

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato
2. Fijar como fecha de inicio el dieciséis (16) de noviembre de 2021
3. Fijar como fecha de terminación treinta (30) de diciembre del año 2021
4. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Lebrija, a los dieciséis (16) días de noviembre del año 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR TECNICO


INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.
JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Representante legal
CONTRATISTA


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA

PROYECTO: C.E.N.S.

Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co

ACTA DE REUNIÓN


Código: DIE-FO-007	Versión: 3	F.E. 2020.12.01
-----------------------	---------------	--------------------

Código

ACTA DE REUNION				
No. De acta.	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
02	9:20 am.	10:00am.	Calle 7. Cra 13 y Q. Raíces.	01/12/2021.
PARTICIPANTES				
NOMBRE			AREA	
Emerson Guerrero Correa			Interventoría	
David Guerrero			Residente de Obra	
Andrea Pradilla Madiedo.			Apoyo Supervisión - CPS	
Juan Manuel Herrera.			Supervisión - Infraestructura	
Diego Ardila.			Empulebrija.	
Fernando Monosalve.			Empulebrija	
OBJETIVO				
- comité técnico en calle objeto de intervención.				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
- se da inicio a la reunión en la calle 7 Cra 13. - se revisaron dos alternativas presentadas en cuanto a la rasante del pavimento. - se revisan los planos existentes para definir cotas de llegada y entrega de la red. - Se plantea la posibilidad de dar manejo a la escorrentía por medio de una bota conectada a cada lado de la vía.				

ACTA DE REUNIÓN

Código:	Versión:	F.E.
DIE-FO-007	3	2020.12.01



CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- se deberá presentar la propuesta de trabajo con el fin de
del contratista para el debido proceso, el día 13 de
diciembre de 2021.

CIERRE

Siendo las 10:00 am se da por terminada en Lebrija - Santander la presente reunión a los
(01) Días del mes de diciembre de 2021 y en constancia firman los que en ella
intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS

Emerson Guerrero Corea
CARGO Aux Interventoría.


CARGO Apoyo Supervisión - cps.
Infraestructura.


SUPERVISOR
SEC INFRAESTRUCTURA
CARGO LER JUAN L. FERRERES.


Diego Fernando Ardila
ab - gerente Técnico Operativo
Empolebrija.
CARGO


Fernando Manosalva
Gerente Empolebrija
CARGO


David Guerrero
Residente de obra.
CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO
