





INFORME DE OBRA No. 01 **NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 06 DEL AÑO 2021**



CONTRATO DE OBRA No. 107-2021

**CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
 CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2ª Y 3ª Y LA CARRERA 2ª ENTRE
 CALLE 12 Y 12ª EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAISO
 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.**

CONTRATISTA M2L CONSTRUCTORES S.A.S.		INTERVENTORIA INTERING S.A.S.	CONTRATANTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICAJARLOS DE LEBRIJA E.S.P.	
				
CESAR AUGUSTO REY QUINTERO DIRECTOR DE OBRA	MARKÓN OSWALDO LOPEZ HIDALDO RESIDENTE DE OBRA	R.P. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ	YAMILE FLOREZ V. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO

656 64 29 
 m2lconstructores@gmail.com 
 Carrera 8 No. 10 - 38 
 Lebrija, Santander 



INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Lebrija se contempló la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre las carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a en el casco urbano- barrio Villa Paraíso del Municipio; puesto que el barrio Villa Paraíso, no cuenta con redes para el abastecimiento de agua y el sistema de Alcantarillado, así mismo no posee una infraestructura idónea que cumpla con las condiciones técnicas y de salud para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento básico e higiene. Proyecto que inició a través del Convenio Interadministrativo No. 00-471 de 2021 entre la Alcaldía Municipal y EMPULEBRIJA.

Mediante la suscripción del Contrato de obra No. 107-2021 entre EMPULEBRIJA y M2L CONSTRUCTORES S.A.S. se inicia el día 22 de noviembre la ejecución para llevar a cabo la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre las carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a en el casco urbano- barrio Villa Paraíso.

M2L CONSTRUCTORES S.A.S. comprometido con el desarrollo de la obra presenta el primer informe de ejecución del proyecto del periodo comprendido entre 22 de noviembre y el 06 de diciembre del año 2021.

656 64 28

M2lconstructores@gmail.com

Carrera 5 No. 10 - 38

Lebrija, Santander

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	2
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	5
1.2. LOCALIZACIÓN	5
1.3. INFORMACION CONTRACTUAL	7
1.3.1. POLIZAS	8
1.3.2. ACTAS	9
1.3.3. ACTIVIDADES Y VALOR CONTRACTUAL	9
1.3.4. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	11
2. EJECUCION DE LA OBRA	11
2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS	11
2.1.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	11
2.1.2. MEMORIAS DE CÁLCULO	30
2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	43
2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS	44
2.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES	44
2.5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	45
2.6. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	46
3. PROGRAMA DE TRABAJO	46
CONCLUSIONES	49

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 107-2021
- ANEXO 2. POLIZAS VIGENTES Y ACTA DE APROBACION DE POLIZAS
- ANEXO 3. ACTAS SUSCRITAS CON LA ENTIDAD
- ANEXO 4. EVIDENCIA FOTOGRAFICA – VALLA INFORMATIVA
- ANEXO 5. ACTAS DE VECINDAD
- ANEXO 6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA - PERSONAL CONTRATADO
- ANEXO 7. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
- ANEXO 8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
- ANEXO 9. CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE HERRAMIENTAS, MATERIALES
- ANEXO 10. BITACORAS DE OBRA
- ANEXO 11. PAGOS AL SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
- ANEXO 12. CHARLAS DIARIAS SST
- ANEXO 13. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
- ANEXO 14. INDUCCIONES DEL PERSONAL
- ANEXO 15. INFORME SST
- ANEXO 16. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

656 64 28

M22contrivectores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Llerija Santander

INFORME DE OBRA No. 01

CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2ª Y 3ª Y LA CARRERA 2ª ENTRE CALLE 12 Y 12ª EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El presente informe evidencia las actividades ejecutadas entre el 22 de noviembre y el 06 de diciembre del año 2021 como cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 107-2021 que tiene por objeto construir las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre las carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a en el casco urbano - barrio Villa Paraíso del Municipio de Lebrija; suscrito con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. y M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

1.2. LOCALIZACIÓN

De manera general la obra se desarrolla en el departamento del Santander, específicamente en el Municipio de Lebrija entre la calle 12 entre las carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a en el casco urbano – barrio Villa Paraíso.

Lebrija

Figura 1. Localización de Lebrija en Colombia

Figura 2. Localización de Lebrija en el departamento de Santander

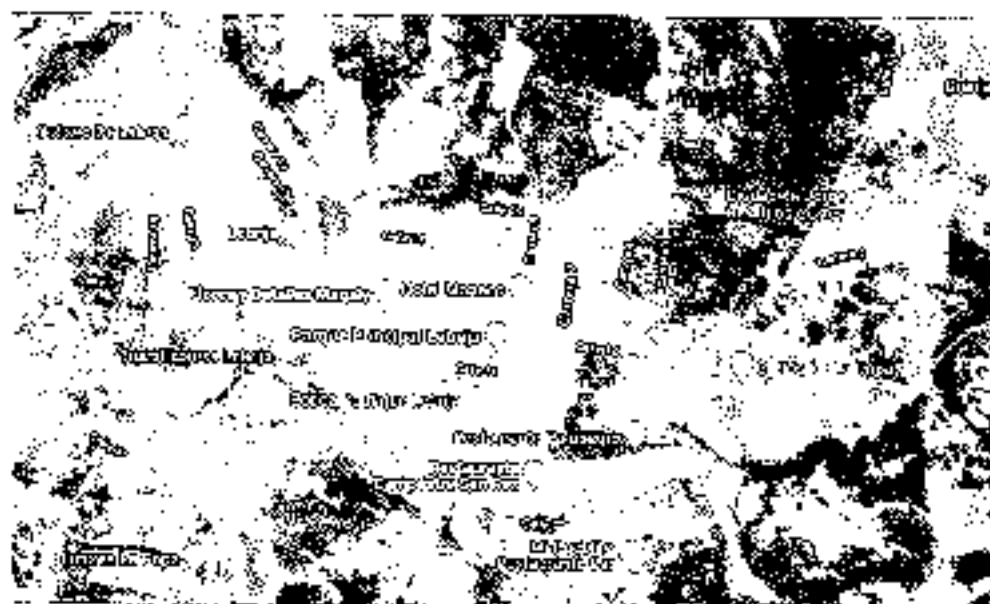


Figura 3. Localización del proyecto en Lebrija

656 64 28

M2iconstrutores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Lebrija, Santander

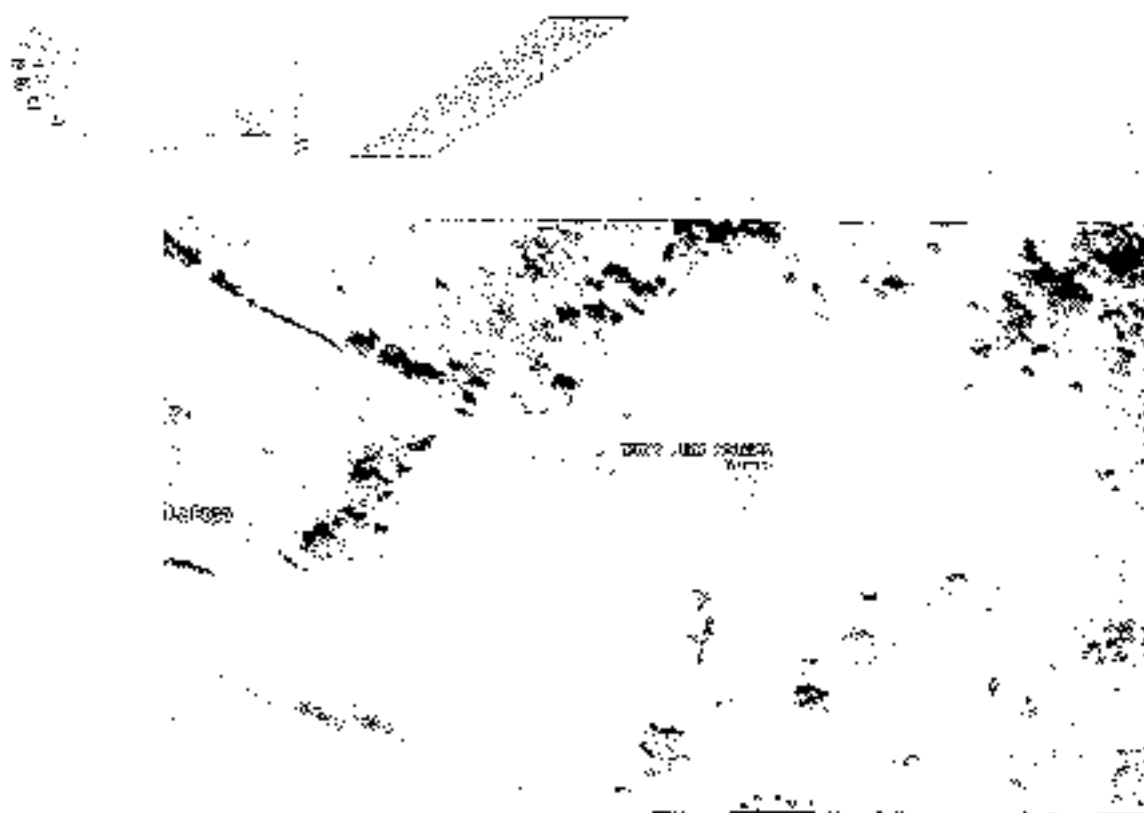


Figura 4. Localización del proyecto en el Barrio Villa Paraíso

1.3. INFORMACION CONTRACTUAL

Tabla No. 01

Información contractual

No. CONTRATO	107-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PRIVADA
FECHA DE CELEBRACION	18 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
ANTICIPO	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE (\$115.902.754,5)
PLAZO	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS

656 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 11 38

Lebrija, Santander

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT No. 800.137.201-5 R.L. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.
INTERVENTORIA	INTERING S.A.S R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ C.C. # 1.095.792.327 de Bucaramanga
SUPERVISIÓN	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO E.S.P. YAMILE FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E.S.P.

1.3.1. POLIZAS

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula decima segunda del Contrato de Obra No. 107-2021 (Véase Anexo 1), M2L CONSTRUCTORES S.A.S. constituyo a favor del Municipio de Lebrija y La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija las siguientes garantías con sus coberturas, amparos y vigencias solicitadas:

Tabla No. 2

Pólizas del Contrato No. 107-2021

ASEGURADORA. SEGUROS MUNDIAL S.A.				
CONCEPTO DEL AMPARO	No. POLIZA	VIGENCIA (DÍA/MES/AÑO)		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	30% DEL VALOR DEL CONTRATO \$115.902.754
CUMPLIMIENTO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$77.268.503
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100021377	22/11/2021	30/12/2024	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$38.634.251

656 54 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 32

Lebrija, Santander,

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$38.634,251
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	B-100004609	22/12/2021	30/12/2021	200 SMMLV \$181.705.200

Una vez allegadas las pólizas a la empresa contratante, el supervisor técnico DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ aprobó las garantías exigidas para la ejecución del contrato de Obra No. 107-2021 (Anexo 2).

1.3.2. ACTAS

En el desarrollo de la obra entre el periodo del 22 de noviembre al 06 de diciembre del año 2021 se han suscritos las siguientes actas las cuales se anexan copia en el presente informe:

Tabla No. 3
Relación de actas

NOMBRE	FECHA DEL DOCUMENTO (DIA/MES/AÑO)	CONCEPTO
ACTA DE INICIO	22/11/2021	Se da inicio al plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 107-2021.
ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	29/11/2021	Se aprueba el desembolso del anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato.

1.3.3. ACTIVIDADES Y VALOR CONTRACTUAL

En el desarrollo de la obra se presentan las siguientes actividades, cantidades, valores parciales y total de la obra:

ITEM	ACTIVIDADES	UNO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR PARCIAL
1.0	PRELIMINARES				
1.01	Cerramiento	ml	370	\$ 26.333,70	\$ 9.743.470,17
1.02	Señalización del área de trabajo	G/h	1	\$ 1.964.850,00	\$ 1.964.850,00
1.03	Campaneo de obra (25 m2)	G/b	1	\$ 4.539.948,00	\$ 4.539.948,00
1.04	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra	mes	2	\$ 4.734.800,00	\$ 9.469.600,00
1.05	Desinstalación Tubería existente	ml	256,65	\$ 16.952,00	\$ 4.350.730,80
				SUBTOTAL	\$30.068.598,97

656 64 28

M2constructores@gma.com

Carera 8 No. 10 - 38

León, Santander

2.0 RED DE ACUEDUCTO				
2.01	Excavación en material común	m ³	102	\$ 42.860,00 \$ 4.371.720,00
2.02	Relleno compactado material común	m ³	34	\$ 59.760,00 \$ 2.031.840,00
2.03	Relleno seleccionado	m ³	42,5	\$ 87.630,00 \$ 3.724.275,00
2.04	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m ³	25,5	\$ 149.679,00 \$ 3.816.814,50
2.05	Concreto para atraque 3000 psi	m ³	5,31	\$ 348.122,99 \$ 1.848.533,10
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m ³	68	\$ 27.987,00 \$ 1.903.116,00
2.07	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios L.M	ml	84,3	\$ 73.026,04 \$ 6.156.095,17
2.08	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios L.M	ml	128,2	\$ 73.026,04 \$ 9.361.938,33
2.09	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi	un	1	\$ 905.859,20 \$ 905.859,20
2.10	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi	un	1	\$ 912.615,20 \$ 912.615,20
2.11	sum e Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi	un	1	\$ 680.459,20 \$ 680.459,20
2.12	TEE Hierro Ductil de 3"	un	2	\$ 142.761,00 \$ 285.523,20
2.13	TEE Hierro Ductil de 2"	un	2	\$ 93.531,60 \$ 187.063,20
2.14	Codo 90° Hierro Ductil 2"	un	4	\$ 119.111,60 \$ 476.446,40
2.15	Codo 45° Hierro Ductil 2"	un	2	\$ 103.711,60 \$ 207.423,20
2.16	Acometida Hidráulica	un	16	\$ 605.410,25 \$ 9.686.564,00
SUBTOTAL				\$46.556.285,69
3.0 RED DE ALCANTARILLADO				
3.01	Excavación en material común	m ³	381,52	\$ 42.860,00 \$ 16.780.547,20
3.02	Relleno compactado material común	m ³	143,59	\$ 59.760,00 \$ 8.580.938,40
3.03	Relleno seleccionado	m ³	102,36	\$ 87.630,00 \$ 8.969.806,80
3.04	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m ³	102,36	\$ 149.679,00 \$ 15.321.142,44
3.05	Cargue y retiro de material sobrante	m ³	247,93	\$ 27.987,00 \$ 6.938.816,91
3.06	sum e Inst. Tubería novafor de 12"	ml	148,30	\$ 175.449,85 \$ 26.019.212,17
3.07	sum e Inst. Tubería novafor de 10"	ml	144,15	\$ 117.992,27 \$ 17.008.585,61
3.08	Acometida Alcantarillado	un	16	\$ 230.058,60 \$ 3.680.937,60
SUBTOTAL				\$103.299.987,08
4.0 POZOS Y SUMIDEROS				
4.01	Sumidero Transversal	ml	18	\$ 2.750.472,22 \$49.508.503,60
4.02	Sumidero Lateral SI 200	un	2	\$ 3.085.419,71 \$ 6.170.839,42
4.03	Construcción Pozos de inspección D=1,20m H=(1,2-2,0)m	un	11	\$ 4.570.237,57 \$50.272.613,29
4.04	Mejoramiento pozos existentes	un	1	\$ 152.841,10 \$ 152.841,10
4.05	conexión a pozo existente (incluye demolición y embone)	un	1	\$ 149.971,66 \$ 149.971,66
SUBTOTAL				\$106.254.769,05
COSTO DIRECTO				\$286.179.640,79
ADMINISTRACION		29%	\$ 82.992.095,83	
IMPREVISTOS		1%	\$ 2.861.796,41	
UTILIDAD		5%	\$ 14.308.982,04	
COSTO TOTAL OBRA				\$386.342.515,07

656.64.28

m2lconstructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Lebrija, Santander

1.3.4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El día 19 de noviembre del año 2021 fue presentado ante la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija el Plan de Inversión del Anticipo (Anexo 13) el cual fue aprobado y desembolsado el día 03 de diciembre de 2021 por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$115.902.754,50) correspondientes al 30% del valor total del contrato.

M2L CONSTRUCTORES S.A.S. para el desembolso del anticipo por parte de la empresa contratante se comprometió a:

1. Emplear los dineros girados por concepto de anticipo de acuerdo con el Plan de Inversión del anticipo aprobado por la interventoría o el supervisor.
2. Tener una cuenta bancaria para el manejo del anticipo.
3. Justificar los giros y movimientos que se realicen en la cuenta bancaria y suministrarle al Interventor y al supervisor toda la información que este requiera.
4. Amortizar en las actas de pago parcial el porcentaje correspondiente al anticipo.
5. Depositar en la cuenta indicada por la ESPL, los rendimientos financieros netos generados por concepto de anticipo, en caso de que hubiere.
6. Solicitar a la entidad financiera el certificado de retención en la fuente de los rendimientos financieros del anticipo a nombre de la ESPL, en caso de que hubiere.

2. EJECUCIÓN DE LA OBRA

2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 06 de diciembre del año 2021 se desarrollaron las siguientes actividades en obra.

2.1.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

PRELIMINARES

1.01 Cerramiento

654 64 28

M2Lconstructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 28

Lebrija, Santander

Se realizó instalación del cerramiento con tela de polipropileno provisional para controlar la zona de intervención en la cual se desarrollan las actividades de la obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
1.01	370,00	130,40	239,60

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



1.02 Señalización del área de trabajo

Se realizó la instalación del sistema de señalización con el fin de ofrecer información y seguridad a la comunidad del barrio Villa Paraíso y al personal que ejecuta actividades en la obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
1.02	1,00	1,00	0,00

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



1.03 Campamento de obra (25 m2)

Se realizó adecuación del campamento de obra para el almacenamiento de herramienta, materiales y espacio para las charlas, capacitaciones y/o información que se le da al personal de obra.

655 64 28

M2constructores@gmail.com


Carrera 5 No. 10 - 38

Lebrija, Santander

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
1.03	1,00	1,00	0,00

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

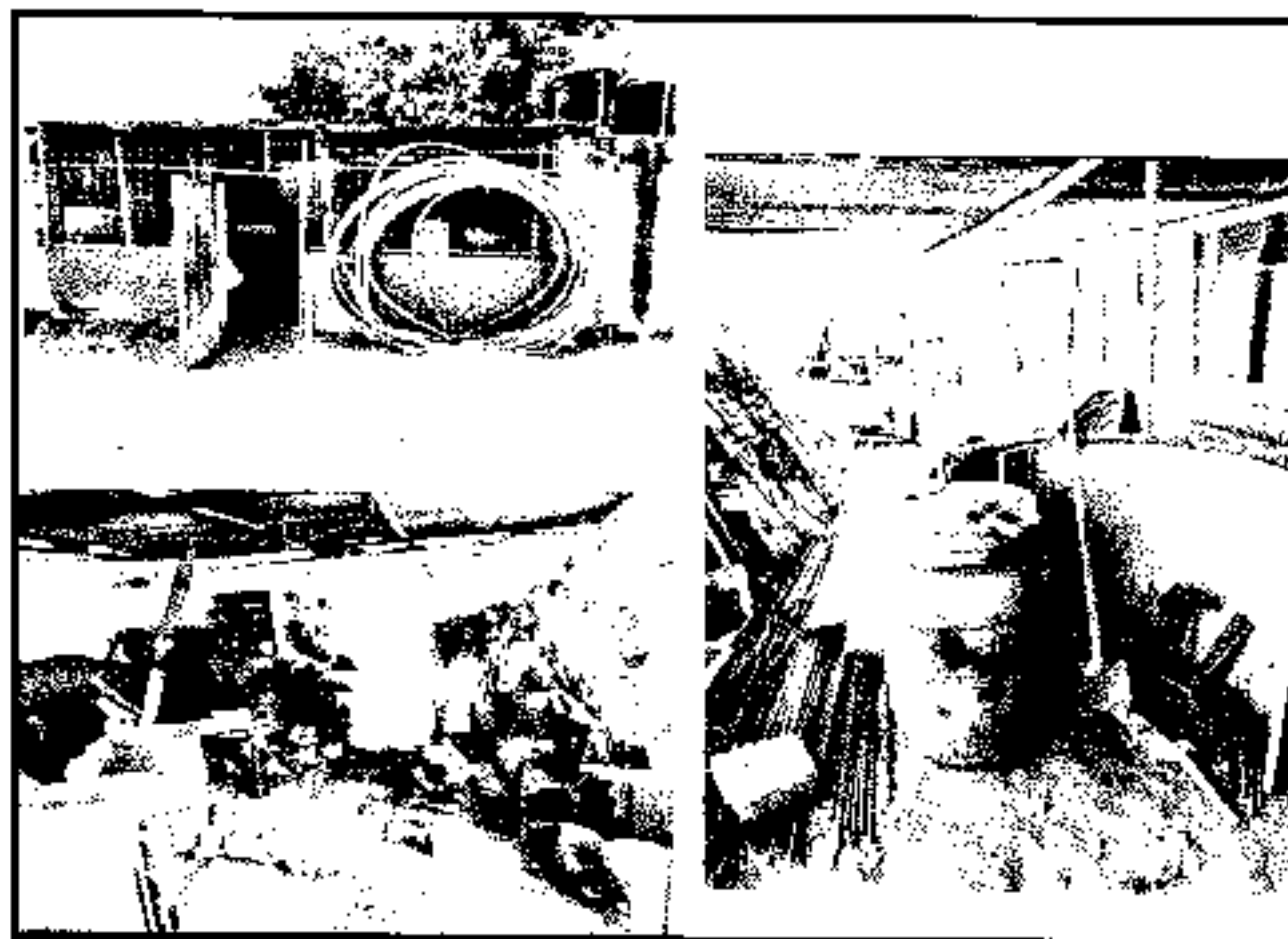

1.04 Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra

636 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 9 No. 10 - 38


Lebijo, Santander

Se realizó localización, Medición, replanteo y control de obra con la estación total del área a intervenir conforme a lo indicado por la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
1.04	2,00	0,50	1,50

Se esta cumpliendo con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

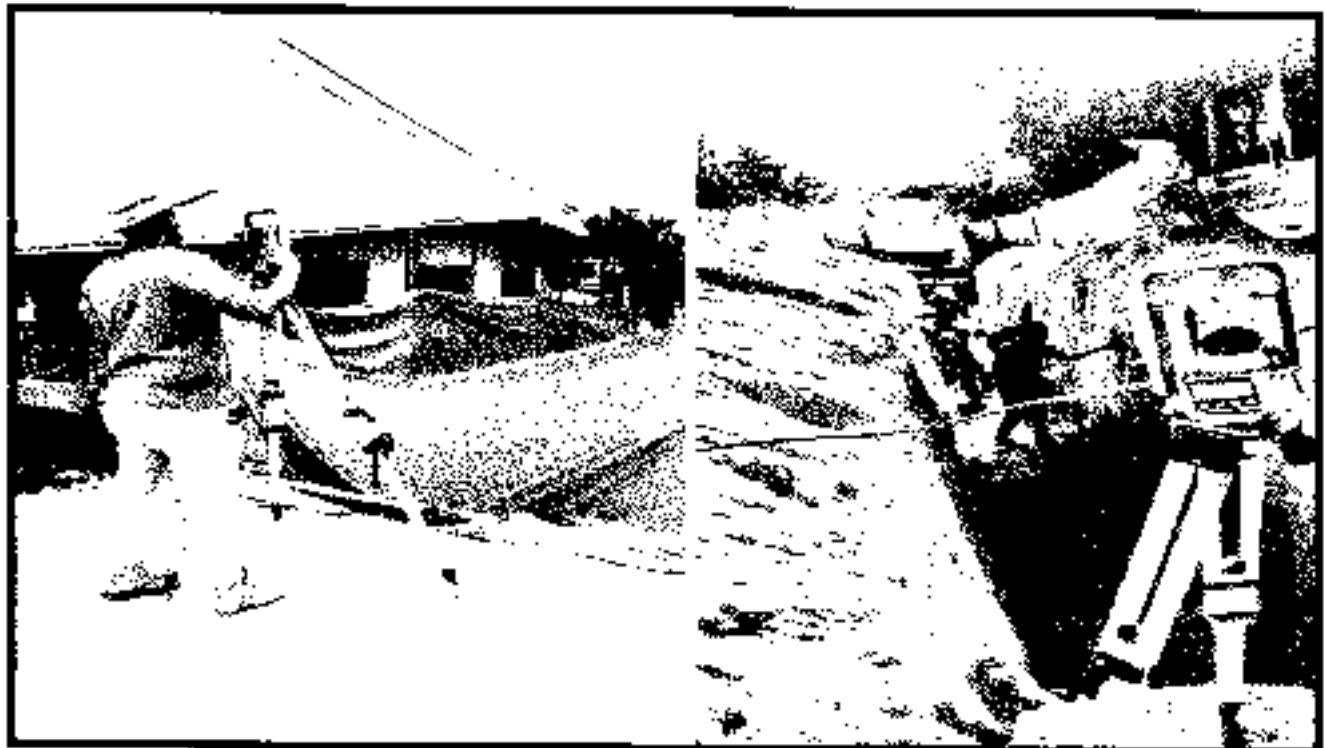

1.05 Desinstalación Tubería existente

Se realizó la desinstalación de tubería gres existente que se debía retirar para la correcta ejecución de la obra previamente indicada en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto.

353 64 28

M2lucyvalvictorias@gmail.com


Correa 8 No. 10 - 38

Lebría, Santander

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
1.05	256,65	18,00	238,65

Se esta cumpliendo con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoria y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

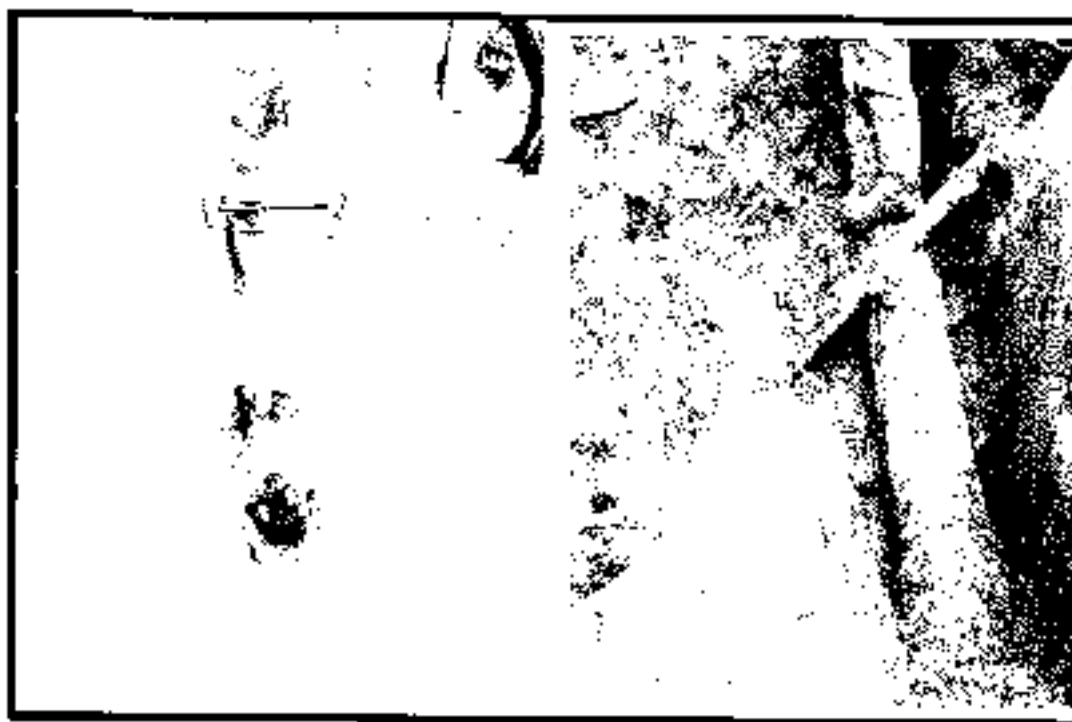

RED DE ACUEDUCTO

2.01 Excavación en material común

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.01	102,00	0,00	102,00

2.02 Relleno compactado material común

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.02	34,00	0,00	34,00

2.03 Relleno seleccionado

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.03	42,50	0,00	42,50

2.04 Relleno en arena para cimentación de Tubería

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.04	25,50	0,00	25,50

2.05 Concreto para atraque 3000 psi

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

656 64 28

M2construccion@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Lebrija, Santander



El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.05	5,31	0,00	5,31

2.06 Cargue y retiro de material sobrante

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.06	68,00	0,00	68,00

2.07 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios UM

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.07	84,30	0,00	84,30

2.08 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios UM

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.08	128,20	0,00	128,20


2.09 sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi

656 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Levija, Santander



Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.09	1,00	0,00	1,00

2.10 sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.10	1,00	0,00	1,00

2.11 sum e Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.11	1,00	0,00	1,00

2.12 TEE Hierro Ductil de 3"

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.12	2,00	0,00	2,00

2.13 TEE Hierro Ductil de 2"

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.13	2,00	0,00	2,00

2.14 Codo 90° Hierro Ductil 2"

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.14	4,00	0,00	4,00

2.15 Codo 45° Hierro Ductil 2"

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.15	2,00	0,00	2,00

2.16 Acometida Hidráulica

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
2.16	16,00	0,00	16,00

RED DE ALCANTARILLADO


3.01 Excavación en material común

Se realizaron excavaciones del material común y de acuerdo con los lineamientos y dimensiones descrito en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.01	391,52	388,03	3,49

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, fue necesario mayor excavación debido a que se encontraron irregularidades en la instalación inicial del alcantarillado existente.

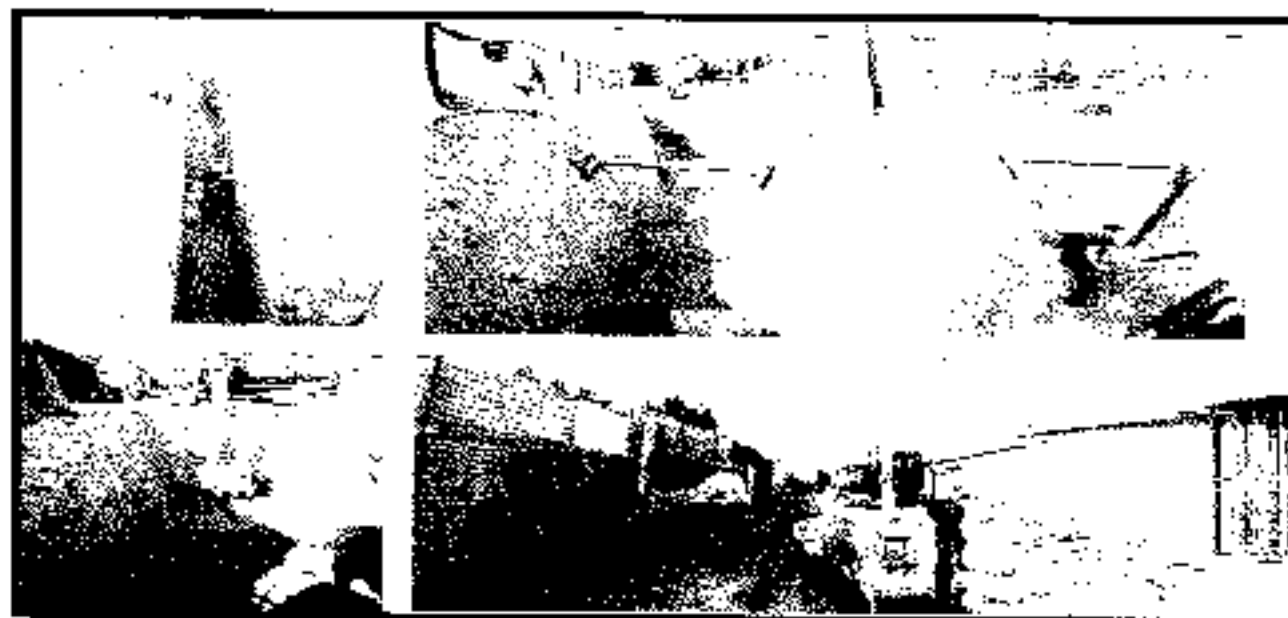

3.02 Relleno compactado material común

656 64 78

m2lconstructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 35

Lebrija, Santander

Se realizaron rellenos con material común de acuerdo con los lineamientos y dimensiones en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado previamente revisado y aprobado por la interventoría.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.02	143,59	66,42	77,17

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la Interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.




3.03 Relleno seleccionado

Se realizaron rellenos con material seleccionado de acuerdo con los lineamientos y dimensiones descritos en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.03	102,36	59,80	42,56

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la Interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

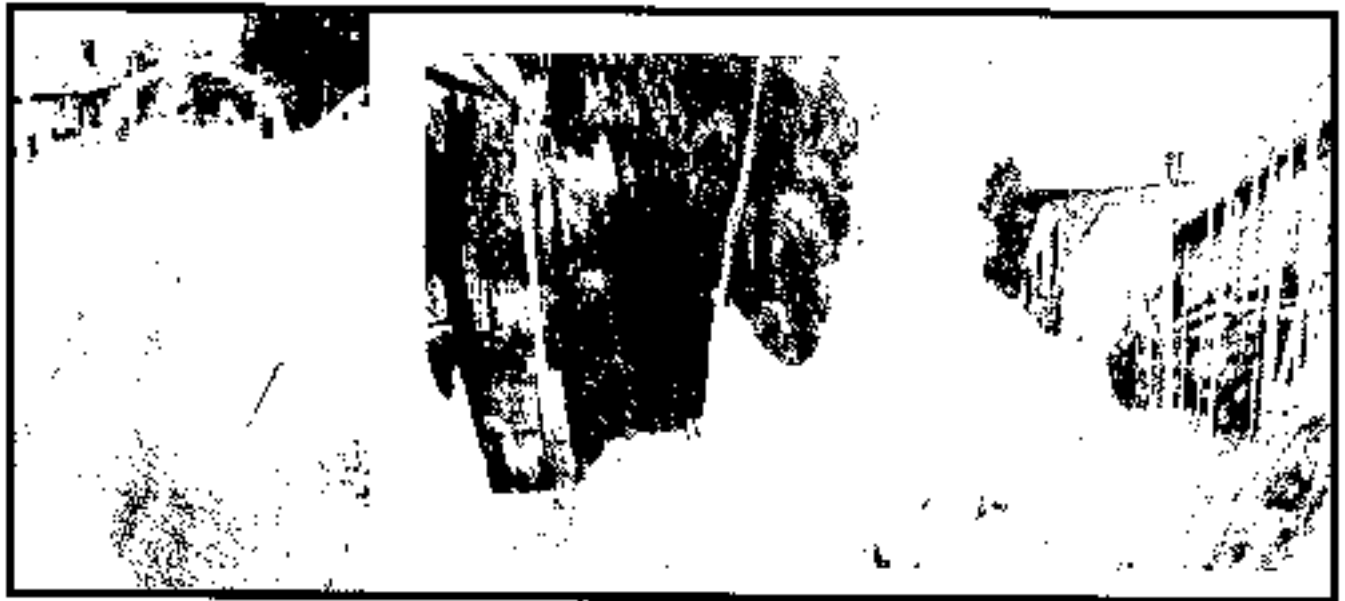

3.04 Relleno en arena para cimentación de Tubería

Se realizaron rellenos para la cimentación de la tubería de acuerdo con los lineamientos de la tubería, nivelación y pendiente indicados en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado previamente revisados y aprobados por la interventoría.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.04	102,36	54,72	47,64

656 54 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 13 - 38

León, Santander



Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



3.05 Cargue y retiro de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado por la entidad competente de los materiales sobrantes que resultaron de las demoliciones, excavaciones y desinstalaciones ejecutadas en la obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.05	247,93	232,82	15,11


556 64 26

m2lconstruccion@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Lobos, Santander

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

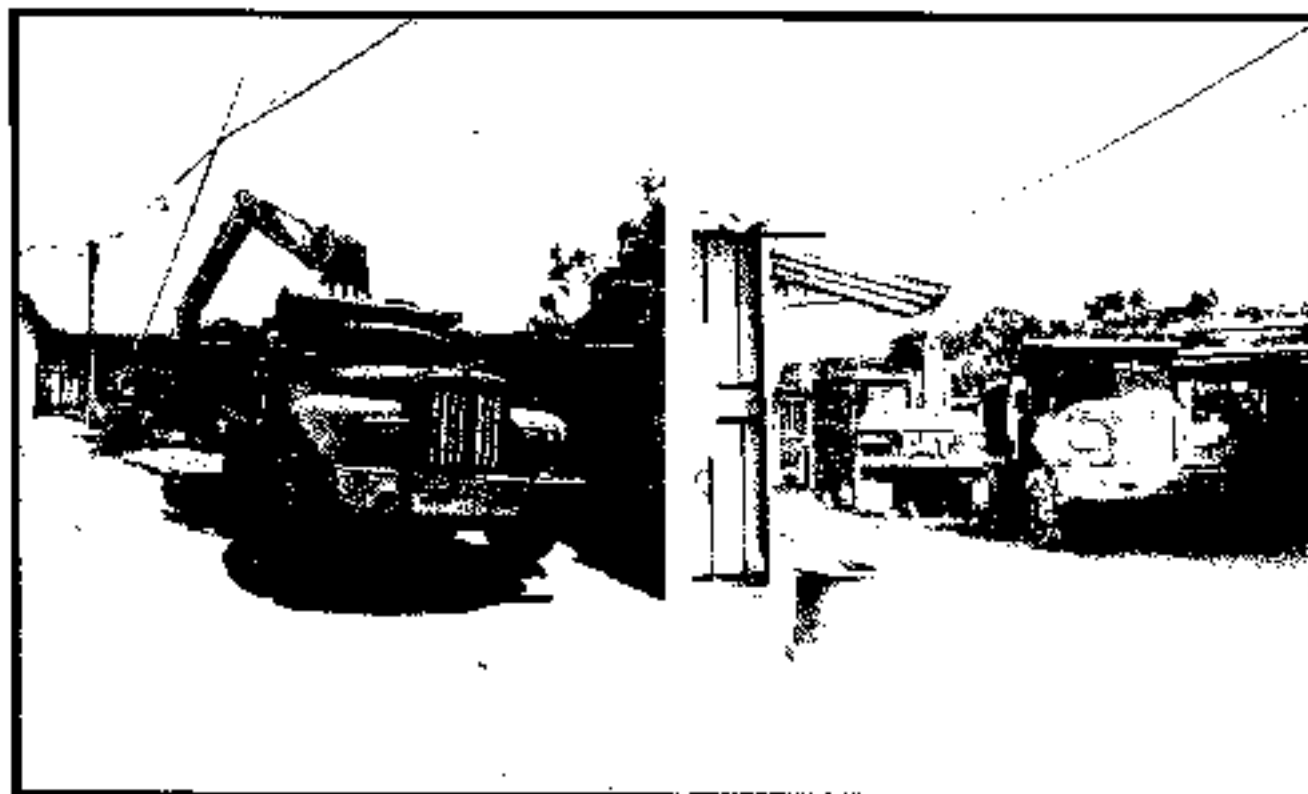

3.06 Sum. e Inst. Tubería Novafor de 12"

Se realizó la instalación de tubería de 12" de acuerdo con los lineamientos y dimensiones indicados en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado cumpliendo con los parámetros y especificaciones.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.06	148,30	18,00	130,30


656 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 5 No. 10 - 38

Labrida, Santander

Se esta cumpliendo con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

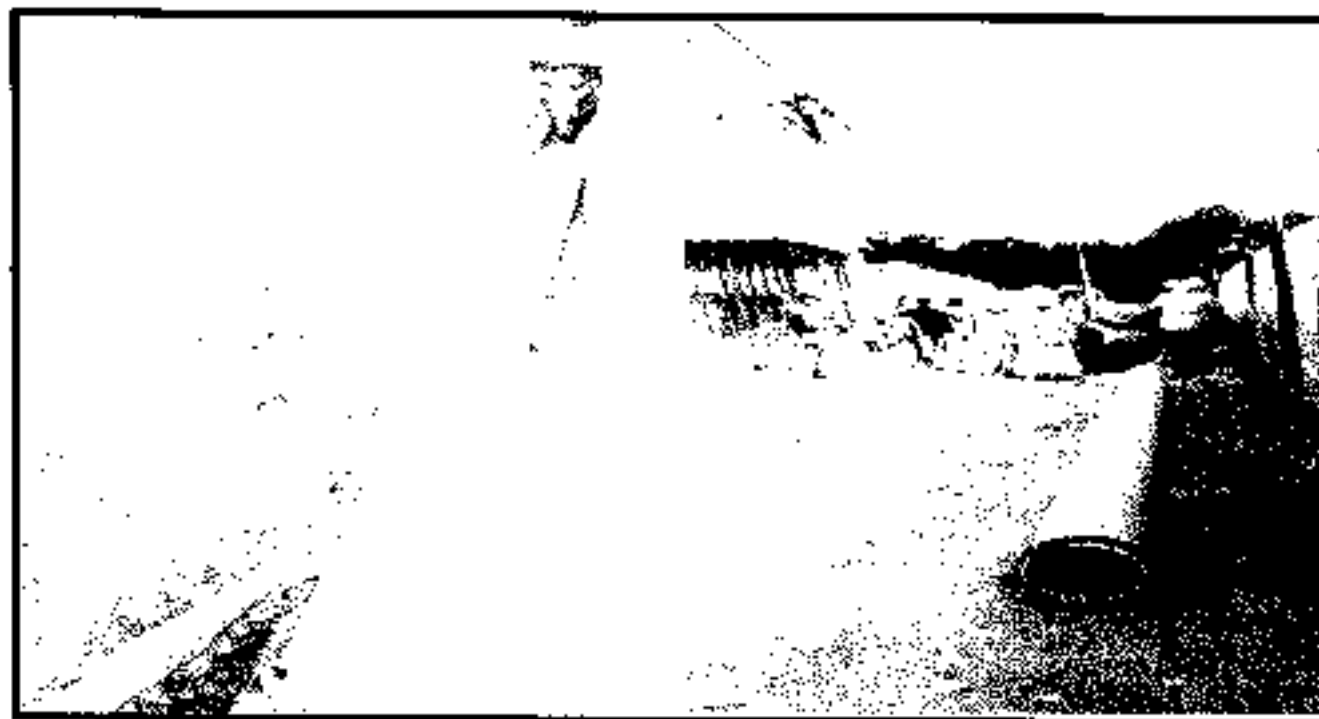

3.07 sum e Inst. Tubería Novafor de 10"

Se realizó la instalación de tubería de 10" de acuerdo con los lineamientos y dimensiones indicados en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado cumpliendo con los parámetros y especificaciones.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.07	144,15	12,00	132,15

Se esta cumpliendo con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

656 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Leopía, Santander





3.08 Acometida Alcantarillado

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
3.08	16,00	0,00	16,00

POZOS Y SUMIDEROS

656 64 20

M2Constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 28

Lebría, Santander

4.01 Sumidero Transversal

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
4.01	18,00	0,00	18,00

4.02 Sumidero Lateral SL200

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
4.02	2,00	0,00	2,00

4.03 Construcción Pozos de inspección D=1,20m H=(1,2-2,0)m

Se realizó la construcción de 2 pozos de inspección de D=1,20m H=(1,2-2,0)m de acuerdo con los lineamientos y dimensiones indicados en los planos para la instalación del sistema de alcantarillado cumpliendo con los parámetros y especificación.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
4.03	11,00	2,00	9,00

Se cumplió con la actividad de acuerdo con los requisitos y recomendaciones establecidos por la interventoría y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



4.04 Mejoramiento pozos existentes

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:

ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
4.04	1,00	0,00	1,00

4.05 conexión a pozo existente (incluye demolición y embone)

Esta actividad no se ejecutó para este corte de obra.

El balance de esta actividad al presente corte es:


ITEM	CANTIDADES Y/O CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES POR EJECUTAR
4.05	1,00	0,00	1,00

656 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 13 35

Lebrija, Santander



656 64 28
M2construccion@gmail.com
Carrera 8 No. 10 - 38
Bogotá, Colombia
Leija Santander

655 64 25

656 4 28

[illegible]

DATE WHEN WORK DONE	CONTRACT NO.	
1957-1958	100	
1958-1959	101	
1959-1960	102	
1960-1961	103	
1961-1962	104	
1962-1963	105	
1963-1964	106	
1964-1965	107	
1965-1966	108	
1966-1967	109	
1967-1968	110	
1968-1969	111	
1969-1970	112	
1970-1971	113	
1971-1972	114	
1972-1973	115	
1973-1974	116	
1974-1975	117	
1975-1976	118	
1976-1977	119	
1977-1978	120	
1978-1979	121	
1979-1980	122	
1980-1981	123	
1981-1982	124	
1982-1983	125	
1983-1984	126	
1984-1985	127	
1985-1986	128	
1986-1987	129	
1987-1988	130	
1988-1989	131	
1989-1990	132	
1990-1991	133	
1991-1992	134	
1992-1993	135	
1993-1994	136	
1994-1995	137	
1995-1996	138	
1996-1997	139	
1997-1998	140	
1998-1999	141	
1999-2000	142	
2000-2001	143	
2001-2002	144	
2002-2003	145	
2003-2004	146	
2004-2005	147	
2005-2006	148	
2006-2007	149	
2007-2008	150	
2008-2009	151	
2009-2010	152	
2010-2011	153	
2011-2012	154	
2012-2013	155	
2013-2014	156	
2014-2015	157	
2015-2016	158	
2016-2017	159	
2017-2018	160	
2018-2019	161	
2019-2020	162	
2020-2021	163	
2021-2022	164	
2022-2023	165	
2023-2024	166	
2024-2025	167	
2025-2026	168	
2026-2027	169	
2027-2028	170	
2028-2029	171	
2029-2030	172	
2030-2031	173	
2031-2032	174	
2032-2033	175	
2033-2034	176	
2034-2035	177	
2035-2036	178	
2036-2037	179	
2037-2038	180	
2038-2039	181	
2039-2040	182	
2040-2041	183	
2041-2042	184	
2042-2043	185	
2043-2044	186	
2044-2045	187	
2045-2046	188	
2046-2047	189	
2047-2048	190	
2048-2049	191	
2049-2050	192	
2050-2051	193	
2051-2052	194	
2052-2053	195	
2053-2054	196	
2054-2055	197	
2055-2056	198	
2056-2057	199	
2057-2058	200	
2058-2059	201	
2059-2060	202	
2060-2061	203	
2061-2062	204	
2062-2063	205	
2063-2064	206	
2064-2065	207	
2065-2066	208	
2066-2067	209	
2067-2068	210	
2068-2069	211	
2069-2070		

3

~~YBQ: SE YLS JPL LNO:
S' W 82401 08HIC007 12M
JAN 95 230000ZD TPO-HF-61234~~

656 44 29

[illegible]

M2Iconstructores@gmail.com
Carrera 8 No. 10-35 
León J. Santander

2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre y el 06 de diciembre de la ejecución de la obra se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Adquisición de las pólizas exigidas por la empresa contratante (Anexo 2).
- Instalación de valla informativa del proyecto (Anexo 4).
- Socialización del proyecto con la comunidad del barrio Villa Paraíso (Anexo 5).
- Contratación del personal inicial para la ejecución de la obra (Anexo 6).
- Afiliación al Sistema de Seguridad Social y Caja de compensación familiar del personal que ingreso a la obra (Anexo 7).
- Recepción y verificación de los exámenes ocupacionales de ingreso (Anexo 8).
- El día 22 de noviembre se dio apertura de la Bitácora de obra.
- Compra y/o alquiler de los materiales, herramientas y suministros para iniciar las actividades (Anexo 9).
- Registro con periodicidad semanal de las actividades mediante bitácora de obra conjunta con la interventoría (Anexo 10).
- Seguimiento de los programas de trabajo para el cumplimiento del cronograma de trabajo.
- Pago correspondiente a los últimos días del mes de noviembre y los días de ejecución durante el mes de diciembre del Sistema de Seguridad Social y Caja de Compensación familiar de los trabajadores (Anexo 11).
- Recepción, contestación y envío de correspondencia relacionada con la ejecución de la obra.

2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Se recibió el anticipo dado lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Obra No. 107-2021 por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$115.902.754,50). El cual ha sido utilizado conforme al Plan de Inversión de Anticipo presentado ante la entidad contratante (Anexo 13).

2.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

De acuerdo a las actividades que se desarrollan en la obra, a continuación, se relaciona la normatividad vigente y la implementación de acciones de carácter ambiental para la ejecución de la obra:

Tabla No. 4

Normatividad y acciones ambientales

NORMA	DESCRIPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN
Resolución 541 de 1994	Regulación del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.	Adecuado almacenamiento del material que ingreso a la obra, la disposición final del material excavado y los escombros generados los cuales se trasladaron al sitio de disposición final. No se generaron ningún tipo de residuos peligrosos.
Ley 1259 de 2008	Aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.	Los residuos producto de la actividad antrópica del personal como de las actividades propias que ellos desarrollan, son de tipo convencional ordinarios, los cuales se disponen adecuadamente en el centro de acopio dispuesto por el contratista en el frente de trabajo, realizando la respectiva separación en la fuente para luego ser recogidos periódicamente por el compactador recolector de aseo del municipio de Lebrija.

456 64 28

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 39

Lebrija, Surcoander

Norma ISO 14001	Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente.	Capacitación a todo personal contratado sobre las normas ambientales aplicables a la obra. Capacitar al personal sobre clasificación y reciclaje de los residuos del proyecto.
Ley 769 de 2002	Código Nacional de Tránsito	Reducción de emisiones de gases de combustión; se exige el certificado de revisión técnica de los vehículos utilizados en el cargue y descargue.
Decreto 948 de 1995 Resolución 0627 de 2006	Restricción de ruido a niveles máximos permisibles, horario y días de emisión de ruido	Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 decibelios, se trabaja sólo en jornada diurna y por períodos cortos de tiempo de manera que considere la menor afectación posible a la comunidad y garantice al mismo tiempo el rendimiento esperado.

AFECTACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

Generación de material particulado (polvo) debido al movimiento de tierra

Emisiones de gases provenientes de los vehículos dispuestos para el transporte de materiales y vehículos de maquinaria pesada

Generación de ruido en la ejecución de descargue de material, trabajos en la maquinaria pesada, cortes de materiales, excavaciones, arranque de equipos de bombeos

Generación de residuos sólidos (material de desmonte), efluentes líquidos, sobrantes de material, empaques, etc.

2.5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para M2L CONSTRUCTORES S.A.S. es crucial el rendimiento en el desarrollo de las actividades; así mismo resalta que el factor de éxito que permite la correcta

656 64 28

M2lconstructores@gmail.com

Carrera 5 No. 10 - 28

Lebrón, Santander

ejecución de la obra es el personal que tiene relación directa e indirecta con el objeto del contrato. Por tanto, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo permite el cuidado, prevención y mitigación de los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores.

En el Anexo 15 se pueden apreciar las actividades realizadas para la oportuna y optima implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.6. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Como parte de los compromisos asumidos por M2L CONSTRUCTORES S.A.S. se encuentra la confiabilidad y garantía de calidad de los elementos usados en todas las fases que conllevan la obra. La revisión y análisis de calidad de los materiales es un proceso riguroso que permite la adquisición de productos certificados en cuanto a calidad y garantía (Anexo 09).

Conjuntamente se verifico el proceso de inducción realizado por el Profesional SST al personal que ingreso a la obra (Anexo 14); así mismo, se realizó seguimiento a la correcta utilización, almacenamiento y conservación de los elementos de protección personal.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre y el 06 de diciembre del año 2021 la obra lleva un avance del 23,37%; sin embargo, se han presentado contratiempos de tipo técnico y logístico que han retrasado el avance y rendimiento establecido en el cronograma de trabajo.

PERSONAL UTILIZADO EN EL PROYECTO

Tabla No. 5

Personal M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

M2L CONSTRUCTORES S.A.S.	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	CESAR AUGUSTO REY QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA	MARLON OSWALDO LOPEZ HIDALGO

556 64 28

M2lconstructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 28

Lebija, Santander

PROFESIONAL SST	SILVA JULIANA CARRILLO ABRIL
AUXILIAR DE OBRA	WILMER FABIAN CRISTANCHO LOPEZ
AUXILIAR DE OBRA	JUAN ESTEBAN FORERO RIVERA
AUXILIAR DE OBRA	JONATAN GERVEL HERRERA GUARDO
AUXILIAR DE OBRA	JEREMIAS SERRANO RUIZ
AUXILIAR DE OBRA	KEVIN JOHAN VARGAS URIBE
AUXILIAR DE OBRA	JORGE EDUARDO CRUZ VELASQUEZ

Tabla No. 6

Personal INTERING S.A.S.

INTERING S.A.S. - INTERVENTORIA	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	OSCAR LEONARDO ALMEYDA
ASESOR AMBIENTAL	KAREN CONTRERAS QUINTERO
ASESOR SST	OSCAR MAURICIO APONTE

Como se puede apreciar el desarrollo de la obra fue llevado a cabo por una planta de personal de M2L CONSTRUCTORES conformada por 09 trabajadores; y por parte de la interventoría del proyecto INTERING S.A.S. de 04 empleados.

EQUIPO UTILIZADO

En periodo mencionado, los equipos utilizados para el desarrollo del objeto del contrato de obra son:

Tabla 7

Maquinaria, equipos y herramientas

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VEHICULOS	VOLQUETA	1
	RETROEXCAVADORA	1
MAQUINARIA	COMPACTADORES	1 SALTARIN 1 RANA
EQUIPOS	CORTADORA	1
	PULIDORA	2
	DEMOLEDOR	1
HERRAMIENTAS MENORES	PALAS	6
	PICOS	6
	TALADRO	2
	PORRA	3
	PALUSTRE	3
	MANGUERA DE NIVEL	1
	MARTILLO	2

656 64 28

M2kconstruccion@gmail.com


Carrera 8 No. 10 - 38

Leónida, Santander

CONCLUSIONES

M2L CONSTRUCTORES S.A.S. ha ejecutado la obra dentro de lo establecido en los documentos del proyecto, garantizando y verificando la calidad de los productos, herramientas y materiales utilizados en el desarrollo de todas las etapas de la obra; así mismo, como pilar fundamental de la empresa, ha implementado el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal que labora encaminado a la prevención y mitigación de riesgos que afecten la salud y bienestar de los trabajadores. Otro aspecto importante es la correcta y oportuna gestión ambiental realizada para preservar el medio ambiente y mitigar las posibles afectaciones que se deban incurrir en todos los procesos que se llevan a cabo en la obra.

Pese a los contratiempos que acarrearón un retraso significativo de la obra, M2L CONSTRUCTORES S.A.S. se encuentra comprometido con la ejecución total de las actividades y entrega a satisfacción de la empresa contratante, junto con el personal idóneo, capacitado y con sentido de pertenencia con el Municipio de Lebrija y el desarrollo social que trae consigo la obra.




LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
Representante legal
M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

636 64 28

M2lconstructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Lebrija, Santander



ANEXO 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 107-2021

956 64 22 
w2lconstructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 38 
Lebuja, Santander 



CONTRATO DE OBRA N° 107 DEL 2021	
<u>FECHA DE SUSCRIPCION:</u>	NOVIEMBRE 18 DE 2021
<u>OBJETO:</u>	"CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"
<u>VALOR INICIAL:</u>	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
<u>PLAZO INICIAL:</u>	TREINTA Y OCHO (38) DIAS V/O SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021
<u>CONTRATISTA:</u>	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.
<u>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO</u>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
<u>GARANTIAS</u>	ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO
<u>ANTICIPO:</u>	30% DEL VALOR DEL CONTRATO
<u>VALOR DEL ANTICIPO</u>	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$115.902.754,52)
<u>MUNICIPIO:</u>	LEBRIJA, SANTANDER

Entre los suscritos a saber, de una parte el Dr. **LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS**, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.498.362 expedida en Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, NIT 800.137.201-5 en su calidad de GERENTE GENERAL, nombrado mediante Decreto No. 008, y acta de posesión No. 003 de enero 1 de 2020, con facultades para contratar y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte **M2L CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con el NIT 900500467-6, representado legalmente por el señor **LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL**, identificado con C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija y quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, previas las siguientes declaraciones y consideraciones: 1.) Que dentro del objeto social de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, está la prestación de los servicios públicos domiciliarios de **ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**. Dentro de la MISIÓN de EMPULEBRIJA E.S.P., está la de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios con servicios permanentes y de calidad, generando desarrollo, bienestar y crecimiento en la comunidad, garantizando el uso eficiente y racional de los recursos naturales, para garantizar la prestación del servicio en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad. Que a la ESPL, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demanden su optimización y mejoramiento, promoviendo el mejoramiento social y la calidad de vida de sus habitantes. El contar con un sistema de acueducto en buenas condiciones proporciona a la comunidad una satisfacción de prestación de servicio de alta calidad de suministro y distribución del líquido, dicho servicio prestado por la ESPL, debe asegurar la calidad del mismo, con el fin de cumplir con lo estipulado en la Ley. Por tal razón y teniendo en cuenta que hay sectores donde se requiere que

el alcantarillado sea cambiado por los diámetros que hoy en día se necesitan es indispensable ejecutar las obras que contribuyan a un crecimiento organizado y adecuado del municipio de Lebríja. Que se presentó la propuesta técnica de la CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRÍJA, teniendo en cuenta que hay sectores donde se requiere que el alcantarillado sea cambiado por los diámetros que maneja o por deterioro, por lo tanto se requiere la intervención del sistemas de redes de servicios. 2.) Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por la oficina de gerencia general, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir conveniencia de realizar el presente contrato 3.) Que, dentro del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR LEBRÍJA, CONSTRUIMOS FUTURO 2020-2023, se contempló dentro de la línea estratégica: Gestión y prevención del riesgo y medio ambiente, sector: agua potable y saneamiento básico con calidad y continuidad y el programa: alcantarillado - Recolección - Construcción de vías, descargas. Meta: Realizar la construcción y/o reposición de 2.200 metros lineales de tubería de red de aducción o distribución de agua en el municipio, el cual se identifica con el BPIN: 2021-68-406-0104 de septiembre de 2021. 4.) Que la ESPL, para respaldar económicamente el valor del presente contrato cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 21C00100 de 21 de octubre de 2021, por valor de DOSCIENTOS NOVENA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$290.553.490,50) al CODIGO: 2.3.3.01.02.004.03 y el Certificado de Disponibilidad No. 21A00193 de 21 de octubre de 2021, por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$95.896.964,91) al CODIGO: 2.3.3.01.02.004.06 denominados CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRÍJA", valores estos que previamente fueron adicionados al presupuesto de la actual vigencia, mediante acuerdo de junta directiva. 5.) Que en atención a la naturaleza del objeto y el presupuesto oficial, se dio inicio al proceso de selección del contratista, mediante la modalidad de INVITACION PRIVADA de conformidad con el artículo 37 del Acuerdo 003 de 28 de mayo de 2021. 6.) Que el presente contratista se seleccionó por medio del proceso de invitación privada identificado con el No. 004-2021. 7.) Que en el pliego de condiciones la Entidad, realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. 8.) Que agotado en debida forma el proceso de selección, según las normas que lo regulan, la ESPL expidió la Resolución número 104 de 16 de noviembre de 2021, por medio del cual se adjudica el contrato. 9.) Que existe certificación y registro extraído de la página WEB del SECCP, donde se detalla la publicación que la Entidad surtió del proceso de selección en el Portal Único de Contratación - SECCP. 10.) Que luego de realizada la verificación de requisitos habilitantes y las evaluaciones correspondientes, el comité evaluador consideró que la propuesta presentada por el CONTRATISTA, resultó como ganadora del proceso de selección, encontrándose en primer orden de elegibilidad, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 11.) Que el objeto a ejecutar, se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones de la entidad, según certificado expedido por el profesional de la subgerencia administrativa y comercial. 12.) Que el contratista allegó entre otros los siguientes documentos: Propuesta con todos los soportes requeridos en el pliego, constancia de estar al día en el pago de seguridad social y parafiscal, y formulario del registro único tributario - RUT, por lo anterior, las partes deciden celebrar el presente contrato, el cual se registró por las siguientes CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - denominados CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRÍJA. PARAGRAFO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las señaladas en los estudios previos y su anexo técnico, que forma parte del presente contrato, y definen igualmente actividades, alcances y obligaciones del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los terminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros terminos utilizados con mayúscula inicial

deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos en los documentos referenciados, o en la presente cláusula deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitiva de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el Interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje, o en general, el desarrollo de obra ejecutado.
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevantes.
Contratante	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Contratista	INGENIERÍA FUTURISTA
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO: con la obra se pretende mejorar las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentran ubicadas entre la calle 7 entre carreras 13 y quebrada las raíces del casco urbano del Municipio de Lebrija. **3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.** **3.2 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el interventor y supervisor de la Entidad.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13B Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Cerramiento	ML	372	\$28.333,75	\$8.740.470,17
1.02	Sistema de Señalización del Área de Trabajo	GLB	1	\$1.364.850,00	\$1.364.850,00
1.03	Campamento de Obra (25 M2)	GLB	1	\$4.538.948,00	\$4.538.948,00
1.04	Localización, medición, replanteo y control de obra	MES	2	\$4.734.500,00	\$9.469.000,00
1.05	Desinstalación de Yuberia existente	ML	286,85	\$16.952,60	\$4.860.750,80
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$30.068.598,97
2.00	RED DE ACUEDUCTO				
2.01	Excavación en material común	M3	102	\$42.860	\$4.371.720,00
2.02	Relevo Compacted material común	M3	34	\$59.750,00	\$2.031.500,00
2.03	Relevo Seleccionado	M3	42,5	\$87.630,00	\$3.724.275,00

2.04	Relleño en arena para cimentación de tubería	M3	24,5	\$149.679.00	\$3.916.814,50
2.05	Concreto para atraque 3000 psi	M3	9,31	\$546.122,99	\$1.848.533,10
2.06	Cargue y Retiro de material sobrante a botadero autorizado	M3	66	\$27.987,00	\$1.903.116,00
2.07	Suministro e instalación tubería PVC RNE-2" de 3" incluye accesorios UN	ML	84,3	\$73.026,04	\$6.156.295,17
2.09	Suministro e instalación tubería PVC de 21 de 2" incluye accesorios UN	ML	128,2	\$73.026,04	\$9.361.836,33
2.10	Suministro e instalación válvula compuerta de 3" 300 psi	UN	1	\$905.859,20	\$905.859,20
2.11	Suministro e instalación válvula compuerta de 2" 300 psi	UN	1	\$912.615,20	\$912.615,20
2.11	Suministro e instalación válvula ventosa 1" 300 psi	UN	1	\$680.459,20	\$680.459,20
2.12	TEE hierro dúctil de 3"	UN	2	\$142.761,60	\$285.523,20
2.13	TEE hierro dúctil de 2"	UN	2	\$92.531,60	\$187.063,20
2.14	Codo 90° hierro dúctil 2"	UN	4	\$119.111,60	\$476.446,40
2.15	Codo 45° hierro dúctil 2"	UN	2	\$103.711,60	\$207.423,20
2.16	Acometida Hidráulica	UN	16	\$605.410,25	\$9.685.564,00
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA					\$46.556.385,69
3.00	RÉD DE ALCANTARILLADO				
3.01	Excavación en material común	M3	391,57	\$42.390,00	\$16.700.547,20
3.02	Relleño Compactado material común	M3	143,59	\$59.750,00	\$8.580.938,40
3.03	Relleño seleccionado	M3	102,36	\$87.630,00	\$8.959.806,80
3.04	Relleño en arena para cimentación de tubería	M3	102,36	\$149.679,00	\$15.321.142,44
3.05	Cargue y Retiro de material sobrante	M3	247,93	\$27.987,00	\$6.938.816,51
3.06	Suministro e instalación de tubería novaflex de 12"	ML	145,30	\$175.443,85	\$25.415.212,12
3.07	Suministro e instalación tubería novaflex de 10"	ML	144,15	\$117.392,27	\$17.008.585,61
3.08	Acometida Alcantarillado	UNID	16	\$730.568,60	\$3.680.937,60
SUBTOTAL					\$103.299.587,08
4.00	POZOS Y SUMIDEROS				
4.01	Sumidero Transversal	ML	18	\$2.750.472,42	\$49.508.500,60
4.02	Sumidero Lateral. Si 230	UND	7	\$3.385.418,71	\$23.700.839,42
4.03	Construcción pozo de inspección D=1.20M H=1.2-2.0M	UN	11	\$4.570.237,57	\$50.072.613,29
4.04	Mejoramiento pozo existentes	UN	1	\$152.841,10	\$152.841,10
4.05	Conexión a pozo existente (incluye demolición y entiboque)	UN	1	\$149.571,66	\$149.571,66
SUBTOTAL					106.254.789,05
COSTO DIRECTO					\$786.175.640,75
ADMINISTRACION - 23%					\$92.992.095,83
IMPREVISTOS - 1%					\$2.861.796,41
UTILIDAD - 5%					\$14.308.982,04
TOTAL DEL CONTRATO					\$386.342.515,07

La Subgerencia Técnica Operativa, es la responsable de la identificación y especificación de las características técnicas requeridas para la ejecución del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:**

DESCRIPCION, CANTIDADES Y PRECIO UNITARIO EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EMPULEBRUA, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se consideran

Calle 10 No. 9 - 70 Lebrija - Santander Tel: 656 7825 Cel: 310 812 2325
E-mail: secretariagral@empulebrua.gov.co

como parte integral del mismo. **PARAGRAFO PRIMERO:** Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que genere aumento del valor inicial, la SUPERVISION de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos ítems, la cual contará con el visto bueno de la Interventoría, del Subgerente Técnico y Operativo de la ESPL y la Gerencia General de la Empresa Contratante, para la elaboración y suscripción del respectivo otro si o adición, previa certificado de disponibilidad presupuestal. **PARAGRAFO SEGUNDO:** En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dichas actas requerirán de la aprobación de Interventoría, del Subgerente Técnico y Operativo de la ESPL y la Gerencia General de la Empresa Contratante. - **CLAUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor de la obra será por **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)** de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista y el será pagado de la siguiente forma: **FORMA DE PAGO** Otorgará un anticipo equivalente al **TREINTA (30%) POR CIENTO** del valor del contrato, previa presentación del contrato de obra suscrito y legalizado conforme las disposiciones legales pertinentes, suscripción del acta de inicio y suscripción de acta de desembolso de anticipo y plan de inversión del mismo. El restante se cancelará mediante **acta parciales** de avance real y físico de la obra, previa amortización del anticipo, **hasta completar el noventa por ciento (90%)** del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte o informe de obra aprobados por la interventoría del contrato y el supervisor de la ESPL, en las que se amortizara en el porcentaje entregado. **PARAGRAFO:** Los desembolsos se realizarán de acuerdo con las actas parciales equivalentes a los porcentajes mínimos requeridos de avance real y físico de la obra previa aprobación por parte de la interventoría y/o supervisor, para el seguimiento de los contratos celebrados para la ejecución de la obra. Del valor del acta de recibo final se deberá descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar. **Un saldo final equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato**, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la ESPL, y suscrito el acta de liquidación. Este deberá estar soportado en el acta de entrega y recibo final, mediante la cual se realizará el recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado suscrito entre el responsable del proyecto de LA EMPRESA, el supervisor, el Interventor y El CONTRATISTA, con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que la EMPRESA los recibe a satisfacción sin perjuicio de las obligaciones de garantía que EL CONTRATISTA ha adquirido en virtud del contrato en referencia. **NOTA 1:** En el valor se entiende incluido los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. **NOTA 2:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aporte a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. **NOTA 3: PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:** Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y el supervisor. Los fondos de la cuenta de anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el interventor y el supervisor. Los gastos deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. **NOTA 4: PARA EL MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO, SE APLICARA LAS SIGUIENTES REGLAS:** A) El contratista deberá intervenir, forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión del mismo aprobado por la interventoría. B) El contratista debe permitirle a la interventoría, a la ESPL, y antes de control, sin ningún tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos del anticipo. C) El contratista deberá rendir a la interventoría un informe semanal de gastos del anticipo, incluyendo los soportes de los mismos. D) En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios para la ejecución del contrato. E) Los excedentes, incluidos los rendimientos financieros que genere el anticipo, pertenecen al municipio. Dichos excedentes financieros pueden ser reinvertidos en el proyecto, previa autorización escrita de este último, conforme a lo previsto para el capital inicial o tendiente a sufragar gastos que debiera asumir la entidad estatal. En el evento de no ser reinvertidos, deberán ser reintegrados al municipio, debiendo el futuro contratista remitir a la entidad relación actualizada de dichos reintegros especificando rendimiento financiero (valores) generados, fechas y cuentas de reintegro (suministrada por la entidad). F) El plan de inversión deberá estar ajustado a los programas o cronogramas de obra y flujos de recursos con el fin de permitir al contratista mantener flujo de caja adecuado durante la ejecución del contrato. G) la interventoría deberá llevar un registro que demuestre el saldo y los valores que lo conforman. H) La interventoría deberá revisar y aprobar semanalmente los informes semanales y los soportes presentados por el contratista en relación con la inversión del anticipo y la relación de los gastos.

El interventor remitirá al supervisor estos informes aprobados. 1) los informes semanales de manejo del anticipo deberán estar soportados como mínimo por los siguientes documentos: 1) Plan de Inversión vigente. 2. Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cuales deben cumplir lo establecidos por la ley. No se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de nómina y/o planilla de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y cargo. 3) Certificación bancaria de rendimiento. 4) El interventor verificará que no haya diferencia entre saldos que se registren en el extracto, con el registro de gastos e el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se compruebe que el contratista les dio los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada deberá informar inmediatamente al supervisor de la ESPL, con los soportes correspondiente a fin de que se estudie la posibilidad de hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo e inicio de acciones administrativas y judiciales procedentes. **NOTA 5: SUJECCION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Los pagos a los cuales está obligado la ESPL y la entrega del anticipo se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la Tesorería, previo agotamiento de los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos de la entidad. Lo anterior, sin perjuicios de los trámites presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reserva presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago así como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados o patrimonio autónomo. **NOTA 6: AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El valor del Anticipo será amortizado en las actas parciales de obra completas el 100% del anticipo entregado. **PARAGRAFO 6: MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el supervisor de la ESPL, y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo a las disposiciones legales. **PARAGRAFO 7: DEDUCCIONES:** EL CONTRATISTA autoriza a la ESPL, para que por conducto de su Tesorería General, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzas y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción. Los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLAUSULA SEXTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista hace las siguientes declaraciones: **A.** Conoce y acepta los documentos del proceso. **B.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de la ESPL, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **C.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **D.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo anexo del pliego de condiciones. **E.** El contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **F.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **G.** El contratista durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido en la **CLAUSULA SEPTIMA** del presente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** se fija el término de plazo del contrato en TREINTA Y OCHO (38) DIAS una vez suscrita el acta de inicio. **PARAGRAFO PRIMERO. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el acta de inicio de la obra. **PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, es la fecha en la cual se suscriba entre las partes para ser cancelado y deberá estar soportado en el acta de entrega y recibo final, el contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidas en el presente contrato y sus anexos. **PARAGRAFO TERCERO. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El cronograma estimado de la obra del presente contrato, resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante, y forma parte del presente contrato; el cual debe ser aprobado por el interventor y el supervisor de la entidad. **CLAUSULA OCTAVA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA** queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1) Cumplir con lo establecido para el efecto del artículo 50 de la ley 789 2002, y la ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y la invitación realizada. 3) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como el tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 4) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos

que se instalen en la obra. 5) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA - EMPULEBRJA. 6) Presentar al interventor informes quincenales de avance de la obra, la cual será sometida a la consideración de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA - EMPULEBRJA. Igualmente presentar informe final. 7) Presentar para aprobación del interventor, actas parciales y finales de obra. 8) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 9) Responder por los impuestos que causa la legalización del contrato. 10) Atender en forma permanente la dirección de la obra, y mantener al frente de las obras un ingeniero civil, y residente obra, el cual debe ser aceptado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.L. EMPULEBRJA. 11) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. - EMPULEBRJA. 12) Reparar las vías de acceso a los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. 13) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 14) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utiliza y a terceros en la ejecución del contrato. 15) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra. b) Manipulación de equipos herramientas combustibles y todos los elementos que se utilizan para cumplir el objeto. c) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes. 16) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 17) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 18) Acatar las órdenes e instrucciones del interventor del contrato. 19) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. EMPULEBRJA. 20) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 21) Cumplir con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000 y sus modificaciones expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 22) Realizar el control de calidad de las obras. 23) Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras. 24) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA. 25) Aceptar el control de la Interventoría. 26) Asistir a los comités técnicos realizados con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA. 27) Implementar todas las normas de bioseguridad dentro de la obra con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19. 28. El contratista deberá hacer entrega las garantías requeridas en el contrato debida forma en un plazo **no mayor a tres (03) días una vez firmado el contrato**, esto es, con las coberturas, amparos, plazos, objeto y demás condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones, así como los demás documentos necesarios para la legalización de este, dentro del término establecido en el cronograma contractual; es decir, no mayor a tres (03) días. En el evento de que las pólizas sean objeto de corrección por parte (de la aseguradora para su aprobación por parte de EMPULEBRJA E.S.P.L.), esta corrección debe surtirse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes; por lo tanto, el Contratista deberá tener el cuidado y prevención necesarias en la entrega de las pólizas en debida forma para no incumplir el plazo establecido para su cumplimiento. 29) Así mismo es obligación del Contratista, una vez legalizado el Contrato, proceder a iniciar y suscribir el acta de inicio dentro de un plazo no mayor a tres (03) días, no pudiendo sustraerse a esta obligación dentro de dicho término, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. 30) Disponer un establecimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, oficios y/o solicitudes sobre la ejecución de la obra. 31) Instalar la valla informativa del contrato. 32) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas debiendo aportar de su cuenta los materiales necesarios para la ejecución de la obra, no pudiendo hacer uso del agua de la planta de tratamiento de la empresa ESPL. 33) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición de la entidad y de los entes de control. 34) Llevar una bitácora de la obra. 35) Asistir a los Comités técnicos realizados por la ESPL. 36) Presentar informes **quincenales**, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Cantidades de obra ejecutadas. C) Registros fotográficos. D) Resultados de los ensayos de materiales y de más pruebas realizadas. E) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. F) Resumen de las actividades realizadas. G) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. H) Actualización del programa de ejecución de obra. 3) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener: a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra y Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría. c) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. d) Acreditación, de acuerdo con la ley que se encuentra al

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 37). Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos de obra, aprobados por la Interventoría, las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 38).- Mantener un punto de atención de atención para la comunidad donde los ciudadanos puedan interactuar con el contratista. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma. **CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA se obliga para con el contratista a: 1.- Pagar al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. 2.- Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo y condiciones establecidas. 3.- Suministrar la información requerida para la ejecución del contrato. 4.- Formular por escrito las sugerencias sobre los puntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía del contratista de la obra. 5. Recibir la obra en la fecha de la entrega, siempre que cumpla con las condiciones de calidad y las especificaciones contratadas. 6.- Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación del objeto del presente contrato. 7.- Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. **CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** El Contratista acepta expresamente los principios contenidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, sobre terminación, modificación e interpretación unilateral del contrato. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS, PENAL PECUNIARIA:** En caso de terminación unilateral o caducidad del contrato, El Contratista pagará a favor de LA EMPRESA, el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, a título de indemnización, por los perjuicios causados, la cual se podrá hacer efectiva del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, sin perjuicio de las demás acciones legales. **PARAGRAFO PRIMERO:** La EMPRESA aplicará multas en los siguientes casos: A) Por incumplimiento en los términos de legalización del contrato: Si el contratista no allega los documentos para la legalización del mismo. B) Por incumplimiento en la constitución y legalización de las garantías: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula correspondiente. Si pasara más de treinta (30) días en calendarios sin que el CONTRATISTA haya cumplido con sus obligaciones la EMPRESA podrá declarar la caducidad del contrato. C) Por incumplimiento de las actividades y procedimientos. D) Por incumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral, y parafiscales. E) Por incumplimiento en las obligaciones del contrato o cumplimiento deficientemente o por fuera del tiempo estipulado. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para la imposición de la multa se deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, como garantía de los derechos de audiencia y defensa y respeto del debido proceso así mismo de deberá convocar a la compañía aseguradora garante. La aplicación de la multa se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, la EMPRESA pueda hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria o el cobro de perjuicios causados. **PARAGRAFO TERCERO:** El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato que la EMPRESA en relación con las multas impuestas exigibles, las descuenta de las sumas que se le adeude, sin perjuicio de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley a través del cobro coactivo o de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD.** LA EMPRESA podrá declarar la caducidad del contrato cuando ocurra algún hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto administrativo, debidamente motivado, con el cual se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad configura el siniestro de incumplimiento, y en tal virtud, la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, y la exigibilidad de la garantía en lo concerniente al cumplimiento del contrato si la hubiere, sin perjuicio de la imposición y cobro de la multa a que hubiere lugar. Estos valores los podrá deducir LA ENTIDAD de los saldos pendientes de pago a favor de El Contratista. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:** El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la EMPRESA y del Municipio de Lebrija, Santander, dentro de los TRES (3) días hábiles subsiguientes a la suscripción del contrato, para la aprobación del presente contrato, garantía única otorgada por una compañía de seguros o aprobación del presente contrato, , autorizada para funcionar en Colombia que ampare los siguientes riesgos: **A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** para proteger a la EMPRESA de la apropiación o la destinación

indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantía deberá corresponder al 100% de la suma pagada a título de anticipo y su vigencia debe ser hasta la liquidación del contrato. **B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO:** para precaver perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía será del 20% del valor del contrato y su vigencia debe ser hasta la liquidación del contrato. **C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato se aplicará lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.5. del Decreto 1082 de 2015, 200 SMLMV, su vigencia será por el PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. **D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más. **E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. Su cuantía será del 10% del valor del contrato y con una vigencia del plazo total del contrato y cinco (5) años más. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El contratista es una entidad independiente de la ESPL, y en consecuencia, el CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la ESPL, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CESIONES.** El Contratista no podrá ceder sus derechos y deberes, emanados del presente contrato, en persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de LA ENTIDAD; pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN.** El contratista puede subcontratar con cualquier tercero las ejecuciones de las actividades relacionadas en el presente contrato, sin embargo; el contratista debe comunicar de estas contrataciones a la ESPL y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA contra todo reclamo, demandas contenciosas, civiles y contra reclamaciones laborales de cualquier índole, inherentes al desarrollo del presente contrato. Para hacer efectiva esta indemnización, la EMPRESA, notificará por escrito a EL CONTRATISTA de los detalles de cualquier siniestro, reclamo, demanda, pleito, acción legal, o cobranza de cualquier género o naturaleza, dentro de los diez (10) días siguientes de tener conocimiento de la existencia de los mismos, debiendo este acudir de manera inmediata a la sustitución, cubrimiento y aseguramiento de la EMPRESA, quien en todo momento se entenderá y tendrá indemne y ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen única y exclusiva responsabilidad del contratista. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control del CONTRATISTA y que no impliquen su falta o negligencia, de acuerdo con lo establecido por la ley. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.** Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la ESPL con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de manera directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: a) **AMIGABLE COMPOSICIÓN** cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante una organización que tramita la amigable composición, previa solicitud de arreglo directo. El amigable compositor será una sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. b) **CONCILIACIÓN:** cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición de se someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente entre las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga la Procuraduría delegada, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en el desarrollo del presente contrato deben constar por escrito, y se entenderán

debidamente efectuadas, solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y las direcciones indicadas a continuación:

CONTRATANTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL,

Nombre del Gerente General: **LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS**

Dirección: **Calle 10 No. 9-73 Barrio Centro de Lebrija**

Teléfono: **65678228**

Correo electrónico: **gerencia@empulebrija.gov.co**

CONTRATISTA.

M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

NIT No. 9005000467-6

R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL


C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.

Dirección: **Carrera 8 No 10-38 Oficina 102 Barrio el Centro de Lebrija-Santander.**


Correo electrónico: **gerencia@m2lconstructores.com**

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISIÓN. -El control y vigilancia del presente contrato en su parte administrativa estará a cargo de la Subgerencia Administrativa y Comercial o de la Persona que sea designada por la Gerencia de la entidad y la supervisión técnica por parte del Subgerente Operativo y Técnico de la empresa, quienes no podrán sin autorización escrita y previa de la entidad, impartir orden alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato. Son funciones del Supervisor además de las propias conforme con las normas legales vigentes sobre la materia, estipuladas en el artículo 4 de la ley 80 de 1993, el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, y el manual de contratación de la entidad; las siguientes: a) solicitar al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de objeto contratado. b) Adelantar las gestiones para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. c) Certificar la entrega y verificar la óptima calidad de los bienes adquiridos en virtud de este contrato. d) Liquidar el contrato. e) Cumplir con todas las señaladas en los Estudios y Documentos previos. f) Las demás inherentes al desarrollo cabal del objeto contractual. PARAGRAFO: El contratista deberá acatar las determinaciones y sugerencias de la supervisión y las que se requieran para un correcto desarrollo del mismo quien informará a EMPULEBRIJA ESPL y al CONTRATISTA de manera inmediata cuando no se realice la labor contratada bajo los parámetros de calidad y cumplimientos exigidos, en desarrollo de sus atribuciones deberá informar a EMPULEBRIJA ESPL. Sobre la marcha y cumplimiento del contrato. En caso de que se presente un incumplimiento de unas de las obligaciones es causal para terminación unilateral del presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTERVENTORIA:** La interventoría del presente contrato está a cargo de la persona escogida para tal fin por esta empresa, previo los agotamientos del proceso contractual. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ANEXOS DEL CONTRATO.** - los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1) estudios y documentos previos, Pliego de condiciones. 2) anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso. 3) la propuesta económica presentada por el contratista. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** el presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecución se requiere suscripción del acta de inicio, previa constitución del respectivo registro presupuestal, la apropiación de la garantía única, y acreditación a la Entidad que se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar; (Art. 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el Art. 23 de la ley 1150 de 2007). **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La entidad pagará al CONTRATISTA con el certificado de disponibilidad presupuestal 21C00100 de 21 de octubre de 2021, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$290.553.490,50) el CODIGO: 2.3.3.01.02.004.03 y el Certificado de Disponibilidad No. 21A00193 de 21 de octubre de 2021, por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$95.896.964,91) el CODIGO: 2.3.3.01.02.004.06 denominados CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA", valores estos que previamente fueron adicionados al presupuesto de la actual vigencia, mediante acuerdo de junta directiva. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente contrato está sujeto al registro presupuestal, y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal. Las partes

deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello deben comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION:** Posterior a la suscripción del acta de recibo final, las partes deben liquidar el contrato, conforme a las normas que regulan la materia. En caso que el contratista se oponga o no exista un acta de recibo final, la ESPL, puede liquidar unilateralmente el presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- LUGAR DE LA EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente contrato se ejecutaran en los lugares señalados en el objeto del contrato y en los respectivos estudios previos y el pliego de condiciones, pero se deja claro que la obra se llevara a cabo en el casco urbano del municipio de Lebrija. Para constancia se firman en Lebrija a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2021.



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS.
Gerente General ESPL.




MZL CONSTRUCTORES SAS.
NIT # 9005000467-6

R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
C.C. # 13.539.772 expedida en Lebrija.

Proyecto: 14011E-RE0462-MILANOWA
Subproyecto: Administración y Construcción

Revisó: CARLOS EMILIO RODRIGUEZ SUAREZ
Jefe de Construcción



.....
.....

ANEXO 2

POLIZAS VIGENTES Y ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

656 64 25



M2constructores@gmail.com



Carretera 8 No. 10 - 32



La Balsa, San Juan de los Rios

La Balsa, San Juan de los Rios



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.**
NIT 8001572015

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

En Lebrija a los Veintidós (22) días del mes de Noviembre de 2021, el Subgerente Técnico-Operativo de esta entidad procede a analizar el contenido de las pólizas presentadas por M2L CONSTRUCTORES SAS, como garantía del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021. Lo anterior teniendo en cuenta las normas pertinentes al código de Comercio, la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007, y en especial el artículo 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.


CONCEPTO DEL AMPAÑO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASSEGURADO
		DESDE (DÍAS/MES/AÑO)	HASTA (DÍAS/MES/AÑO)			
CUMPLIMIENTO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES SAS	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	30% DEL VALOR DEL CONTRATO \$77.258.519,00
SUMA MANEJO CPL ANTICIPA	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES SAS	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	30% DEL VALOR DEL CONTRATO \$77.258.519,00
PAGO DE SUMAS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES SAS	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$25.752.859,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES SAS	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$25.752.859,50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	B-100004604	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES SAS	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	200.000.000.000

Las pólizas allegadas por el contratista para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021, cumplen con los requerimientos exigidos, procediendo este Despacho a APROBAR LAS MISMAS.

Dada en Lebrija a los Veintidós (22) días del mes de Noviembre de 2021

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico-Operativo



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULA 38-81-2011-1517-S-86 +SUBSECUENCIAS 07-0891

NO. POLIZA	NO. CERTIFICADO	NO. REFRENDA
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	SUC. EXTENDIDA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
12/10/2011	31/03/2012	31/03/2012

CONDICIONES PARTICULARES

COBERTURAS

ACCIDENTES

DAÑOS MATERIALES

SEGURO BASICO - PERSONAS, Bienes y cosas ajenas

DE 100% DEL VALOR DE LA PERDIDA - hasta 1.000 millones

ACCIDENTES

DE 100% DEL VALOR DE LA PERDIDA - hasta 1.000 millones

CONTAMINANTES Y SUBCONTAMINANTES

DE 100% DEL VALOR DE LA PERDIDA - hasta 1.000 millones

DAÑOS MATERIALES - NO PROPIOS

DE 100% DEL VALOR DE LA PERDIDA - hasta 1.000 millones





ANEXO 3

ACTAS SUSCRITAS CON LA EMPRESA CONTRATANTE

656 64 25 
milanconstructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 35 
Lebrija, Santander 

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 107-2021

FECHA ACTA INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021			
FECHA DE TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2021			
CONTRATO No	107-2021			
FECHA DE CELEBRACION	18 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CLASE	CONTRATO DE OBRA			
MODALIDAD	INVITACION PRIVADA			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS			
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.			
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINTENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)			
VALOR ANTICIPO	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$115.902.754,50)			
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.			
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES			
PLAZO	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS			
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.			
Disponibilidad Presupuestal	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21A00193	21 DE OCTUBRE DE 2021	21A00585	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
	21C001100		21C00339	
POLIZA DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SÉGUROS MUNDIAL S.A.	
	NUMERO DE POLIZA		B-100021377 B 100004600	
	FECHA DE APROBACION		22 DE NOVIEMBRE DE 2021	

En el Municipio de Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2021, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisor administrativo y técnico de la ESPL respectivamente, y **LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL** en calidad de representante legal de la empresa **M2L CONSTRUCTORES S.A.S.** como CONTRATISTA, y el representante de interventoría, el señor **CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ** de la empresa **INTERJING S.A.** y considerando que se encuentran cumplidos todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación,

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO

Que el día veintidós (22) de noviembre de 2021, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	Nº. DE POLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASEGURADO
		DESCP (DÍAS/MES/AÑO)	PARCA (DÍAS/MES/AÑO)			
CUMPLIMIENTO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES S.A.S	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$77.268.503,00
BUEN RUMBO DEL ANTICIPO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021	M2L CONSTRUCTORES S.A.S	Empresa de Servicios Públicos	30% DEL VALOR DEL CONTRATO \$115.902.754,50

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZADORES LABORALES	8-100021377	22/11/2021	10/12/2024	MZL CONSTRUCTORES S.A.S.	Domiciliarios de Lebrija E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$38.674.251,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	8-100021377	22/11/2021	10/12/2024	MZL CONSTRUCTORES S.A.S.	Domiciliarios de Lebrija E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$38.674.251,50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	8-100004601	22-11-2021	30-12-2021	MZL CONSTRUCTORES S.A.S.	Domiciliarios de Lebrija E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.	200 \$MVA \$1.81.705.200

2. SOPORTES FINANCIEROS


CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
C.O.P.	21A00193 21C00100	21/10/2021	2.3.3.01.02.004.06 2.3.3.01.02.004.03	CONVENIO INVERSIÓN	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$95.896.564,91
R.P.	21A00585 21C00339	22/11/2021	2.3.3.01.02.004.06 2.3.3.01.02.004.03	CONVENIO INVERSIÓN	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$290.553.490,50 \$95.896.564,91 \$290.445.550,16

ACUERDAN


1. Firmar la presente acta de inicio del contrato
2. Fijar como fecha de inicio el veintidós (22) de noviembre de 2021
3. Fijar como fecha de terminación veintinueve (29) de diciembre del año 2021
4. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Lebrija, a los veintidós (22) días de noviembre del año 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
 SUPERVISOR


MZL CONSTRUCTORES S.A.S.
R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
 Representante legal
 CONTRATISTA


INTERING S.A.S.
R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
 Representante legal
 INTERVENTORIA



**ACTA DE DESEMBOLO DEL ANTICIPO
NOVIEMBRE DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE OBRA N° 107-2021
OBJETO:	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRETERAS 23 Y 24 Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLES 11 Y 12 EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARASO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CEROS SETECIENTAVOS (\$386.342.515,00)
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:	30% DEL VALOR DEL CONTRATO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS NOVE (\$115.992.754,50)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRINTA Y OCHO (38) DIAS
CONTRATISTA:	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO FERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedido en Lebrija.
SUPERVISOR:	ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVA
FECHA DE INICIACIÓN:	22-11-2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29-12-2021
CONCEPTO	DESEMBOLO - ENTREGA ANTICIPO

En el Municipio de Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2021, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Lebrija ESPL se reunieron LUIS FERNANDO MANOSALVA ARENAS, Gerente General de la ESPL, LUIS FLOREZ VILLANOVA y DIEGO FERNANDO ARDILA BARRERA, a calidades de Supervisores Administrativo y técnico de la ESPL, respectivamente y LUIS ANTONIO FERNANDEZ BERNAL, identificado con la C.C. No 13.539.772 expedido en Lebrija, actuando como representante legal de M2L CONSTRUCTORES S.A.S., identificado con el NIT 900500467-6, y CESAR AUGUSTO ARENAS FERNANDEZ, identificado con C.C. No 1.095.791.327 Expedido en Bucaramanga, quien funge como representante de la empresa de interventoría INTERING S.A.S del contrato de obra 107-2021, para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula cuarta del contrato en mención, para la autorización de la entrega del anticipo. El valor de dicho anticipo, corresponde a treinta (30%) del valor del contrato No 107-2021.

Elaborado por: **LUIS FLOREZ VILLANOVA**
Supervisor Administrativo



El manejo de anticipo se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

CONCEPTO DEL ANTICIPO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR US\$ (MIL)
		INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA			
SUOS MENCIONADO EN ANTICIPO	0000000000	2021/01/01	2021/12/31	INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DISTRITALES DE LIMA S.A.	200.000.000,00 DOS CIENTOS MILLONES DE DÓLARES

El Contratista se compromete a:

1. Emplear los dineros girados por concepto de anticipo de acuerdo con el Plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría o el supervisor.
2. Tener una cuenta bancaria para el manejo del anticipo.
3. Justificar los giros y movimientos que se realicen en la cuenta bancaria y suministrarle al interventor y al supervisor toda la información que este requiera.
4. Amortizar en los actos de pago para el porcentaje correspondiente al anticipo.
5. Depositar en la cuenta indicada por la ESPL los rendimientos financieros netos generados por concepto de anticipo, en caso de que hubiera.
6. Solicitar a la entidad financiera el certificado de retención en la fuente de los rendimientos financieros del anticipo a nombre de la ESPL, en caso de que hubiera.


Se anexan y hacen parte íntegra de la presente acta los siguientes documentos:

1. Cuenta de Cobro
2. Acta de pago de anticipo.
3. Acta de inicio del contrato de obra
4. Contrato de obra
5. Acta de aprobación de pólizas del contrato
6. Póliza de garantía de cumplimiento
7. Carta trámite anticipo
8. Plan de inversión de anticipo
9. Cedula del representante legal
10. Rut actualizado

Se deja constancia del cumplimiento de los apoyos del sistema de seguridad sobre íntegra y porafiscal por parte del controlador

De igual manera se deja constancia de estado actual del contrato

En fe de lo cual, se firmó en la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de mayo del 2021.




**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMUNICACIONES DE LEONARDO
MUNICIPALES**

CONTROL DE DESEMBOLOSOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3850,455.00
VALOR DEL ANTICIPO	\$115,000.00
SALDO	\$3735,455.00

Que el presente documento hace parte integral de la cuenta respectiva de este expediente contractual.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente carta de conformidad expresa de los que intervinieron en ella, en el municipio de Lebrija a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2021.


LUIS FERNANDO ARCE SALAZAR
GERENTE GENERAL ES EL CONDENADOR DEL GASCO


R.L. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ SERRAL
M21 CONSTRUCTORES S.A.S.
CONTRATISTA


CESAR AUGUSTO ARCE SALAZAR
INTERIORISTA
INTERVENIENTE


DIEGO FERNANDO ARCE GÓMEZ
SUPERVISOR TÉCNICO
EMPRESA E.S.P.


YVONNE FLORE VILLANUEVA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
EMPRESA E.S.P.

0111 656 64 28

0111 656 64 28

ANEXO 4

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

656 64 28



m2constructores@gmail.com





Correos No. 10 - 38



Lebrón, Santander



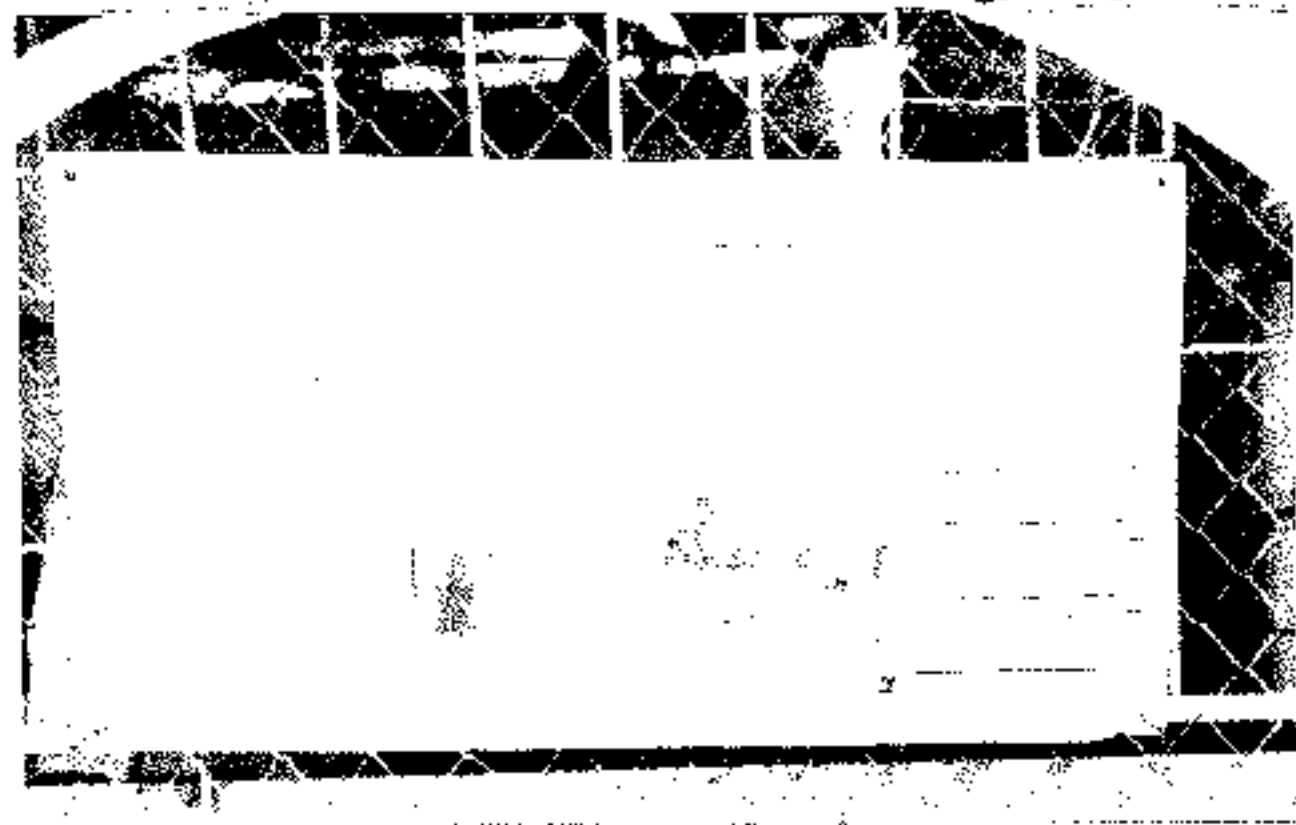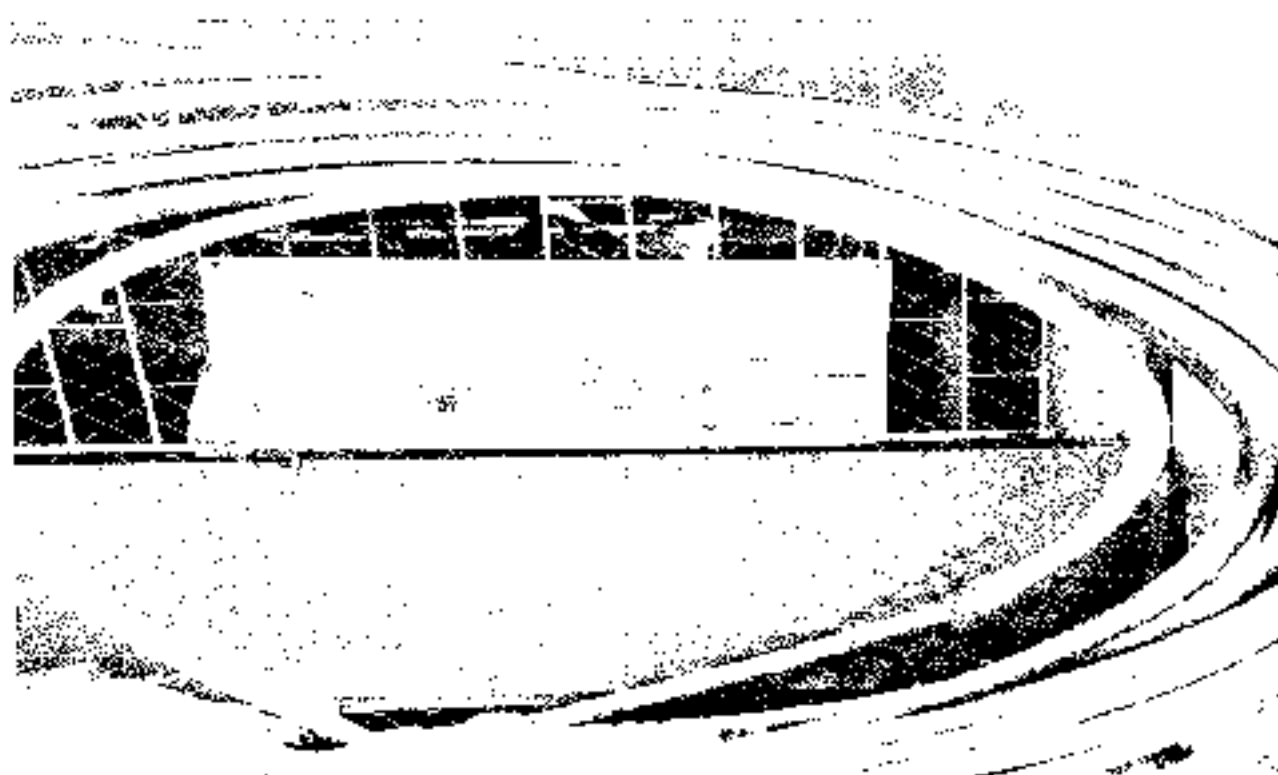

656 84 26

M2constructores@gmail.com

Carrera 8 No. 10 - 38

Letripa, Santander

ANEXO 5

ACTAS DE VECINDAD

456 64 28 
M2lconstructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 38 
Bogotá, Santander 

MZL CONSTRUCTORES SAS

ACTA DE REUNIÓN

10/05/2011

10:00 AM

ASISTENCIA

Dr. Carlos José Díaz
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos Díaz
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos Díaz
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos Díaz
Instituto de la República

Dr. Juan Carlos
Instituto de la República

M2. CONSTRUCTORES SAS

BOGOTÁ - COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

15 de Mayo de 2018

El día 15 de mayo de 2018, se reunió en la oficina de la
M2. CONSTRUCTORES SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá,
Colombia, para tratar los temas que se detallan a continuación.
Participaron en la reunión los señores: Thalysa R. Zuluaga
Jorge Luis Rodríguez y Diego Rodríguez
Cada uno de los señores Thalysa R. Zuluaga

DESARROLLO DE LA REUNION

M2L CONSTRUCTORES SAS

ACTA DE REUNIÓN


11/01/2011


10:00 AM - 11:00 AM

[illegible]

ACTA DE VELOCIDAD		ESTPL
CONTRATO No. 149 DEL 2021 QUINTO: "COPASIRI MILAS RIAPES DE AUTOGUICHY" ALCAZAROLI ADOQUILAN CALLE 13 KINTURULAS CALLEJONES 28 VAYA LA CARRETERA EN THE CALLE. BARRIO: VILLA PAICAYO 12 VIDA KY EL CASCO URBANO: OMBRO VILLA PAICAYO DEL MUNICIPIO DE LAMBIA" CONTIGUENCIA BUENAS VENTURAS SEI: CONSTRUCTORES SAS INTERVENCIONES FECHA: 25 de Mayo del 2021 REALIZADO POR: <i>Yolanda Lopez</i> REALIZADO POR: <i>Yolanda Lopez</i>		
ENCARGADO DEL PROYECTO DE LAS OBRAS: <i>Yolanda Lopez</i>		
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	ANEXOS
IDENTIFICACION DESCRIPCION ANEXOS	DESCRIPCION ANEXOS	ANEXOS
ENCARGADO DEL PROYECTO DE LAS OBRAS: <i>Yolanda Lopez</i>		

	ACTA DE VERIFICACIÓN FECHA: 15.11.2021 ELABORÓ: <i>Andrés López</i> REVISÓ: <i>César Reyes</i> PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACUÍFERO Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALLES DE ENTRE LAS CARRERAS 20 Y LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLE 22 Y LAS UNIDADES DE ACUÍFERO BARRIO VILLA PAULINO DEL MUNICIPIO DE CALDERA CONTRATISTA: MEDA CONSTRUCIONES INTERMEDIAS PROYECTANTE: <i>Andrés López</i>	RESUMEN SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACUÍFERO Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALLES DE ENTRE LAS CARRERAS 20 Y LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLE 22 Y LAS UNIDADES DE ACUÍFERO BARRIO VILLA PAULINO DEL MUNICIPIO DE CALDERA.
VERIFICACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACUÍFERO Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALLES DE ENTRE LAS CARRERAS 20 Y LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLE 22 Y LAS UNIDADES DE ACUÍFERO BARRIO VILLA PAULINO DEL MUNICIPIO DE CALDERA.	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACUÍFERO Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALLES DE ENTRE LAS CARRERAS 20 Y LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLE 22 Y LAS UNIDADES DE ACUÍFERO BARRIO VILLA PAULINO DEL MUNICIPIO DE CALDERA.	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACUÍFERO Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALLES DE ENTRE LAS CARRERAS 20 Y LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLE 22 Y LAS UNIDADES DE ACUÍFERO BARRIO VILLA PAULINO DEL MUNICIPIO DE CALDERA.

	ACTA DE VEREDAD	ESPI.
MUNICIPIO: LLERENA, SAN JUAN		
CONSTRUYO LAS REDES DE ACUEDUCTO Y MACAN LA BOLLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CALLEJAS DE SAN Y LA CARRETA 20 ENTRE CALLE 12 Y 13 EN LA ANCHILLO ARDO: BAÑERÍA Y LA PARADO DE RUMBUQUE DE LERENA		
ESTUDIANTE: INTERVENIENTE:		
FECHA: 20.11.2021		
FECHA: 20.11.2021		
FECHA: 20.11.2021		
FECHA: 20.11.2021		
FECHA: 20.11.2021		
FECHA: 20.11.2021		



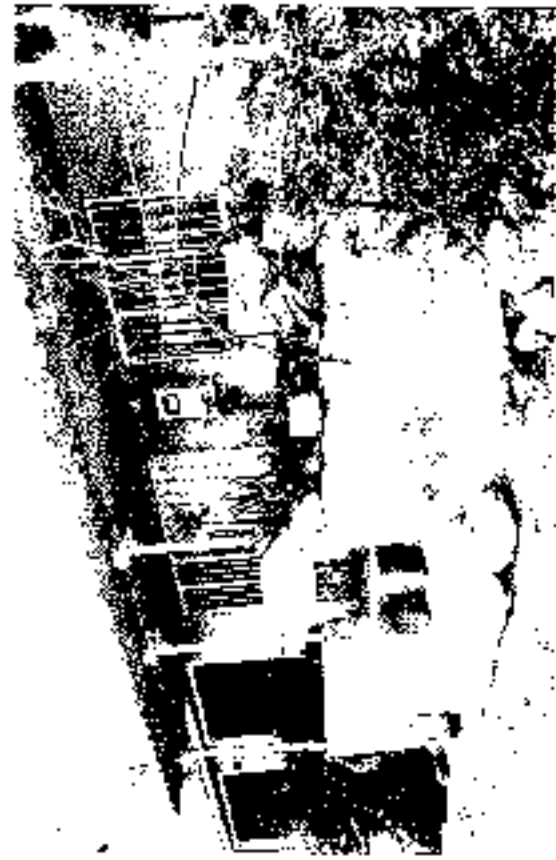


[illegible]

	ACTA DE VERIFICACIÓN CONTRATO No. 197 DEL 2001 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS BARRERAS DE ACUMULACIÓN Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLEJAS DE LA VÍA CARRETERA DE ENTRE CALLES 12 Y 13A EN EL CANTO LABRADO, DISTRITO VILLA PARQUEO DEL MUNICIPIO DE LEBRISA" ELABORADO POR: ING. JUAN CARLOS INGENIERO FECHA: 24 DE JULIO DE 2001 AL: CONSEJO COMISAL INTERCOMUNAL <i>[Firma]</i> ALDO LOPEZ MAYOR ASESOR LEGAL	LEBRISA	VERIFICACIÓN	ACTA DE VERIFICACIÓN
				
VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN

[illegible]

[illegible]

	ACTA DE VERIFICACIÓN MUNICIPIO DE LA FLORIDA SANTIAGO CONTRATO N° 01 DEL 2011 OBJETO: CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 20 Y 21 Y LA CARRERA 10 ENTRE CALLE 10 Y 12 EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA PAUASO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA CONTRATISTA: INTEGRA PROYECTOS VERIFICADOR POR EL M.S.: INGENIERO N.A.S. PRIMA 23.000.000 CLP ELABORÓ: <i>[Firma]</i> INGENIERO CESAR RIVERA	USP Unidad de Seguimiento y Planificación									
	ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="698 126 747 846">FOTOGRAFÍA</th> <th data-bbox="747 126 795 846">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="795 126 917 846">  </td> <td data-bbox="917 126 966 846"> 23/01/2011 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="966 126 1015 846"> ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO </td> <td data-bbox="1015 126 1063 846"> 23/01/2011 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1063 126 1112 846"> ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO </td> <td data-bbox="1112 126 1161 846"> 23/01/2011 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1161 126 1209 846"> ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO </td> <td data-bbox="1209 126 1258 846"> 23/01/2011 </td> </tr> </tbody> </table>	FOTOGRAFÍA	FECHA		23/01/2011	ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011	ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011	ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011
FOTOGRAFÍA	FECHA										
	23/01/2011										
ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011										
ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011										
ENCUENTRO DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23/01/2011										

[illegible]

[illegible]



.....

ANEXO 6

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

PERSONAL CONTRATADO

356 64 28



M2constructores@gmail.com



Carera 8 No. 10 - 38




Lebrija, Santander






656 64 28
M2kconstructores@gmail.com
 Carrera 2 No. 10 - 38
 Lebrija, San Carlos





ANEXO 7

AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PERSONAL



AUTORIZACION

Yo, Juan Esteban Prieto R Identificado con Cedula de Ciudadania No. 13 314 Ete de Bucaramanga, por medio del presente Documento AUTORIZO, a la Señorita **KAREN DAYANA RODRIGUEZ ZABALETA** identificada con CC. 1.099.370.74 de Bucaramanga Jefe de Talento Humano de M2L CONSTRUCTORES SAS, o a quien ella designe, para que FIRME CON MI NOMBRE LEGIBLE, todas la Vinculaciones a la Seguridad Social, entiéndase estas por RIESGOS PROFESIONALES, SALUD, PENSION Y CAJA DE COMPENSACION.

Así mismo certifico que al momento de realizar las afiliaciones a Seguridad Social no hago entrega de ningún Documento para vincular a Mis beneficiarios a salud y caja de compensación.

De igual manera **KAREN DAYANA RODRIGUEZ ZABALETA** se compromete a realizar las Afiliaciones en la EPS, y el Fondo de Pensión donde me encuentro vinculado.

Atentamente,


CC: 13 314 Ete

Medellin, 04 de diciembre de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de M2L CONSTRUCTORES S.A.S que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0006000002 OPERATIVO		Clase \$	Porcentaje Cotización	6.98%
013719670	FORERO RIVERA JUAN ESTEBAN	05/12/2021		16318642	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/12/2021 16:18:55.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.78.15.115, 188.143.58.33, 172.16.42.57

9008239046

9008239046
9008239046

22808231

06 12 2021

FOREHO	RIVERA	JUAN	ESTEBAN
CC	13719870	X	20 06 1979

RECEIVED: CAROLINA DE GUAYAS

\$908 526

DOS CONSTRUCTORES SAS
CRA 8 # 10 38 OF 102

6566428

NT

900500467

BUCARAMANGA SANTANDER

X

X

06 12 2021

Juan Esteban Forexo

Los Antonio Hernandez B.



NIT. 900500467-6
RESOLUCION DIA 40020: 85537-21-22-2012
DIA CRA 8 # 10-38 102
RECIBI: 21-12-2021
Firma: [Firma]

SELECCIONADO PARA SER CONTRATADO POR LA COMPAÑIA FOREHO

21-12-2021

10-12-2021

CARGO: OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES

INTERNET

Compa Forexo



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JUAN ESTEBAN FORERO RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.719.870**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Diciembre del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



En cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el monto que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Grupo



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CASO

Trabajador Dependiente ☒ Pensionado ☒
Trabajador Independiente ☐ Pensionado Jubilado ☐

Inscripción personal o cargo
Si es estado civil, indique sus datos de inscripción (última fecha de inscripción) ☒ U.S. (U.S.)
Si es inscripción de estado, indique última fecha de inscripción



DATOS DEL EMPLEADOR

☒ RUT: 13.539.372
Nombre: **Luis Antonio Hernandez B**
Código: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**

DATOS DEL TRABAJADOR

☒ RUT: 13.539.372
Nombre: **Juan Esteban Torero**
Código: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**

DATOS DE OTROS EMPLEADORES PARA LOS CUALES TRABAJA

Nombre o Razón Social: **Transversal 2 S.A.**
RUT: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A)

Nombre: **Juan Esteban Torero**
Código: **13.539.372**
Sector: **CONSTRUCION S.A.S**
Código: **13.539.372**

PERSONAS A CARGO

ESPACIO EN GRIS PARA USO EXCLUSIVO DE CONFEMATEO SANTANDER

Form for recording family members and dependents, including fields for name, RUT, and relationship.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS POR EXACTOS, VERDADEROS Y CORRESPONDIENTES A LA REALIDAD ACTUAL DEL GRUPO FAMILIAR DEL TRABAJADOR, NO HABiendo sido esta información en la que se declara registrada por el sistema de inscripción de dependientes.

Juan Esteban Torero
Firma del Trabajador

Luis Antonio Hernandez B
Firma y Sello de la Empresa

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE CONFEMATEO SANTANDER

RECIBI RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Form for recording the receipt of documents, including fields for name, RUT, and date.

Este copia reemplaza al correo electrónico, a partir de la fecha de redacción de la inscripción.

La firma en el presente formulario es la única válida para efectos de inscripción de dependientes. Por lo tanto, la inscripción de dependientes en el presente formulario es la única válida para efectos de inscripción de dependientes.



ANEXO 8

EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO DEL PERSONAL

656 6422 
M2constructores@gmail.com 
Carretera 5 No. 17 - 38 
Labrija, San José 



NIT 800.210.191-1

CERTIFICADO MÉDICO

1. Nombre completo del paciente: _____

2. Número de identificación del paciente: _____

3. Fecha de emisión del certificado: _____

4. Lugar de emisión del certificado: _____

5. Nombre del médico: _____

6. Cargo del médico: _____

7. Lugar de trabajo del paciente: _____

8. Descripción del examen: _____

9. Resultados del examen: _____

10. Recomendaciones: _____

11. Observaciones: _____

12. Firma del médico: _____

13. Lugar de trabajo del paciente: _____

14. Fecha de emisión del certificado: _____

15. Lugar de emisión del certificado: _____

16. Nombre del médico: _____

17. Cargo del médico: _____

18. Lugar de trabajo del paciente: _____

19. Descripción del examen: _____

20. Resultados del examen: _____

21. Recomendaciones: _____

22. Observaciones: _____

23. Firma del médico: _____

24. Lugar de trabajo del paciente: _____

25. Fecha de emisión del certificado: _____

26. Lugar de emisión del certificado: _____

27. Nombre del médico: _____

28. Cargo del médico: _____

29. Lugar de trabajo del paciente: _____

30. Descripción del examen: _____

31. Resultados del examen: _____

32. Recomendaciones: _____

33. Observaciones: _____

34. Firma del médico: _____

35. Lugar de trabajo del paciente: _____

36. Fecha de emisión del certificado: _____

37. Lugar de emisión del certificado: _____

38. Nombre del médico: _____

39. Cargo del médico: _____



ANEXO 9

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O SUMINISTROS ADQUIRIDOS

656 64 28 
M2constructores@gmail.com 
Carrera 2 No. 10 - 38 
Lebrija, Santander 

Esquema de certificación :

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 1 según ISO-EC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 1 according ISO-EC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO EN CONSTRUCCIONES

Fabricado por **KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.**, en la
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Beştekar Sosyalite Köyü Sok. No 2 Akınzade Üsküdar, İstanbul Turkey

Manufactured by **KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.**, en la
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Beştekar Sosyalite Köyü Sok. No 2 Akınzade Üsküdar, İstanbul Turkey

El derecho de uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el entendimiento:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 1856 Del 04 de octubre del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento técnico aplicable a barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes

Technical Regulation Applicable to Low Alloy Corrugated Bars for Concrete Reinforcement in Earthquake Resistant Constructions

SECTOR IOS 17067:2015

Este certificado de conformidad de producto está sujeta a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento NES-R-EC-01 Reglamento para la certificación de productos con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC, la cual será el ítem 1 de este ICONTEC.

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and in the NES-R-EC-01 Reglamento para la certificación de productos con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias e intenciones para utilizar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento puesto que es parte integral del presente certificado.

The references and intentions to utilize the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado CSR-CER705724

Certificate


Fecha de Aprobación: 23/9/2015
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Expiración: 23/09/2018
Expiration Date:

La conformidad de conformidad de producto se puede consultar a través del sitio web www.icontec.org



Roberto Enrique Montoya Cárdena
Director Ejecutivo

UTCEP-200835

• Otorgado a : KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARİET A.Ş.

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la resolución 1856 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 172.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00.

Esta constancia presenta una vigencia de tres (3) meses a partir de su fecha de expedición

Sea esta una oportunidad para reiterar nuestra disposición de colaboración y servicio.

Cordialmente


Sergio Penaranda

Profesional de Certificación UT

ICONTEC

[illegible]

Area de servicio al cliente 602-8882 para el costo del parte 243(07)2003
 www.inchem.org



DIRECCIÓN: KILOMETRO 6 VIA CORRALES - BOGAMOSO
TEL: 04-010-420 7307782

KALING, DAVY, AND HARRIS

TEL: 03-41940-481 7307382

[illegible]

Los resultados en este informe se refieren al aprendizaje y conocimientos de los estudiantes en los temas de:

nos encontramos expresados, pero sin embargo aplicando los principios normalizados en la filosofía de la ciencia de la creación.

Este documento circula entre la Norma Técnica Colombiana y el vigente para CEMENTO TIF-O 106.

Jónica González/
 Laboratorio de
 Profesional de la Calidad

Excmo. Sr. Dn. D. Juan Plaza
Revisado y autorizado por
Sr. Dn. D. Calixto

CALIFORNIA



Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

301 DALL'AZIONE DI CACCIA ALLE AZIONI DI CACCIA

Cherchez l'homme
qui a augmenté par
un facteur 1000

John & Douglas
 222
 Atlantic Ave
 Boston and the United

Liberty



DIREZIONE: DIL. CRETINO 4, VIA D'AMICO, 15 - S. GIUSEPPE
 +39 011 511000, 011 57702962

214313: Q3=UORE 2021

Age	Sex	Height (m)	Weight (kg)	Body fat (%)	Max heart rate (b/min)	Max oxygen uptake (l/min)	Max power (W)	Max speed (m/s)	Max distance (m)	Max time (s)	Max heart rate reserve (b/min)	Max oxygen uptake reserve (l/min)	Max power reserve (W)	Max speed reserve (m/s)	Max distance reserve (m)	Max time reserve (s)
16	Male	1.68	65	12	180	3.5	1200	1.5	1000	100	100	100	100	100	100	100
17	Male	1.72	70	13	185	3.8	1300	1.6	1100	110	110	110	110	110	110	110
18	Male	1.75	75	14	190	4.0	1400	1.7	1200	120	120	120	120	120	120	120
19	Male	1.78	80	15	195	4.2	1500	1.8	1300	130	130	130	130	130	130	130
20	Male	1.80	85	16	200	4.5	1600	1.9	1400	140	140	140	140	140	140	140
21	Male	1.82	90	17	205	4.8	1700	2.0	1500	150	150	150	150	150	150	150
22	Male	1.85	95	18	210	5.0	1800	2.1	1600	160	160	160	160	160	160	160
23	Male	1.88	100	19	215	5.2	1900	2.2	1700	170	170	170	170	170	170	170
24	Male	1.90	105	20	220	5.5	2000	2.3	1800	180	180	180	180	180	180	180
25	Male	1.92	110	21	225	5.8	2100	2.4	1900	190	190	190	190	190	190	190
26	Male	1.95	115	22	230	6.0	2200	2.5	2000	200	200	200	200	200	200	200
27	Male	1.98	120	23	235	6.2	2300	2.6	2100	210	210	210	210	210	210	210
28	Male	2.00	125	24	240	6.5	2400	2.7	2200	220	220	220	220	220	220	220
29	Male	2.02	130	25	245	6.8	2500	2.8	2300	230	230	230	230	230	230	230
30	Male	2.05	135	26	250	7.0	2600	2.9	2400	240	240	240	240	240	240	240
31	Male	2.08	140	27	255	7.2	2700	3.0	2500	250	250	250	250	250	250	250
32	Male	2.10	145	28	260	7.5	2800	3.1	2600	260	260	260	260	260	260	260
33	Male	2.12	150	29	265	7.8	2900	3.2	2700	270	270	270	270	270	270	270
34	Male	2.15	155	30	270	8.0	3000	3.3	2800	280	280	280	280	280	280	280
35	Male	2.18	160	31	275	8.2	3100	3.4	2900	290	290	290	290	290	290	290
36	Male	2.20	165	32	280	8.5	3200	3.5	3000	300	300	300	300	300	300	300
37	Male	2.22	170	33	285	8.8	3300	3.6	3100	310	310	310	310	310	310	310
38	Male	2.25	175	34	290	9.0	3400	3.7	3200	320	320	320	320	320	320	320
39	Male	2.28	180	35	295	9.2	3500	3.8	3300	330	330	330	330	330	330	330
40	Male	2.30	185	36	300	9.5	3600	3.9	3400	340	340	340	340	340	340	340
41	Male	2.32	190	37	305	9.8	3700	4.0	3500	350	350	350	350	350	350	350
42	Male	2.35	195	38	310	10.0	3800	4.1	3600	360	360	360	360	360	360	360
43	Male	2.38	200	39	315	10.2	3900	4.2	3700	370	370	370	370</			

Los resultados en este trabajo se refieren al régimen de riego en condiciones de los siguientes factores:

Los resultados corresponden a los siguientes intervalos en la escala *Tecales* (intervalos regados a la fecha de evaluación del cultivo):

El presente trabajo es de *María Yvanka Carrozzini*. La versión para *CEMLA* es de 1996.

Nuova Università
 celebrato per
 l'elezione del Cardinale

Claudio Avelar Díaz
Remedios y delanteculo por
Irene de Caceres

URL : www.ijer.in



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

REPRESENTACIÓN. MILLONEROS Y UN COLOMBIANO EN EL MUNDO

CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH

[illegible]

En consecuencia, el uso de un sistema de información de gestión y de calidad, en que se reflejan los conocimientos de gestión, debe proporcionar los recursos necesarios para la mejora continua y la calidad del producto.

Das ist in New York, wo ich mich gerade auf den Weg mache, um den Tag zu verbringen und mich zu entspannen.

Robert J. Gendron
and Joseph
F. Gusmano

..... **U.S. Military Personnel**

1911-12

PVC GERFOR S.A.

CERTIFICA

Que los productos listados a continuación cumplen con los requisitos de la Especificación Técnica Indicada.

CÓDIGO PRODUCTO	NTC APLICABLE	CUMPLIMIENTO
304926 CUERO ALICANTARILLADO 450 CMC 160 MM ENVETADO	EF0490374	CUMPLE

Nota: Se expide el presente certificado a solicitud del cliente G Y J FERRERERIAS S.A. (BUENAMANGA)
a los 20/05/2017 Con relacion a la factura 917255

Realizó:


ING. JUAN MIGUEL ZARATE
Jefe de Laboratorio

Aprobó:


ING. PREDY JAVIER ACHURY RINCON
Director de Conformidad, Calidad

PVC GERFOR S.A.

CERTIFICA

Que los productos listados a continuación cumplen con los requisitos técnicos de la Norma Técnica Colombiana indicada.

Los sellos de calidad pueden ser consultados en nuestra página web

CODIGO PRODUCTO	NTC APLICABLE	CUMPLIMIENTO
500001 TUBO ALICAT. CORRUGADO RS 8 20/M2-140 MM (6")	NTC3742-2	CUMPLE
500002 TUBO ALICAT. CORRUGADO RS 6 20/M2-120 MM (5")	NTC3742-2	CUMPLE
500003 TUBO ALICAT. CORRUGADO RS 8 20/M2-250 MM (10")	NTC3742-2	CUMPLE
500010 TUBO ALICAT. CORRUGADO RS 8 20/M2-215 MM (8 1/2")	NTC3742-2	CUMPLE
500012 TUBO ALICAT. CORRUGADO RS 8 20/M2-300 MM (12")	NTC3742-2	CUMPLE

Nota: Se expide el presente certificado a solicitud del cliente G Y C FERRETERIAS S.A. (BUCAVANANGA) a los 20/06/2017 con relacion a la factura 914310

Realizó:

Aprobó:

ING. JUAN MIGUEL ZARATE

Jefe de Laboratorio

ING. FREDY JAVIER ACHURY RINCON

Director de Conformidad, Calidad

PVC GERFOR S.A.

CERTIFICA

Que los productos listados a continuación cumplen con los requisitos técnicos de la Norma Técnica Colombiana indicada

Los sellos de calidad pueden ser consultados en nuestra página web

CODIGO PRODUCTO	NTC_APLICABLE	CUMPLIMIENTO
004728 SILLA YEE 200*160 MM D.E. INY ALICANT	NTC3722-2	CUMPLE
004710 SILLA YEE 250*160 MM D.E. INY ALICANT	NTC3722-3	CUMPLE
004631 SILLA YEE 315*160 MM D.E. INY ALICANT	NTC3722-3	CUMPLE
590001 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 EN/M2 160 MM (10")	NTC3722-3	CUMPLE
590115 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 EN/M2 355 MM (14")	NTC3722-3	CUMPLE
590116 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 EN/M2 450 MM (18")	NTC3722-3	CUMPLE

Nota: Se expide el presente certificado a solicitud del cliente E Y J FERRETERIAS S.A. (BOGOTÁ)
a las 20/06/2017 Con relación a la factura 915086

Realizó:

ING. JUAN MIGUEL ZARATE
Jefe de Laboratorio

Aprobó:

ING. FREY JAVIER ACHURY RINCON
Director de Conformidad, Calidad

PVC GERFOR S.A.

CERTIFICA

Que los productos listados a continuación cumplen con los requisitos técnicos de la Norma Técnica Colombiana indicada

Los sellos de Calidad pueden ser consultados en nuestra página web

CODIGO PRODUCTO	NTC_APLICABLE	CUMPLIMIENTO
500002 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 KN/M2 200 MM (10")	NTC 5722-3	CUMPLE
500003 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 KN/M2 250 MM (10")	NTC 5722-3	CUMPLE
500012 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 KN/M2 315 MM (12")	NTC 5722-3	CUMPLE

Nota: Se expide el presente certificado a solicitud del cliente G Y J PERRETERIAS S.A. (BOCARAMANGA)
a los 20/06/2017 Con relacion a la factura 915067

Realizó:

Aprobó:

ING. JUAN MIGUEL ZARATE

Jefe de Laboratorio

ING. FREDY JAVIER ACHURY RINCON

Director de Conformidad, Calidad

PVC GERFOR S.A.

CERTIFICA


Que los productos listados a continuación cumplen con los requisitos técnicos de la Norma Técnica Colombiana indicada.

Los sellos de calidad pueden ser consultados en nuestra página web

CODIGO PRODUCTO	NTC_APLICABLE	CUMPLIMIENTO
590013 TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 EN/MA-400 MM (15')	NTC 6712-2	CUMPLE

Nota: Se expide el presente certificado a solicitud del cliente G Y J FERRETERIAS S.A. (BUCA RAMANGA)
a las 20/06/2017 Con relación a la factura 315815

Realizó:



ING. JUAN MIGUEL ZARATE
Jefe de Laboratorio

Aprobó:



ING. FREDY JAVIER ACHURY RINCON
Director de Conformidad, Calidad

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por algunas de las siguientes células en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (77-13-16-00-30, 77-14-23-00-03)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DUEÑO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 3	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 4	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 5	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 6	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 7	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 8	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 10	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 8/4	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 8/ 5M	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 9/4	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 11 V	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía
KD ó Kaplan	Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones	Barra Recta	No. 12W	Longitud de 6 m hasta 18 m.	Eks Elma Merkezi Seymen Yolu 4 km, Marmara Ereglisi Tekirdag, Turquía



320

Excavadora hidráulica

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y características pueden variar según la región. Consulta a su distribuidor Cat® sobre la disponibilidad en su región.


Índice

CAT[®]

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar en función de la selección del cucharón.

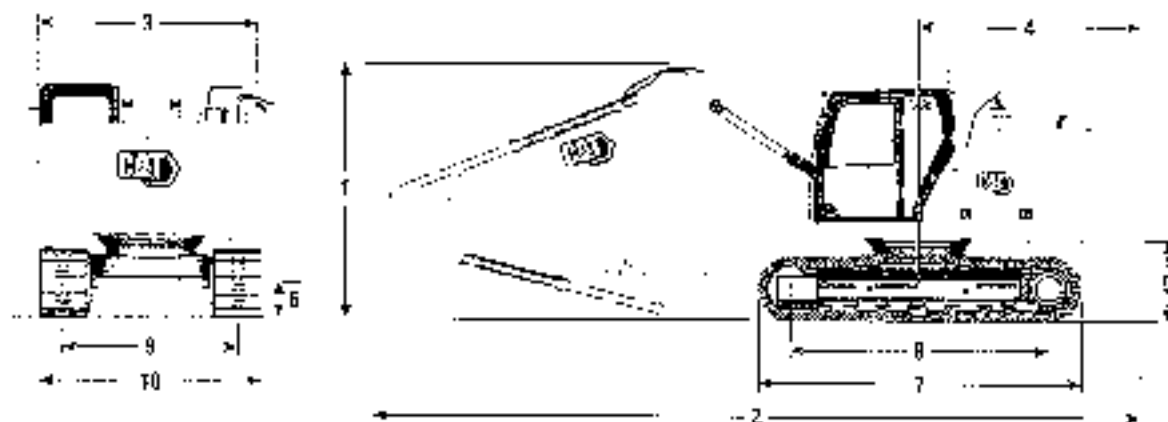

Opciones de pluma	Pluma de alcance HD 5,7 m (18'8")				Pluma SLR 6,05 m (19'7")	
Opciones de brazo	Brazos de alcance HD				Brazos SLR	
	R2.9B1 (9'6")		R2.5B1 (8'2")		R2.5B1 (8'2")	
1. Altura de la máquina:						
Altura de la parte superior de la cabina	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"
Altura a la parte superior de la cabina	3160 mm	10'5"	3160 mm	10'5"	3160 mm	10'5"
Altura del pesquero	2950 mm	9'8"	2950 mm	9'8"	2950 mm	9'8"
Con plumero/cucharon instalados	3160 mm	10'5"	3160 mm	10'5"	3160 mm	10'5"
Con plumero/cucharon instalados	2950 mm	9'8"	2950 mm	9'8"	2950 mm	9'8"
Con pluma instalada	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"
2. Longitud de la máquina:						
Con plumero/cucharon instalados	9530 mm	31'3"	9530 mm	31'3"	9530 mm	31'3"
Con pluma, brazo instalados	9530 mm	31'3"	9530 mm	31'3"	9530 mm	31'3"
Con pluma instalada	8150 mm	26'9"	8150 mm	26'9"	8150 mm	26'9"
3. Ancho del bastidor superior sin pasarelas						
	2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"
4. Radio de balanceo de la ceta						
	2830 mm	9'3"	2830 mm	9'3"	2830 mm	9'3"
5. Espacio libre del contrapeso						
	1050 mm	3'5"	1050 mm	3'5"	1050 mm	3'5"
6. Espacio libre sobre el suelo						
	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"
7. Longitud de la ceta						
	4450 mm	14'7"	4450 mm	14'7"	4450 mm	14'7"
8. Longitud hasta el centro de los rodillos						
	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
9. Entre ejes						
	2380 mm	7'9"	2380 mm	7'9"	2380 mm	7'9"
10. Ancho del tren de rodaje:						
Zapatas de 660 mm (21")	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"
Zapatas de 700 mm (23")	3080 mm	10'1"	3080 mm	10'1"	3080 mm	10'1"
Zapatas de 790 mm (26")	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"
Tipos de cucharón:						
	HD		HD		Cucharon de alcance	
Capacidad del cucharón	1,4 m³	1,53 yd³	1,4 m³	1,53 yd³	1,4 m³	1,53 yd³
Radio de la punta del cucharón	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Motor		
Modelo del motor	Cat C7.1	
Potencia motriz (ISO 9249-2007)	117 kW	157 hp
Potencia del motor (ISO 9249-2007)	118 kW	158 hp
Calibre	112 mm	4 pulg.
Carrera	135 mm	5.3 pulg.
Cilindrada	20.1 L	42+ gal ³
• Cumple con las normas de emisión MAJRH-320, equivalente a Euro 2 del Year 1 de la EPA de los Estados Unidos.		
• Recomendada para operar hasta a 4900 m (16 250 pies) de altitud con reducción de la potencia del motor cuando sea necesario por encima de los 3000 m (9840 pies).		
• La potencia neto se prueba según ISO 9249-2007. Normas vigentes en el momento de la fabricación.		
• Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con válvula de filtro de aire, postatmosférico y alternador con velocidad del motor a 1800 rpm.		
• Velocidad nominal a 1800 rpm.		

Mecanismo de balanceo		
Velocidad de balanceo	11.2+ rpm	
Punto máximo de balanceo	82 kN-m	60 300 lbf-ft

Pesos		
Peso de operación	22 270 kg	49 100 lb
• Pínta de alcance HD (long. HD R2.0 195"), cuchara en HD de 1.4 m ³ (1.83 gal) o zapatas con punta de 300 mm (28"), con peso de 3.7 m (14.1 m).		

Cadena		
Ancho estándar de la cadena de las zapatas	700 mm	28 pulg.
Ancho de las zapatas de cadenas especiales	600 mm	24 pulg.
Ancho de las zapatas de cadena especiales	700 mm	28 pulg.
Cantidad de zapatas en cada lado	29	
Cantidad de rodillos de cadena en cada lado	8	
Cantidad de rodillos superiores en cada lado	2	

Mando		
Presión	4500 psi	
Velocidad máxima de desplazamiento	3.7 km/h	4.5 mph
Presión máxima de la barra de m.a.	36 MPa	45 000 lbf

Sistema hidráulico			
Sistema principal - Flujo máximo - Implemente	420 L/min (71.5 gal/min)	11.4 gal/min (47.2 l/min)	2 bombas
Presión máxima - Equipamiento - Normal	35 000 kPa	5075 psi	
Presión máxima - Equipamiento - Modalidad de los engranajes	35 000 kPa	5075 psi	
Presión máxima - Desplazamiento	34 500 kPa	4974 psi	
Presión máxima - Balanceo	27 500 kPa	3985 psi	
Cilindro de la planta - Calibre	120 mm	5 pulg.	
Cilindro de la planta - Carrera	200 mm	8 pulg.	
Cilindro del brazo - Calibre	140 mm	6 pulg.	
Cilindro del brazo - Carrera	194 mm	8 pulg.	
Cilindro del enchufar - Calibre	120 mm	5 pulg.	
Cilindro del enchufar - Carrera	104 mm	4 pulg.	

Capacidades de servicio de reabastecimiento		
Capacidad del tanque de combustible	345 L	90.6 gal.
Sistema de enfriamiento	25 L	6.6 gal.
Acumulador de motor	15 L	3.9 gal.
Mando de balanceo (incluido)	12 L	3.2 gal.
Mando final (incluido)	3 L	0.8 gal.
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	234 L	61.8 gal.
Tanque hidráulico	112 L	29.4 gal.

Estándares	
Pneum.	ISO 10265-2008
Cabina ROPS (por sus siglas en inglés) para estructura de protección en caso de vuelco	ISO 12117-2:2008
FOG5 (opcional)	ISO 14262-2:1998

Desempeño del sonido	
ISO 6395 2006 (externo)	100 dB(A)
ISO 6395 2006 (interior de la cabina)	70 dB(A)

• Es posible que sea necesario el uso de protección auditiva cuando se opere desde una estación y cuando la cabina retiene no se haya realizado un mantenimiento correcto o las puertas o ventanas se encuentren abiertas, durante períodos prolongados o en entornos ruidosos.

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Pesos de operación y presiones sobre el suelo

	Zapatas de garras doble de 600 mm (24")		Zapatas de garras triple de 600 mm (24")		Zapatas de garras triple de 700 mm (28")		Zapatas de garras triple de 792 mm (31")	
	Presión sobre el suelo		Presión sobre el suelo		Presión sobre el suelo		Presión sobre el suelo	
	Peso kg (lb)	kPa (psi)	Peso kg (lb)	kPa (psi)	Peso kg (lb)	kPa (psi)	Peso kg (lb)	kPa (psi)
Contrapeso de 3,7 tm (4,1 t) + Base de la máquina								
Planta de succión HD + brazo HD (3,7 t) (9.800) + cucharon HD de 1,4 m ³ (1,33 yd ³)	22.560 (49.900)	46,8 (6,8)	21.970 (48.500)	45,6 (6,6)	22.270 (49.000)	46,6 (6,7)	22.570 (49.900)	46,8 (6,8)

Todos los pesos de operación incluyen un tanque de combustible al 90 % con un peso neto de 75 kg (165 lb).


Pesos de los componentes principales

	kg	lb
3 ^{ra} máquina hidráulica + contrapeso de 3,7 tm (4,1 t), basculador de balancés semi-HD, basculador principal estándar con cuchillos de cascota HD y recubrimientos superiores estándar para tren de rodaje largo, con cilindro de altura + sin: 100 mm (4") de combustible y 75 kg (165 lb) del operador	14.400	31.700
Zapatas de rodadura:		
Zapatas de rodadura de garras doble de 600 mm (24") de ancho (1,7 m x 0,51") de espesor	3000	6600
Zapatas de garras triple de 600 mm (24") de ancho (1,0 m x 0,39") de espesor	2800	6200
Zapatas de garras triple de 700 mm (28") de ancho (1,0 m x 0,28") de espesor	3000	6700
Zapatas de garras triple de 792 mm (31") de ancho (1,0 m x 0,39") de espesor para tren de rodaje largo con extensión de escalón de un decimetro con ISO 2507 NH1	3700	8200
Desplazamiento de planta	340	750
Peso del tanque de combustible al 90 % y extensión de 75 kg (165 lb)	710	1560
Contrapesos:		
Contrapeso de 3,7 tm (4,1 t)	3900	8600
Contrapeso de 4,7 tm (5,1 t)	4700	10.400
Basculador de balancés:		
Basculador de balancés estándar	1800	4000
Basculador de balancés semi-HD	1900	4200
Tren de rodaje:		
Basculador principal estándar con cuchillos de cascota HD y recubrimientos superiores estándar para tren de rodaje largo con recubrimientos + sin: 100 mm (4") de combustible y cilindro del brazo:	4500	9900
Alcance de la planta HD (1,7 m) (5'6")	2800	6200
Planta de alcance súper largo (2,85 m) (9'4")	2170	4800
Brazos articulados (tres articulaciones cilíndricas de cucharon, articulación de cojinete):		
Brazo de alcance HD (R1) (R1) (9'6")	1170	2600
Brazo de alcance HD (R2) (R2) (8'2")	1150	2550
Brazo de alcance súper largo (6,28 m) (20'7")	1500	3300
Cucharones (sin varillaje):		
1,2 m ³ (1,57 yd ³) HD	900	2000
1,4 m ³ (1,83 yd ³) HDV	1000	2200
Cucharon para limpieza de acuosos de 0,57 m ³ (0,75 yd ³)	500	1100

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Rangos de trabajo

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar en función de la selección del cucharon.

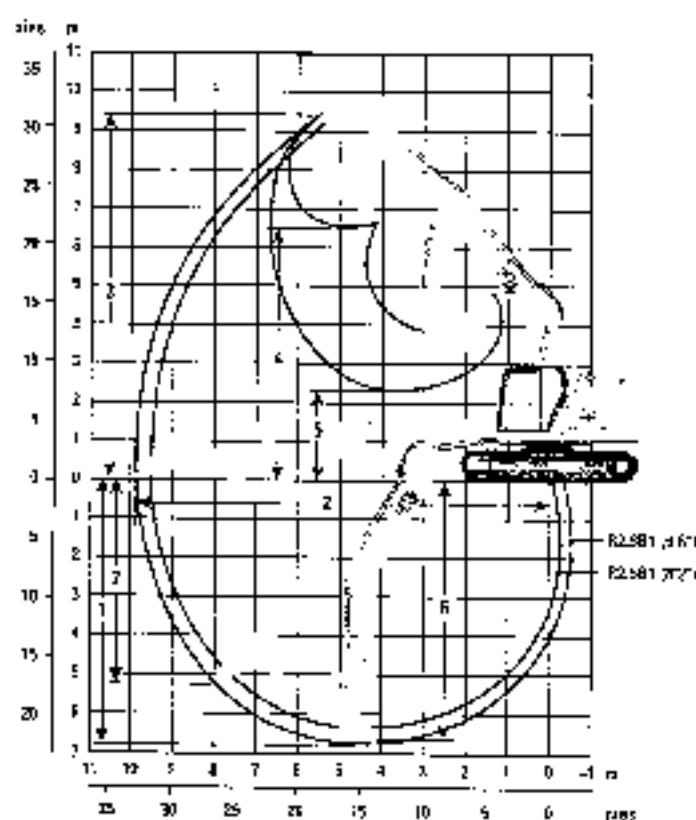


Opción de póster		Pluma de alcance HD 5.7 m (18'9")	
Opciones de brazo		Brazos de alcance HD	
		R25B1 (25'6")	R25B1 (32'2")
1. Profundidad máxima de excavación		6'20 mm	22'1"
2. Alcance máximo a nivel del suelo		9'60 mm	3'4"
3. Altura máxima de corte		9'40 mm	9'50 mm
4. Altura máxima de carga		5'40 mm	5'20 mm
5. Altura mínima de corte		2'70 mm	2'1"
6. Profundidad máxima de corte con fondo plano de 7440 mm (24'4")		5'50 mm	6'40 mm
7. Profundidad máxima de excavación en pared vertical		4'80 mm	4'50 mm
Fuerza de extracción del cucharón (ISO)		150 kN	150 kN
Fuerza de extracción del brazo (ISO)		106 kN	116 kN
Tipo de cucharon		HD	HD
Capacidad del cucharón		1.4 m ³	1.4 m ³
Radio de la punta del cucharón		1350 mm	1350 mm

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Rangos de trabajo

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar en función de la selección del cucharón.

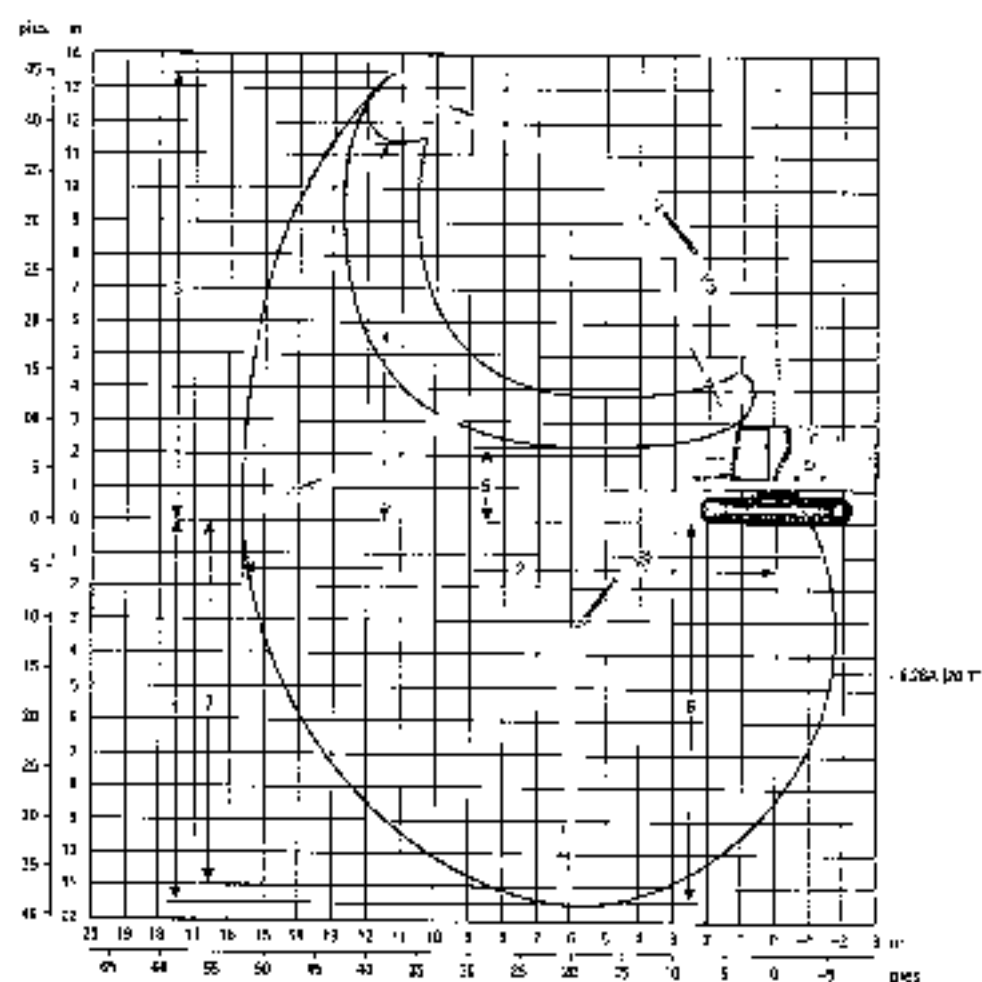

Opción de plano	Plano SLR 8.65 m (28' 9")	
Opción de brazo	Brazo SLR 6.28A (20' 7")	
1 Profundidad máxima de excavación	11.500 mm	38' 4"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	15.700 mm	51' 7"
3 Altura máxima de corte	12.610 mm	41' 8"
4 Altura máxima de carga	11.290 mm	37' 0"
5 Altura mínima de carga	2080 mm	6' 9"
6 Profundidad máxima de corte con línea plana de 1440 mm (13' 0")	11.590 mm	38' 0"
7 Profundidad máxima de excavación en pared vertical	10.560 mm	34' 8"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	61 kN	13.859 lbf
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	99 kN	22.335 lbf
Tipo de accionamiento	Empuje de 4 ejes	
Capacidad del cucharón	0.57 m ³	0.74 yd ³
Rango de la punta del cucharón	157° 30'	36°

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance - contrapeso: 3,7 tm (4,1 t) - sin cucharón - levantamiento pesado: activado

29 mm (1 1/8")		37 mm (1 1/2")		47 mm (1 7/8")		57 mm (2 1/4")		76 mm (3")		102 mm (4")		127 mm (5")		152 mm (6")		178 mm (7")		203 mm (8")		229 mm (9")		254 mm (10")		279 mm (11")		305 mm (12")		330 mm (13")		355 mm (14")		381 mm (15")		406 mm (16")		432 mm (17")		457 mm (18")		483 mm (19")		508 mm (20")		533 mm (21")		559 mm (22")		584 mm (23")		610 mm (24")		635 mm (25")		660 mm (26")		686 mm (27")		711 mm (28")		737 mm (29")		762 mm (30")		787 mm (31")		813 mm (32")		838 mm (33")		863 mm (34")		889 mm (35")		914 mm (36")		939 mm (37")		965 mm (38")		990 mm (39")		1016 mm (40")		1041 mm (41")		1067 mm (42")		1092 mm (43")		1118 mm (44")		1143 mm (45")		1168 mm (46")		1193 mm (47")		1219 mm (48")		1244 mm (49")		1269 mm (50")		1295 mm (51")		1320 mm (52")		1346 mm (53")		1371 mm (54")		1397 mm (55")		1422 mm (56")		1447 mm (57")		1473 mm (58")		1498 mm (59")		1523 mm (60")		1549 mm (61")		1574 mm (62")		1600 mm (63")		1625 mm (64")		1651 mm (65")		1676 mm (66")		1702 mm (67")		1727 mm (68")		1753 mm (69")		1778 mm (70")		1804 mm (71")		1829 mm (72")		1855 mm (73")		1880 mm (74")		1906 mm (75")		1931 mm (76")		1957 mm (77")		1982 mm (78")		2008 mm (79")		2033 mm (80")		2059 mm (81")		2084 mm (82")		2109 mm (83")		2135 mm (84")		2160 mm (85")		2186 mm (86")		2211 mm (87")		2237 mm (88")		2262 mm (89")		2287 mm (90")		2313 mm (91")		2338 mm (92")		2364 mm (93")		2389 mm (94")		2415 mm (95")		2440 mm (96")		2466 mm (97")		2491 mm (98")		2517 mm (99")		2542 mm (100")		2568 mm (101")		2593 mm (102")		2619 mm (103")		2644 mm (104")		2670 mm (105")		2695 mm (106")		2721 mm (107")		2746 mm (108")		2772 mm (109")		2797 mm (110")		2823 mm (111")		2848 mm (112")		2874 mm (113")		2900 mm (114")		2925 mm (115")		2951 mm (116")		2976 mm (117")		3002 mm (118")		3027 mm (119")		3053 mm (120")		3078 mm (121")		3104 mm (122")		3129 mm (123")		3155 mm (124")		3180 mm (125")		3206 mm (126")		3231 mm (127")		3257 mm (128")		3282 mm (129")		3308 mm (130")		3333 mm (131")		3359 mm (132")		3384 mm (133")		3410 mm (134")		3435 mm (135")		3461 mm (136")		3486 mm (137")		3512 mm (138")		3537 mm (139")		3563 mm (140")		3588 mm (141")		3614 mm (142")		3639 mm (143")		3665 mm (144")		3690 mm (145")		3716 mm (146")		3741 mm (147")		3767 mm (148")		3792 mm (149")		3818 mm (150")		3843 mm (151")		3869 mm (152")		3894 mm (153")		3920 mm (154")		3945 mm (155")		3971 mm (156")		3996 mm (157")		4022 mm (158")		4047 mm (159")		4073 mm (160")		4098 mm (161")		4124 mm (162")		4149 mm (163")		4175 mm (164")		4200 mm (165")		4226 mm (166")		4251 mm (167")		4277 mm (168")		4302 mm (169")		4328 mm (170")		4353 mm (171")		4379 mm (172")		4404 mm (173")		4430 mm (174")		4455 mm (175")		4481 mm (176")		4506 mm (177")		4532 mm (178")		4557 mm (179")		4583 mm (180")		4608 mm (181")		4634 mm (182")		4659 mm (183")		4685 mm (184")		4710 mm (185")		4736 mm (186")		4761 mm (187")		4787 mm (188")		4812 mm (189")		4838 mm (190")		4863 mm (191")		4889 mm (192")		4914 mm (193")		4940 mm (194")		4965 mm (195")		4991 mm (196")		5016 mm (197")		5042 mm (198")		5067 mm (199")		5093 mm (200")		5118 mm (201")		5144 mm (202")		5169 mm (203")		5195 mm (204")		5220 mm (205")		5246 mm (206")		5271 mm (207")		5297 mm (208")		5322 mm (209")		5348 mm (210")		5373 mm (211")		5399 mm (212")		5424 mm (213")		5450 mm (214")		5475 mm (215")		5501 mm (216")		5526 mm (217")		5552 mm (218")		5577 mm (219")		5603 mm (220")		562	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	-----	--

Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance - contrapeso: 3,7 tn (4,1 t) - sin cucharón - levantamiento pesado: activado

24 mm (3/4")		32 mm (1 1/4")		40 mm (1 1/2")		50 mm (2")		63 mm (2 1/2")		75 mm (3")		90 mm (3 1/2")		100 mm (4")		125 mm (5")		150 mm (6")		200 mm (8")		250 mm (10")		300 mm (12")		350 mm (14")		400 mm (16")		450 mm (18")		500 mm (20")		550 mm (22")		600 mm (24")		650 mm (26")		700 mm (28")		750 mm (30")		800 mm (32")		850 mm (34")		900 mm (36")		950 mm (38")		1000 mm (40")		1050 mm (42")		1100 mm (44")		1150 mm (46")		1200 mm (48")		1250 mm (50")		1300 mm (52")		1350 mm (54")		1400 mm (56")		1450 mm (58")		1500 mm (60")		1550 mm (62")		1600 mm (64")		1650 mm (66")		1700 mm (68")		1750 mm (70")		1800 mm (72")		1850 mm (74")		1900 mm (76")		1950 mm (78")		2000 mm (80")		2050 mm (82")		2100 mm (84")		2150 mm (86")		2200 mm (88")		2250 mm (90")		2300 mm (92")		2350 mm (94")		2400 mm (96")		2450 mm (98")		2500 mm (100")		2550 mm (102")		2600 mm (104")		2650 mm (106")		2700 mm (108")		2750 mm (110")		2800 mm (112")		2850 mm (114")		2900 mm (116")		2950 mm (118")		3000 mm (120")		3050 mm (122")		3100 mm (124")		3150 mm (126")		3200 mm (128")		3250 mm (130")		3300 mm (132")		3350 mm (134")		3400 mm (136")		3450 mm (138")		3500 mm (140")		3550 mm (142")		3600 mm (144")		3650 mm (146")		3700 mm (148")		3750 mm (150")		3800 mm (152")		3850 mm (154")		3900 mm (156")		3950 mm (158")		4000 mm (160")		4050 mm (162")		4100 mm (164")		4150 mm (166")		4200 mm (168")		4250 mm (170")		4300 mm (172")		4350 mm (174")		4400 mm (176")		4450 mm (178")		4500 mm (180")		4550 mm (182")		4600 mm (184")		4650 mm (186")		4700 mm (188")		4750 mm (190")		4800 mm (192")		4850 mm (194")		4900 mm (196")		4950 mm (198")		5000 mm (200")		5050 mm (202")		5100 mm (204")		5150 mm (206")		5200 mm (208")		5250 mm (210")		5300 mm (212")		5350 mm (214")		5400 mm (216")		5450 mm (218")		5500 mm (220")		5550 mm (222")		5600 mm (224")		5650 mm (226")		5700 mm (228")		5750 mm (230")		5800 mm (232")		5850 mm (234")		5900 mm (236")		5950 mm (23
--------------	--	----------------	--	----------------	--	------------	--	----------------	--	------------	--	----------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	-------------

[illegible]

La capacidad de almacenamiento de energía de un sistema de almacenamiento de energía es:

Udvalgt af: Styrelsen for Sundhedsoplysning og Turistoplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Capacidades de levantamiento de la pluma SLR - contrapeso: 4,7 tm (5,2 t) - sin cucharón - levantamiento pesado: desactivado

[illegible]

La capacidad de la computadora se agota por el uso de un tiempo de 2.5 segundos. Los resultados de salida se muestran

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on September 11, 2012

* 2007-01-27 14:00 44,400

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Capacidades de levantamiento de la pluma SLR - contrapeso: 4,7 tm (5,2 t) - sin cucharón -
levantamiento pesado: desactivado (continuación)

6.35 mm (247)		6.35 mm (247)		Zaplatka de gumă (mă 630) (mm-247)		1070 mm (421)				
6.35 mm (247)		10.30 mm (407)		12.800 mm (503)		12.500 mm (500)				
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg							1.200	1.100	11.77
12.800 mm 503	lb							2.650	2.420	600
12.800 mm 503	kg									


[illegible]

La información de este artículo es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. No se debe tomar ninguna decisión de inversión basándose únicamente en esta información. Se recomienda consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

© 2005 by Springer & Elsevier B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Capacidades de levantamiento de la pluma SLR - contrapeso: 4,7 tm (5,2 tl) - sin cucharón - levantamiento pesador: desactivado

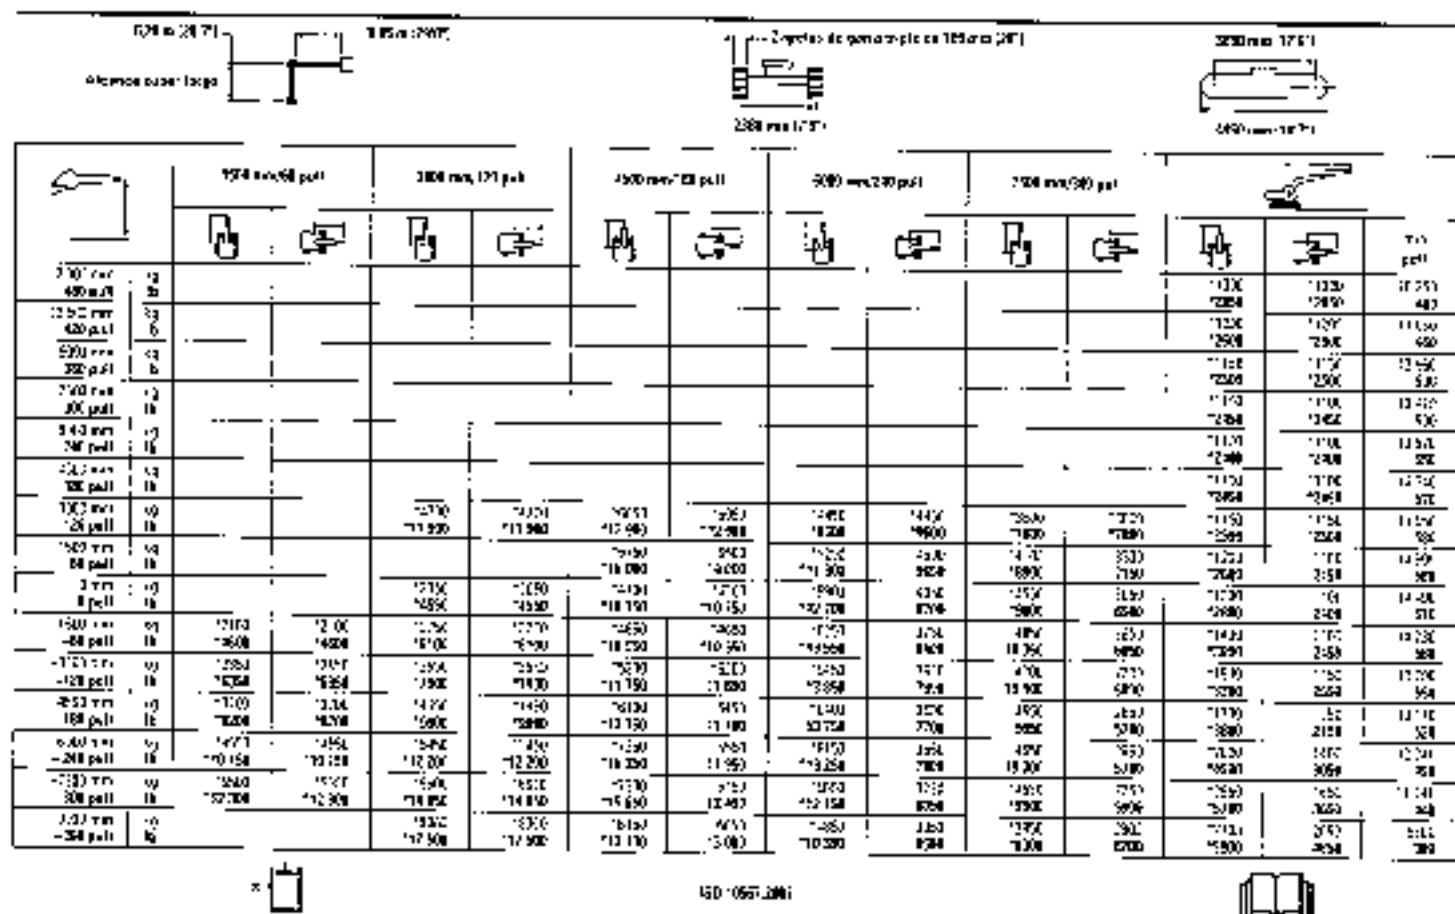

El presente artículo tiene como finalidad analizar la evolución de la legislación de la Unión Europea en materia de derechos de los consumidores, así como el impacto de la legislación de la Unión Europea en la legislación de España. El presente artículo se divide en tres partes. En primer lugar, se analiza la evolución de la legislación de la Unión Europea en materia de derechos de los consumidores. En segundo lugar, se analiza el impacto de la legislación de la Unión Europea en la legislación de España. En tercer lugar, se analiza el impacto de la legislación de la Unión Europea en la legislación de España.

U. Sociedad de Economía Privada (Chile), Leveza (de 0-5) por el tipo de carga que se maneja

Číslo účtu a číslo účtu je uveden v tabulce níže.

123714 *Panthera pardus* *panthera*

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Compatibilidad y especificaciones del cucharón

	Varillaje	Tipo de trabajo largo									
		Min's									
		Ancho		Capacidad		Peso		Llenado	Cucharon 3,7m (12,1ft)		Contrapeso 4,7 mt (5,2 t)
									Forma de alcance HD		Pluma 5,3
		mm	in.	m³	yd³	kg	lb	%	H2540 (3'2")	H2540 (12'6")	6'25A (20'7")
Pasar de voladura con cucharón regular											
Suavizado profundo (HFO)	B	1150	42	1,00	1,3	310	1957	100	●	⊗	
	B	1200	48	1,19	1,6	320	2045	100	⊗	⊗	
Pala para uso pesado (HDS)	B	1250	54	1,40	1,8	1075	2505	100	⊗	⊗	
Suavizado suave (SD)	E	1200	48	1,19	1,6	600	1339	90	⊗	⊗	
Pala de sereno extremo (ESD)	B	1270	48	1,30	1,67	1310	2779	90	⊗	⊗	
	B	1250	54	1,50	2,0	1210	2674	90			
Suavizado suave (SD)	115	900	35	0,53	0,69	400	883	100			◇
Unidad de trabajo (SD) para su uso en ingeniería	115	1270	48	0,57	0,74	400	883	100			◇
Capacidad de carga máxima de trabajo largo (HFO) en el cucharón								49	1300	2735	340
								h	650	6300	1900
Cucharon con sujetapasar de Goe											
Suavizado suave (SD)	B	1050	42	1,00	1,31	200	1967	100	⊗	⊗	
	B	1200	48	1,19	1,56	920	2045	100	⊗	⊗	
Pala para uso pesado (HDS)	F	1250	54	1,40	1,78	1025	2200	100	⊗	◇	
Suavizado suave (SD)	E	1200	48	1,19	1,56	1100	2389	90	⊗	⊗	
Pala de sereno extremo (ESD)	E	1200	48	1,20	1,47	1310	2779	90	⊗	⊗	
	E	1250	54	1,50	2,04	1310	2874	90			
Carga máxima con cucharón largo (HFO) en el cucharón								54	1300	2735	
								h	5500	5100	

Las capacidades aquí mostradas cumplen con la norma de excavación Serie JIS G3704-93000 - A33017, en su versión HFO, la cual indica la capacidad máxima de movimiento de 70% de la capacidad de carga libre de trabajo con el cucharón plegado. El rendimiento extendido a nivel del suelo con el cucharón plegado. Capacidad conforme a la norma ISO 7451:2007. Para el cucharón por partes de uso normal.

Densidad máxima del material:

- 2100 kg/m³ (1300 lb/yd³)
- ⊗ 1800 kg/m³ (1100 lb/yd³)
- ⊗ 1500 kg/m³ (900 lb/yd³)
- ⊗ 1200 kg/m³ (700 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (500 lb/yd³)

Consulte la recomendación de los fabricantes de los trabajos aprobados para conocer el máximo nivel de seguridad en el uso de las máquinas. El uso de las máquinas con los cucharones que están fuera de las recomendaciones de capacidad de los fabricantes de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, tipos, presiones, etc., puede causar un rendimiento por debajo del diseñado, problemas de estabilidad, problemas de producción, estabilidad, rendimiento y durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de una máquina puede resultar en daños en los componentes de la máquina, reduciendo el rendimiento de la máquina y aumentando el costo de la máquina y el tiempo.

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Guía de oferta de accesorios

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor. Lea sobre las configuraciones disponibles en su región.

▼ Computadoras	▼ solo precio de fábrica "bruto"	Sin Computador	● 1800 kg m/15000 leydi	○ 1700 kg m/12000 leydi
----------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS CON ACOPLE DE PASADOR

Tron de codaje		L	
Contapeso		3,7 m (12' 11")	
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance HD
Longitud del brazo		2,5 m (8' 2")	2,2 m (7' 3")
Mandíbulas articuladas	H115 S	✓	✓
	H112 GGC	✓	✓
	H112 GGC Generalista lateral	✓	✓
	H115 GGC S	✓	✓
	H1150 S	✓	✓
	H1150 GGC	✓	✓
	H1150 GGC S	✓	✓
	H1150 S	✓	✓
Mandíbulas dentadas	Mandíbula dentada de emergencia MP318	✓	✓
	Mandíbula para demolición MP318	✓	✓
	Mandíbula pinchadora MP318	✓	✓
	Mandíbula de corte MCO318	✓	✓
	Mandíbula Universal MP318	✓	✓
Puntas de demolición y selección	G418	✓	✓
Cuchillas cortas para chispa y demolición	S405	✓	✓
	S405 Superficie plana	✓	✓
Puntualizadores	P215	✓	✓
Garfios Grapple Tool	GS1420-200	●	●
	GS1420-400	●	●
	GS1420-750	●	●
	GS1425-750	○	○
	GS1425-950		
	GS1520-900	●	●
	GS1520-600	●	●
	GS1520-750	○	○
	GS1525-750		

1.6.1990, 07.07.1990, 1.8.1990

Especificaciones de la Excavadora hidráulica 320

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat sobre las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible	☒ Solo en que Cat se encuentre	☐ No compatible
--	--	--

ACCESORIOS CON ACOPLADOR CON SUJETAPASADOR CAT

Tren de rodaje		L	
Contrapeso		3,7 tm (4,1 t)	
Tipo de pluma		Alcance m	
Longitud del brazo		2,5 m HB (8'2")	2,9 m HB (9'5")
Mandos hidráulicos	H113 S	✓	✓
	H120 GCU	✓	✓
	H120 GCU de montaje lateral	✓	✓
	H120 GCU S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
	H130 GCU		
	H130 GCU S	✓	
	H130 S	✓	✓
	Mandíbula controlada de normal: MP113 S	✓	✓
	Mandíbula para demolición: MP113 S	✓	
Multiprocesadores	Mandíbula pulverizadora: MP113		
	Mandíbula de agalla: MP113	✓	✓
	Mandíbula Universal: MP113 S	✓	
	Pinzas de demolición y selección		
	Cuchillas móviles para chatarra y demolición		
Pulverizadores	53623 Supersele pluma		
	P2 S	✓	✓

ACCESORIOS INSTALADOS EN PLUMA

Tren de rodaje		L	
Contrapeso		3,7 tm (4,1 t)	
Tipo de pluma		Alcance m	Alcance tS
Cuchillas móviles para chatarra y demolición	52020	✓	
	52021	✓	✓

Equipo estándar y opcional de la 320

Equipo estándar y opcional

El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor. Delix desea obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
MOTOR			FREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Tres modalidades de potencia selectas motor		-	Zapatas de cadena de triple garra de 390 mm (15 3/4")		
Control automático de velocidad del motor		-	Zapatas de garra doble de 800 mm (31 1/2")		
Avance de automatización del motor al no estar en uso		-	Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")		
Capacidad para cable hasta los 450 m (14 760 pies) de altura con una potencia estándar de motor arriba de los 3000 m (9840 pies)			Zapatas de cadena de garra triple de 390 mm (15 3/4")		
Capacidad de encendido en una temperatura de -20 °C (-15 °F)			Puntos tramos deslizantes en el bastidor principal		
Capacidad de encendido a -18 °C (-1 °F)			Protectores de guía de vía segmentados		
Alimentación de cable elemento con protección integrada			Protectores de guía de pista de longitud completa		
Ventiladores de refrigeración eléctricos con función de retroceso automático			Protectores inferiores		
Capacidad de almacenamiento B20			Protectores inferiores HD		
SISTEMA HIDRÁULICO			Protección de lubricación		
Control de regeneración de la pluma y del brazo			Protectores de desplazamiento para el motor		
Alimentación de control principal electrónica			Protectores para el motor de desplazamiento HD		
Pre-energización automática			Cilindros de cadena hidráulicos con grasa		
Desplazamiento independiente de las velocidades			Contrapeso de 3300 kg (727 lb)		
Velocidad de avance de continuación de la pluma y del brazo			Contrapeso de 4700 kg (1035 lb) para pluma de alcance super largo		
Filtro hidráulico principal de tipo elemento			Bastidor de balanceo estándar		
Palancas transversales con control deslizante			Bastidor de giro sobre HD para S/R		
Bomba principal electrónica tipo Cuderm			Bastidor principal estándar con rodillos de cadena HD y rodillos superiores estándar		
Cumple de filtro de retención del caudal			PLUMA, BRAZOS Y VARILLAJE		
Control de herramientas tipo Doplus			Pluma de alcance HD 5,1 m (16'8 1/2")		
Fijación a la posición de trabajo			Brazo de alcance HD 2,4 m (7'9 1/4")		
Cumple de acoplador rápido para el acoplamiento Cat y W estándar			Pluma de alcance HD 5,7 m (18'7 1/4")		
			Brazo de alcance HD 2,5 m (8'2 1/4")		
			Pluma de alcance super largo 5,5 m (18'0 1/2")		
			Brazo de alcance super largo de 5,25 m (17'4 1/2")		
			Varillaje de cadena en familia B1 con la X como elevación		
			Varillaje de elevación familia A con curvatura de elevación S/R		

Consulte con la página siguiente.

Equipo estándar y opcional de la 320

Equipo estándar y opcional (continuación)

El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor Cat si desea obtener más información.

	Estandar	Opcional		Estandar	Opcional
SISTEMA ELÉCTRICO			SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Baterías de 1600 CCA que no requieren mantenimiento D-24			Diferenciales para mantener programado de aceite (ISO-SAE)		
Interruptor para control remoto de desconexión general			Preparada para mantenimiento QuickDrain™		
Luces LED programables para tiempos de arranque			Filtros de aceite del motor y de combustible agrupados en el mismo lugar		
Luces LED en el chasis, luces de marcha atrás e indicadores en la pluma de alcance y SUR, luces en la cabina y 8500 lumenes			Segunda parada de emergencia de aceite del motor a nivel del suelo		
Luces LED en el chasis, luces de marcha atrás e indicadores en la pluma de alcance y SUR, luces en la cabina con cubierta y protector contra la lluvia y 8500 lumenes para una visibilidad de 300 ft			Protector del radiador		
Paquete de iluminación ambiental premium			PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
TECNOLOGÍA CAT			Cámara de visión trasera y espejo retrovisor al lado derecho		
Cat Product Link™			Cámara de visión lateral derecha		
Requisito mínimo de herramientas de trabajo			Visibilidad = 360°		
Seguimiento de herramientas de trabajo*			Placa de bloqueo para todos los controles		
Receptor laser			Plancha antideshuque y pernos sellados en la plataforma de trabajo		
Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento			Botón secundario de apague del motor a nivel del suelo en la cabina		
Cat Grade con Avances 12D			Disminución y aumento al lado derecho (cumple con ISO 2861-1011)		
Cat Assist:			Alarma de desplazamiento		
- Grade Assist					
- Boom Assist					
- Bucket Assist					
- Swing Assist					
- Lift Assist					
Cat Payload:					
- Pesaje continuo					
- Cálculo de capacidad máxima					
- Información de capacidad de cargadero					
- Capacidad de informes de L-88					
3D E sense:					
- Excavate					
- Fill-on					
- Fill-on by					
- Fill-on 1					
- Fill-on on Load					
Detección automática del huecillo					
Capacidad de servicios de trabajo					
Aumento automático de la capacidad					

*Compatible con el nivel superior de accesorios Cat FI 161

Kit y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte con su distribuidor. Consulte si desea obtener más información.

ABENA

- Lamparas abejas radiales inferiores para 7.030 con led azul
- Panel eléctrico derecho e izquierdo para controlar las bombas
- Protector para la lluvia con cubierta para la cabina
- Cinturón de seguridad portátil de 55 mm x 5 m
- Kit para los ganchos de poliarétilo para el confort cabi

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

- Lámpara de mano con Biocut-off

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Portapiñeta engrasadora

SISTEMA ELÉCTRICO

- Cableado para el motor con cables de arranque

PROTECTORES

- Pinchos para la lluvia en el techo
- Sistema de protección contra caída de objetos no compatible con cubierta de neopreno y protección contra lluvia
- Barilla protectora delantera completa compatible con cubierta de lona de cabina y protección contra lluvia
- Barilla protectora, mitad inferior delantera
- Protector completa contra vandalismo

Opciones de cabina de la 320

Opciones de cabina

	Comfort	Deluxe
Roll-Over, supresión de ruido exterior	●	●
Monitor LCD con pantalla táctil de alta resolución de 20,3 mm (8")	●	●
Monitor LCD con pantalla táctil de alta resolución de 27,1 mm (10,7")	○	○
Monitor LCD con pantalla táctil de alta resolución de 27,4 mm (10,8") con control digital táctil para los controles Grade con Accumbal HD y Comfort de 3D	○	○
Aire acondicionado automático de dos niveles	●	●
Disco selector y reglas de acceso directo para controlar el volumen	●	●
Control del motor con botón de encendido en llave	●	●
Cajón de cerradura de aluminio con llaves con herramientas	●	x
Cajón de cerradura con cerradura de aluminio con herramientas	x	●
Suspensión de asiento con ajuste mecánico	●	x
Asiento con respaldo reclinable y suspensión con ajuste neumático	x	●
Unidad de seguridad de 50 mm (2")	●	●
Conola izquierda fija	●	x
Conola izquierda inclinable		●
Radio con Bluetooth integrado	●	x
Radio con Bluetooth integrado y puertos USB	x	●
Toma de corriente de 12V DC	●	●
Almacenamiento de documentos	●	●
Red de almacenamiento en cabina trasera y red de almacenamiento de herramientas	x	●
Portavoz y parabrisas	●	●
Verano: frontal de dos piezas con posibilidad de apertura	●	●
Lujo: parabrisas superior radial con lazo	●	●
Tragapapeles con posibilidad de apertura	●	x
Tragapapeles de policarbonato con posibilidad de apertura	x	●
Luzes LED en el techo y en la parte interior inferior	●	●
Cortina delantera de protección solar	●	●
Cortina trasera de protección solar	○	○
Alfombra lavable	●	●
Esto para baliza	●	●

● Estándar

○ Opcional

x No disponible



320

Forestal

La configuración forestal Cat 320 proporciona un desempeño superior y eficiencia operativa. Consumo de combustible hasta un 20 por ciento menor con respecto a 320D FM en intervalos de mantenimiento más largos reducen significativamente los costos de operación. El tren de rodaje de servicio severo cuenta con un fondo de rodillos, rodillos de soporte con doble apoyo y zapatas de cadena de goma doble de 500 mm. La cabina tipo Comfort de ROPS está equipada con una ventana delantera de policarbonato de 19 mm y ventanas laterales de policarbonato de 13 mm.

Consulte a su distribuidor para disponibilidad regional.

Desempeño Eficiente

Ofrece hasta un 20 por ciento menos de combustible que la excavadora Cat 320D FM.

Monitoree los costos de información a bordo para rastrear los costos de operación, incluyendo consumo de combustible y el mantenimiento diario.

El motor G17 puede funcionar con cualquier tipo de B20 o compatible con los estándares de emisiones Brasil, M4R-II y China Nonroad Stage II. Equivalente a FE 1.3 Tier 4 de la EPA de los Estados Unidos y Stage IIIA de la Unión Europea.

La configuración excavadora y el trabajo en irregularidades de terreno, debe de la modalidad Smart Control automáticamente el motor y la potencia hidráulica de su producción.

Las aplicaciones de trabajo de la versatilidad de usar una amplia variedad de accesorios.

No deje que el clima le impida trabajar. La excavadora tiene una capacidad estándar de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en la categoría 13 °C (55 °F).

Oste de Operación

Espera hasta un 20 por ciento menos de costo de mantenimiento que la 320D FM. (Alumno calculado en 12,000 horas de funcionamiento de la máquina).

Reducción de mantenimiento a una nivel del suelo.

Señale el nivel de aceite del motor automáticamente y en forma segura con la nueva varilla de medición y nivel del suelo. Reuse y llene el aceite del motor en la parte superior de la máquina para una secuencia rápida de inspección de aceite.

Los filtros de combustible están sincronizados para que se cambien a las 1000 horas de uso. El ciclo del intervalo de los filtros enteros.

El nuevo filtro de admisión de aire con anillo tiene el poder de capturar los restos de aceite que el filtro de aceite de aceite de aceite de aceite.

El filtro de aceite hidráulico proporciona un paquete de filtrado superior, filtros hidráulicos para mantener limpio el aceite cuando se reemplaza el filtro y una vida útil más larga con un intervalo de reemplazo de 3000 horas o 150 por ciento más que los sistemas de filtros anteriores.

Los ventiladores de refrigeración de alta eficiencia son longevos cuando es necesario, usted puede configurar intervalos para que la función se reverse a trabajo automáticamente a fin de mantener limpios los núcleos e interrupciones en su trabajo.

Los sensores de flujo están a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de los extractores de fluidos para su análisis.

La solución remota de problemas lo conecta con un profesional de servicio del distribuidor para eludir a resolver un problema y poder a trabajar rápidamente.

El flash remoto le permite de acuerdo con el programación de manera de que el par que el software de su máquina este actualizado y tenga un rendimiento óptimo.

Cat Product Link proporciona ubicación, horas de la máquina, uso de combustible, productividad, tiempo de inactividad, códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a través de la red por línea inalámbrica, lo que le ayuda a monitorear el equipo en el lugar de trabajo mientras reduce los costos de operación.

Comodidad y simplicidad

- Trabaje eficientemente en la cabina Comfort con control de clima automático.
- Encienda el motor pulsando un botón o use el botón BlueSwitch con control remoto, una aplicación de su teléfono o el código de identificación de operador.
- Programa su modalidad de potencia y preferencias de la palanca universal usando la identificación del operador, la excavadora lo recordará cada vez que vuelva a trabajar.
- Navegue rápidamente en el monitor de pantalla táctil estándar de alta resolución de 20.3 mm (8 pulg.) con el monitor de pantalla táctil opcional de 25.4 mm (10 pulg.) con la ayuda del joystick de control.
- El diseño de un amplio espacio entre las consolas y el pavimento más cómodo.
- Las extensiones de acceso ajustables reducen la vibración de la cabina hasta un 50% más que los modelos de excavadores anteriores.
- Limpiando el equipo, la cabina cuenta con amplios espacios de almacenamiento exterior y bajo el asiento, en la parte superior y en las consolas.
- Las los puertos USB estándar de la radio y la tecnología Bluetooth para conectar sus dispositivos personales y realizar llamadas en el modo manos libres.
- ¿No está seguro de qué hace una función o de cómo realizar el mantenimiento de la excavadora? Tenga siempre el manual del operador al alcance de la mano en el monitor táctil.

Seguridad

- Asegure a 100 por ciento de los puntos de mantenimiento durante desde el nivel del suelo, sin necesidad de salir de la excavadora.
- El alumno estándar con FOPS cumple con la norma ISO 13177-2:2006.
- Las ventanillas laterales de 19 mm y laterales de 13 mm están hechas de plástico de alta resistencia.
- El diseño de una gran visibilidad del vestigio, en cada dirección de giro, y detección de obstáculos con la ayuda de pilas de estacionamiento por radar, estacionamientos grandes y un diseño plano en la parte del motor.
- La palanca de bloqueo de control de estacionamiento a todas las luces de emergencia y de desplazamiento en la posición más baja.
- Cuando se intermite el interruptor de trabajo a nivel del suelo, durante el suministro de combustible al motor y a la máquina.
- La cámara de visión trasera es estándar y la cámara de visión lateral de noche es opcional. Con la cámara trasera de 300° y 180° fácilmente colocada y personal al alrededor de la excavadora en una sola vista.
- El diseño de plataforma de servicio al lado derecho proporciona un acceso fácil, seguro y rápido a la plataforma de servicio superior. Las escaleras de la plataforma de servicio utilizan una plancha antideslizante para aumentar la tracción.
- Los asientos de respaldo cumplen con los requisitos de la norma ISO 2307:2011.

320 Especificaciones Forestales

Motor		
Motora del motor	C64 C75 L	
Potencia bruta (ISO 14396:2007)	111 kW	150 hp
Potencia del motor (ISO 14396:2007)	118 kW	158 hp
Calibre	65 mm	2 1/2 pul
Carrera	135 mm	5 1/4 pul
Cilindro de	725 L	425 gal. US
• Cumple con las normas de emisión MARB-E 130, equivalente a 130% las del Tier 3 de la EPA de los Estados Unidos		
• Recomendada para su uso hasta a 45,0 m (1476' gal) de altura con conexión de la potencia del motor cuando se alcanza la potencia máxima de los 1000 m (3281' gal)		
• La potencia bruta se prueba según ISO 9249:2007. Normas vigentes en el momento de la fabricación.		
• Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con catalizador, filtro de aire, protección contra el sobrecalentamiento y alternador con velocidad del motor a 1800 rpm		
• Velocidad nominal a 1800 rpm		
Mecanismo de balanceo		
Velocidad de balanceo	11.25°/seg	
Peso máximo de balanceo	82 kN/m	60 200 lbs
Pesos		
Peso de operación	70 545 kg	155 000 lb
• Pluma de alcance HD, brazo 510 R12-056 y zapatas de punta rígida de 600 mm (24") y contrapeso de 3,7 m (14.1')		
Cadena		
Ancho de las zapatas de cadena	660 mm	24 pul
Cantidad de zapatas por cada lado	49	
Cantidad de eslabones de cadena por cada lado	8	
Cantidad de eslabones superiores por cada lado	2	
Mando		
Pendiente	15/170 m	
Velocidad máxima de desplazamiento	5.7 km/h	3.5 mph
Fuerza máxima de la barra de tiro	265 kN	45 000 lb

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina. El operador debe estar atento a las condiciones de la zona de trabajo y a las condiciones de la máquina.

Sistema hidráulico		
Sistema principal - Fuga máxima - Implemento	429 L/min 1215 x 7.6 m³/min	113 gal/min 157 x 2.3 m³/min
Presión máxima - Equipamiento - Normal	35 000 kPa	5075 psi
Presión máxima - Equipo - Modalidad de levantamiento	38 000 kPa	5510 psi
Presión máxima - Desplazamiento	34 300 kPa	4974 psi
Presión máxima - Balanceo	27 500 kPa	3998 psi
Cilindro de la pluma - Calibre	120 mm	4 3/4 pul
Cilindro de la pluma - Carrera	1 790 mm	70 pul
Cilindro del brazo - Calibre	140 mm	5 1/2 pul
Cilindro del brazo - Carrera	1 590 mm	62 pul

Capacidades de servicio de reabastecimiento		
Capacidad de tanque de combustible	545 L	144 gal
Sistema de almacenamiento	75 L	20 gal
Agua del motor	25 L	6.6 gal
Mando de la carga - cada uno	12 L	3.2 gal
Mando final - cada uno	5 L	1.3 gal
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	254 L	67.5 gal
Tanque hidráulico	115 L	30.4 gal

Estándares	
Frenos	ISO 10265:2008
Cabina ROPS (con sus pilas de cables para la protección en caso de vuelco)	ISO 12117-1:2008
ROPS opcional	ISO 10262-1:1998

Desempeño del sonido	
ISO 6395:2008 (testes en)	60 dB(A)
ISO 6395:2008 (interior de la cabina)	70 dB(A)

Es posible que sea necesario el uso de protección auditiva cuando se opera desde una estación y cabina abierta (cuando no se haya realizado un mantenimiento correcto). Los puentes de control se encuentran abiertos durante períodos prolongados en entornos ruidosos.


Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Máquina Base con contrapeso de 3,7 ton (8.110). Bastidor base, ante serría HD, bastidor base de servicio abierto con cuchillos de corte SD y cuchillos prev. alforas de corte superior con tren de rodaje largo en cubiertas de la planta + neotraje 91% de combustible y 75 kg (165 lb) operario	14.400	31.700
Zapatas de rodaje		
Zapatas de cadena de goma doble de 600 mm (24") de ancho, 15 mm (0.59") de grosor	3000	6600
Desplazados de planta	340	750
Peso del tanque de combustible (40 al 90%) + operador de 75 kg (165 lb)	310	690
Contrapesos		
Contrapeso de 3,7 ton (8.110)	3700	8200
Bastidor de balanceo		
Bastidor de balanceo estándar	1300	2870
Tren de rodaje		
Bastidor principal con rodillos de cadena HD y rodillos superiores para tren de rodaje largo	4650	10.200
Plumas incluidas (línea, presiones y cilindro del brazo)		
Alcance de la planta (67.33" o 1.715")	2000	4400
Brazos articulados línea, pasador, etc.		
Brazo de alcance HD (R2.980, 296")	1100	2430

320 Especificaciones Forestales

Dimensiones


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar en función de la selección del cucharón.

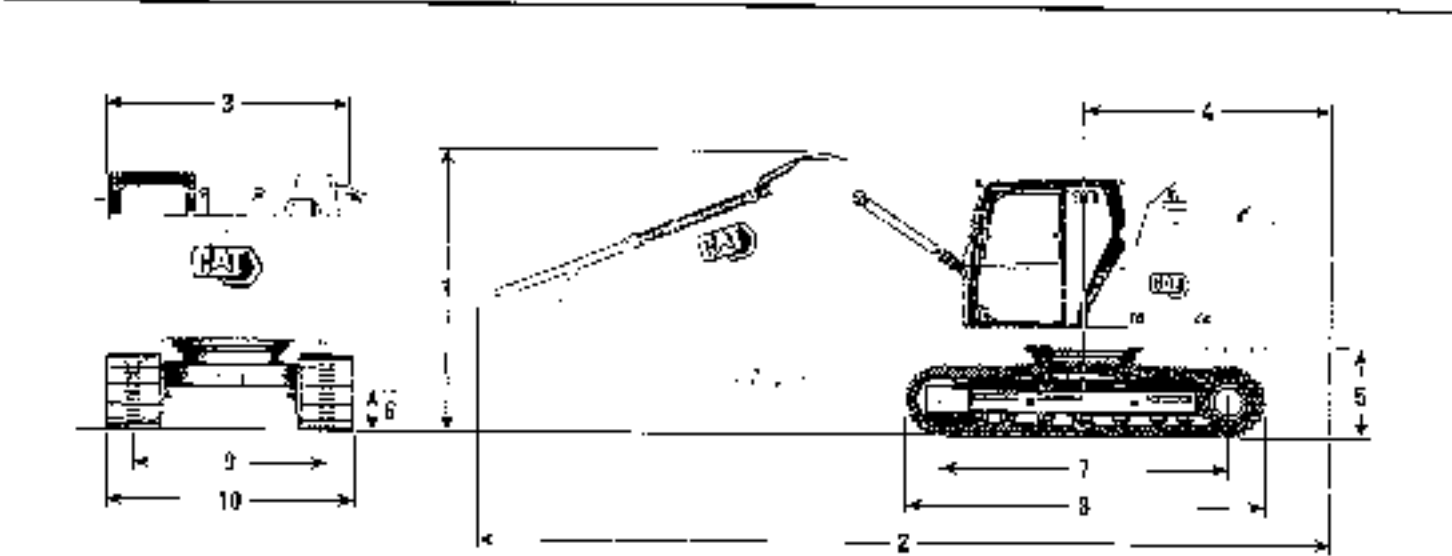

Opciones de pluma		Pluma de alcance SIB 5,7 m (18'8")	
Opciones de brazo		Brazo de alcance HD R3.2DB R2.991 (3'6")	
1	Altura de la parte superior de la cabina	2940 mm	9'8"
2	Longitud de la máquina	9500 mm	31'2"
3	Ancho del basculón superior sin pañuelos	2780 mm	9'1"
4	Radio de la parte de la cota	7800 mm	25'6"
5	Longitud libre del contrapeso	14500 mm	47'9"
6	Radio libre sobre el suelo	170 mm	6.7"
7	Longitud hasta el centro de los rodillos	4650 mm	15'3"
8	Longitud de la cadena	3250 mm	10'8"
9	Entrevía	2380 mm	7'8"
10	Ancho de Zapatas de Cadena (600 mm (2'0"))	2080 mm	6'8"

Rangos de Trabajo - Generalidades Forestales (Procesador)

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la configuración del procesador.

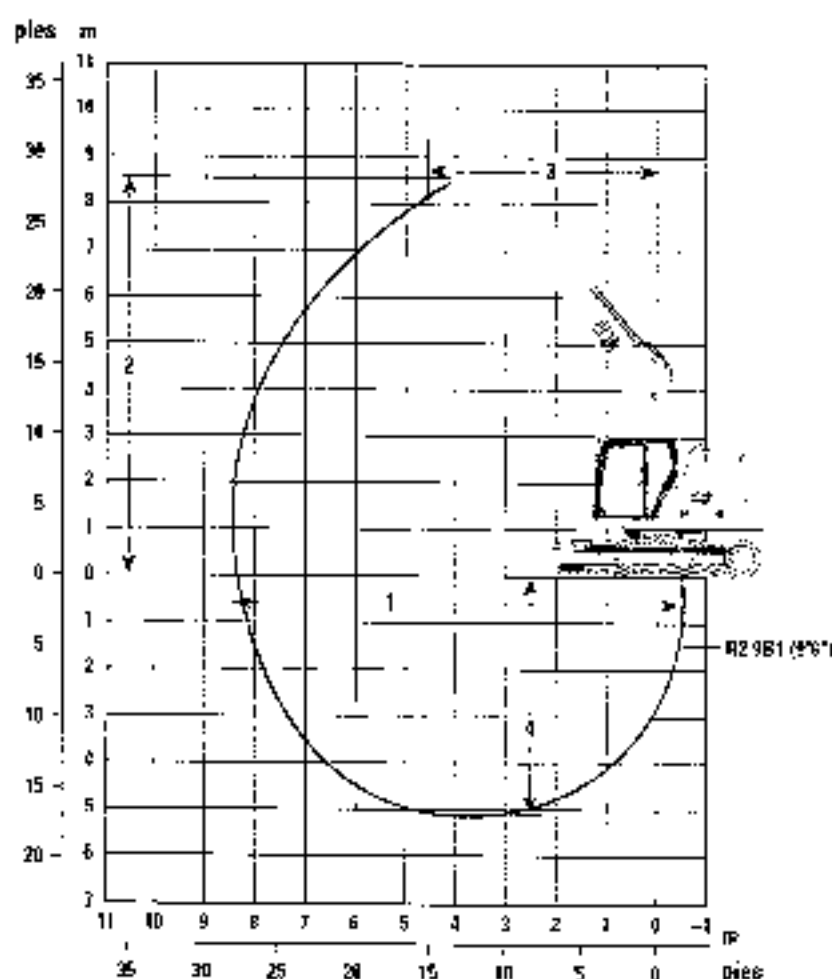

Rangos de trabajo	Generalidades Forestales (Procesador)	
1. Alcance máximo de línea a nivel del suelo en la nariz del brazo	8.45 m	27.7'
2. Altura máxima en la nariz del brazo	8.40 m	27.6'
3. Altura de altura máxima en la nariz del brazo	3.0 m	9.8'
4. Amplitud máxima de escavación en la nariz del brazo	3.19 m	10.5'
Elevación a nivel del suelo en la nariz del brazo a 120 pies sobre el terreno	3000 kg	6600 lb
Elevación a nivel del suelo en la nariz del brazo a 120 pies sobre el terreno	4250 kg	9370 lb
Elevación máxima en la nariz del brazo a máxima altura sobre el terreno	1100 kg	2430 lb
Elevación máxima en la nariz del brazo a máxima altura sobre el terreno	2750 kg	6050 lb

320 Especificaciones Forestales

Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance - contrapeso: 3,7 tm (4,1 t) - sin cucharón - levantamiento pesado: activado

2,5 m (8'2")		3,2 m (10'4")		Apurte de gaze de la masina (2")		320 mm (10'3")	
				200 (mm) 8"		450 mm (14'6")	
		1,5 m (5'0")		1,5 m (5'0")		1,5 m (5'0")	
1,5 m (5'0")		1,5 m (5'0")		1,5 m (5'0")		1,5 m (5'0")	
2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")	
3,2 m (10'4")		3,2 m (10'4")		3,2 m (10'4")		3,2 m (10'4")	
4,0 m (13'1")		4,0 m (13'1")		4,0 m (13'1")		4,0 m (13'1")	
5,0 m (16'4")		5,0 m (16'4")		5,0 m (16'4")		5,0 m (16'4")	
6,0 m (19'8")		6,0 m (19'8")		6,0 m (19'8")		6,0 m (19'8")	
7,0 m (23'0")		7,0 m (23'0")		7,0 m (23'0")		7,0 m (23'0")	
8,0 m (26'3")		8,0 m (26'3")		8,0 m (26'3")		8,0 m (26'3")	
9,0 m (29'7")		9,0 m (29'7")		9,0 m (29'7")		9,0 m (29'7")	
10,0 m (32'8")		10,0 m (32'8")		10,0 m (32'8")		10,0 m (32'8")	
11,0 m (36'1")		11,0 m (36'1")		11,0 m (36'1")		11,0 m (36'1")	
12,0 m (39'4")		12,0 m (39'4")		12,0 m (39'4")		12,0 m (39'4")	
13,0 m (42'8")		13,0 m (42'8")		13,0 m (42'8")		13,0 m (42'8")	
14,0 m (46'1")		14,0 m (46'1")		14,0 m (46'1")		14,0 m (46'1")	
15,0 m (49'4")		15,0 m (49'4")		15,0 m (49'4")		15,0 m (49'4")	
16,0 m (52'8")		16,0 m (52'8")		16,0 m (52'8")		16,0 m (52'8")	
17,0 m (56'1")		17,0 m (56'1")		17,0 m (56'1")		17,0 m (56'1")	
18,0 m (59'4")		18,0 m (59'4")		18,0 m (59'4")		18,0 m (59'4")	
19,0 m (62'8")		19,0 m (62'8")		19,0 m (62'8")		19,0 m (62'8")	
20,0 m (66'1")		20,0 m (66'1")		20,0 m (66'1")		20,0 m (66'1")	
21,0 m (69'4")		21,0 m (69'4")		21,0 m (69'4")		21,0 m (69'4")	
22,0 m (72'8")		22,0 m (72'8")		22,0 m (72'8")		22,0 m (72'8")	
23,0 m (76'1")		23,0 m (76'1")		23,0 m (76'1")		23,0 m (76'1")	
24,0 m (79'4")		24,0 m (79'4")		24,0 m (79'4")		24,0 m (79'4")	
25,0 m (82'8")		25,0 m (82'8")		25,0 m (82'8")		25,0	

* "El seguro de vida que el asegurado debe pagar al momento de la contratación de la póliza, en función de la edad del asegurado, debe ser un porcentaje del valor de la prima anual de la póliza. Este porcentaje debe ser del 10% para los asegurados de 18 años de edad, del 15% para los asegurados de 19 a 24 años de edad, del 20% para los asegurados de 25 a 34 años de edad, del 25% para los asegurados de 35 a 44 años de edad, del 30% para los asegurados de 45 a 54 años de edad, del 35% para los asegurados de 55 a 64 años de edad, del 40% para los asegurados de 65 a 74 años de edad, del 45% para los asegurados de 75 a 84 años de edad, y del 50% para los asegurados de 85 años de edad o más." (Ley 17.987, artículo 17, inciso 1, párrafo 1º).

1. <http://www.ck12.org/Book-Search>

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

320 Equipo Forestal Estándar y Optativo

Equipo estándar y opcional (continuación)

El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor Cat si desea obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
SISTEMA ELÉCTRICO			SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Baterías de 100% CCA para la operación mantenimiento (1+4)	✓		Lubros de aceite y combustible del equipo agrupados en un mismo lugar	✓	
Interruptor controlador de la suspensión general	✓		Orificio para muestra programado de aceite (S-O SMT)	✓	
Luz de funcionamiento LED con temporizador	✓		Segunda vuelta de medición de aceite del motor a nivel del suelo	✓	
Luz de clase LED (1800 lúmenes), luz de pilona de izquierda y derecha de 840 lúmenes, luz de estufa de izquierda y derecha de 850 lúmenes	✓		Preparada para mantenimiento QuickEye™		✓
Paquete de demostración envolvente premium		✓	Protector del radiador		✓
TECNOLOGÍA CAT			PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
Cat Product Link	✓		Cámara de visión trasera y espejo retrovisor al lado derecho	✓	
			Cámara de visión lateral derecha		✓
			Velocidad en 50%		✓
			Placa lateral de bloqueo para todos los controles	✓	
			Plancha anticaídas, anteojo y perno de arranque en la plataforma de servicio	✓	
			Botón secundario de apagado del motor a nivel o nivel del suelo en la cabina	✓	
			Manera de desplazamiento	✓	



Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria,
visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2025 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los manuales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas en las fotografías pueden
incluirlas equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, ProductLink, S•O•S, QuickEye, "Caterpillar Corporate
Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Tech", así como la identidad corporativa y del producto utilizadas
en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin permiso.

VisioLink® es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

ASX02221-04 (11-2025)
Reemplaza ASX02221-03
Número de configuración: 073
(Sudamérica/Brasil)




320 Equipo Forestal Estándar y Optativo

Equipo estándar y opcional

El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor. Si desea obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
CABINA			SISTEMA HIDRÁULICO		
ROPS, supresión de ruido estándar	✓		Pacote hidráulico de control de herramientas	✓	
Ventana lateral de policarbonato de 19 mm (3/4")	✓		75 psi (5,2 bar) para los botones "fuera de alta presión de trabajo" y "stop"		
Ventanas laterales y traseras de policarbonato de 19 mm (3/4")	✓		Circuitos de regulación de la pluma y del brazo	✓	
Monitor LCD con pantalla táctil de alta resolución de 705 mm (28")	✓		Válvula de control proporcional electrónica	✓	
Monitor LCD con pantalla táctil de alta resolución de 254 mm (10")		✓	Pre calentamiento automático	✓	
Aire acondicionado automático de dos niveles	✓		Desplazamiento automático de las velocidades	✓	
Direct select y aspas de acceso directo para controlar el monitor	✓		Válvula de regulación de corriente de la pluma y del brazo	✓	
Control del motor con botón de emergencia con llave	✓		Filtro hidráulico protaps de tres elementos	✓	
Cabina con ajuste de altura, tres niveles, con calentamiento	✓		Palancas universales con control deslizante	✓	
Asiento con suspensión	✓		Bomba principal electrónica de tandem	✓	
Asiento ajustable	✓		TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Cinturón de seguridad de 51 mm (2")	✓		Tren de rodaje forestal de servicio pesado con fondo de chasis y redillos portahierros de doble soporte	✓	
Cinturón de seguridad fijo	✓		Zapatas de rodaje de cobre para HD de 600 mm (24")	✓	
Rodillos con Dura-Grip integrados	✓		Asbestos de rodaje lubricados sin grasa	✓	
Tensionadores de 12 V (120)	✓		Puntos de lubricación en el bastidor principal	✓	
Ahorro automático de documentos	✓		Consigna de 7700 kg (14,1 t)	✓	
Perforación y punzonado	✓		PROTECTORES		
Limpiaaparos superior paralelo con cámara	✓		Protectores de goma de caucho segmentados	✓	
Tragaluz de acero con posibilidad de apertura	✓		Protecciones de goma de caucho de longitud completa		✓
Luzes LED en techo y parte inferior	✓		Protectores laterales	✓	
Cortina delantero de protección solo	✓		Protectores laterales HD		✓
Cortina trasera de protección solo		✓	Protector de escape	✓	
Alojamiento lavable	✓		Protectores de desplazamiento para el motor	✓	
Espejo para brazo	✓		Protectores para el motor de desplazamiento HD		✓
MOTOR			FOCUS (protección contra caída de objetos)		✓
Tres modalidades de potencia seleccionables	✓		PLUMAS Y BRAZOS		
Control automático de velocidad del motor	✓		Pluma de alcance HD de 2,7 m (8'8")	✓	
Ajuste automático del motor al motor en uso	✓		Brazo de alcance HD de 2,9 m (9'6")	✓	
Capacidad para uso hasta 1500 cm (14'6") de altura con una potencia reducida de motor debido a la reducción de altura	✓		<i>Consulte con la página siguiente.</i>		
Capacidad de enfriamiento en alta temperatura de 52 °C (125 °F)	✓				
Capacidad de enfriamiento en temperaturas bajas de -18 °C (0 °F)	✓				
Filtro de aire de doble elemento con pre-filtro integrado	✓				
Ventiladores de refrigeración eléctricos con función de arranque automático	✓				
Capacidad de trabajo hasta 800	✓				

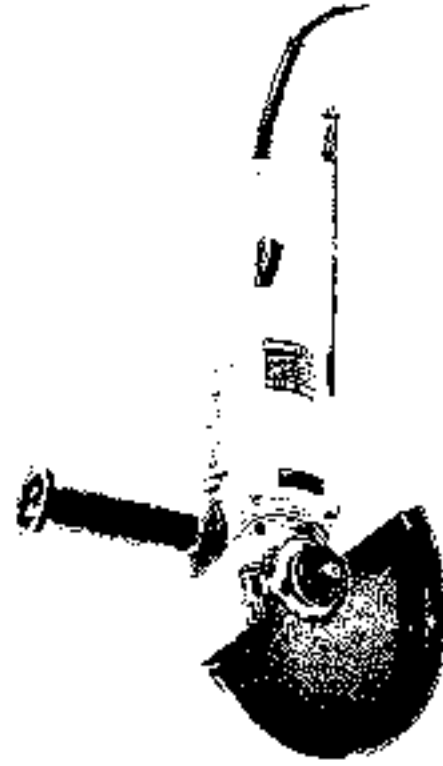

Potente Motor de 2700W - Entrega mayor velocidad y potencia hasta en aplicaciones más duras

Guarda sin llave - Permite cambios y movimientos en forma más fácil

Caja de engranajes de bajo perfil - Permite al usuario trabajar en lugares estrechos

Cable ultra resistente - Previene roturas del cable por tirones

Gatillo de seguridad de dos pasos - Disminuye el riesgo de encendido accidental

Mango anti-vibración de tres posiciones - Provee al usuario diferentes opciones hora de trabajar reduciendo la vibración

Indicador LED de sobre carga - Advierte al usuario una sobre carga de herramienta

Tapa removible - Facilita el acceso a los carbones

Potencia
2700W

Velocidad
6,500 RPM

Carbones con Auto desconexión

Si

Cable Ultra Resistente

Si

Embrague Electrónico

Si

Mango Trasero Anti-vibración

Si

Guarda sin Llave

Si

Carbones con Auto desconexión

Si

Peso (Kg)

5.6



TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 2021-10-20 2021-10-21 2022-10-20

NÚMERO POLIZA	PLACA DE	CLASE VEHICULO	CONCEPTO	CLASIFICACION	MONEDA
14362500003700	KKY122	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	2606	2011
PASAJEROS	MARCA	MAZDA	CATEGORIA		
5	TIPO VEHICULO	BT 50	DOBLE CABINA		
NÚMERO	NÚMERO DE POLIZA	NÚMERO	CAPACIDAD		
GE358317	9FJUN84G760316168	9FJUN84G7B0316188	1.00		
APORTADOR VEHICULO DEL TRANSPORTISTA	FECHA DE EMISION	IMPORTE	NÚMERO DE DOCUMENTO DEL	FECHA DE EMISION	
V2LCONSTRUCTORES	3153939807	NIT	9035004676	LERRIJA	
CODIGO DE ASIGNACION	CODIGO DE VEHICULO	CLASE DE VEHICULO	NÚMERO DE VEHICULO	CIUDAD DE ORIGEN	
AT1320	\$6	184139	0	BUCARAMANGA	
TASA	FORMA DE PAGO	CONTRIBUCION	TASA FIJA	IMPORTE DE PAGO	
232	\$ 622800	\$ 211300	\$ 1800	800	
TOTAL A PAGAR				180	\$
\$ 936700				750	\$
				10	\$

FECHA AUTORIZACION

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos casos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad) iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la última póliza ya en vigencia y notificando al CLIENTE.

Señalar los datos de la póliza de seguro de transporte de mercancías:

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.

El seguro de transporte de mercancías es un seguro que cubre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías transportadas por carretera, marítima o aérea, desde el momento en que salen del lugar de origen hasta el momento en que llegan al lugar de destino, o en cualquier otro momento durante el transporte.



CONSTRUYENDO EL FUTURO

ANEXO 10

BITACORAS DE OBRA

526 64 78 
M2constructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 38 
Leónida, Santander 

1. The first thing I noticed when I stepped
 out of the plane was the fresh air. It felt like
 a warm blanket after a long journey. The
 sun was shining brightly, and the birds were
 singing. I felt a sense of freedom and
 adventure. The landscape was beautiful, with
 rolling hills and a clear blue sky. I took a
 deep breath and felt the wind on my face. It
 was a wonderful feeling. I had come to a new
 place, and I was excited to explore it. The
 people were friendly, and the food was delicious.

2. The second thing I noticed was the
 friendly people. They were all smiling and
 welcoming. I felt like I had found a new
 family. The food was delicious, and the
 atmosphere was warm. I was in luck.

3. The third thing I noticed was the
 beautiful landscape. It was a sight to
 behold.

4. The fourth thing I noticed was the
 delicious food. It was a feast for the
 senses.

5. The fifth thing I noticed was the
 warm atmosphere. It was a place where
 everyone was happy.

6. The sixth thing I noticed was the
 friendly people. They were all smiling and
 welcoming.

7. The seventh thing I noticed was the
 beautiful landscape. It was a sight to
 behold.

Fig. No. 35 NOV 2021

Observaciones: 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

Pres. 14.00 12.00

[illegible][illegible][illegible]

It is also possible that the observed increase in the number of genes with more than one fold change

$$f_{\text{max}} = 0.4 \text{ Hz}$$

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \approx -1.58$ bits per symbol.

Help! I don't understand

Journal of Management Education 30(6)

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

2000 年 10 月 1 日起, 凡在 2000 年 10 月 1 日前

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle$$
$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.65, \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 0.42, \quad \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 0.25, \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 0.05, \quad \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) = 0.05.$$
$$(S_0)_{\mathcal{S}_1} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100\}$$
[illegible][illegible][illegible]

Revised MS. accepted by the PE Institute (2012) 17th March

1.000 - 1.000 - 1.000

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + V(\phi) \right]$$

Figure 1. Comparison of the two models

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

$\sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} = -\sum_{i=1}^n p_i \log p_i = H(p)$

© 1995 by Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom. This is a hardback volume, priced at £45.00 net (US \$75.00 in the USA, Canada and Mexico).

DOI: 10.1002/for

A. f. longipes: C. J. van Daele.

5. conclusion la promesa hecha que yo del 10 de Feb. al ...

dato il tempo necessario a ridurre a zero il campo di la estrazione;

$d_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)^{-1}$ is the effective diffusion coefficient, d_1 and d_2 are the diffusion coefficients of the two components.

2. The following information is for the year ended 31/12/2014, SE. 2014/2015 (14/15)

1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

Case 3:59-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 07/25/19 Page 1 of 1

Received 15 July 2004

Abstract — The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in the city of Ljubljana, Slovenia. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The experimental group participated in a 12-week training program that included aerobic, strength, and flexibility exercises. The physical fitness of the children was measured at the beginning and end of the program using a series of tests. The results showed that the experimental group had significantly higher levels of physical fitness than the control group at the end of the program. The findings suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

$$f_{\alpha} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

1. Содержание статьи

1.1. Введение (цели, задачи, актуальность темы, обзор литературы)

1.2. Материалы и методы

1.3. Результаты и обсуждение (описание результатов, анализ данных)

1.4. Заключение (выводы, перспективы исследования)

1.5. Список литературы (перечень источников, использованных в работе)

1.6. Приложение (дополнительные материалы, таблицы, графики)

1.7. Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы)

1.8. Аннотация (краткое содержание статьи, ключевые слова)

1.9. Ключевые слова

1.10. Выводы

1.11. Список литературы

1.12. Приложение

1.13. Сведения об авторах

1.14. Аннотация

1.15. Ключевые слова (ключевые слова, характеризующие тему статьи)

1.16. Выводы (выводы, сделанные на основе полученных результатов)

1.17. Список литературы

1.18. Приложение (дополнительные материалы, таблицы, графики)

1.19. Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы)

1.20. Аннотация (краткое содержание статьи, ключевые слова)

1.21. Ключевые слова (ключевые слова, характеризующие тему статьи)

1.22. Выводы (выводы, сделанные на основе полученных результатов)

1.23. Список литературы

1.24. Приложение

1.25. Сведения об авторах

1.26. Аннотация

1.27. Ключевые слова

1.28. Выводы


1.29. Список литературы

1.30. Приложение

1.31. Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы)

1.32. Аннотация (краткое содержание статьи, ключевые слова)

1.33. Ключевые слова




.....

ANEXO 11


CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL


656 64 28 
M2lconstruccion@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 38 
Lebrija, Santander 



ANEXO 12

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y/O RECIBIDA

656 64 28 
M2constructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10 - 38 
Lebrija, Santander 



CONSTRUCCIONES
M2

ANEXO 13

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

656 64 29 
M2constructores@gmail.com 
Carrera 5 No. 10 - 38 
Leónido, Santander 

**CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARA COLABORADORES
PARA PERSONAS JURÍDICAS**

Me permito manifestar en un condició n de contador público de la compañía **CONSTRUCTORES SAS**, identificada con NIT. 806.570.48748, que ha cumplido de forma oportuna y completa con el pago de sus aportes y de sus obligaciones que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a sus pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1473 de 2017.

Se expone a solicitud del interesado y se cancela el presente certificado el día 15 de noviembre de 2021.



DEICY YANETH GARCÍA ALMEIDA
Contador Público
CC. 1.095.926.926 de Ghén
TF. 217269-T

[illegible]

* ** * *

• •



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

Source: <http://www.fishbase.org>

© 2000 John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

[illegible]

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804

[illegible]

It is important to note that the above results are based on the assumption that the data are stationary. If the data are non-stationary, the results may be biased. Therefore, it is important to test for stationarity before conducting the regression analysis.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2696-2702.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

[illegible]

^a $\chi^2 = 1.04$, $df = 1$, $p = .31$.
^b $\chi^2 = 1.04$, $df = 1$, $p = .31$.

7613. *Chen, J. and J. Chen.* 1992. *Journal of Applied Ecology* 29: 101-106.

... ..

Journal of Management Education 30(6) 789-802 © The Author(s) 2006
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

^a The number of subjects who were included in each group was 10.


1. *Prüfung* 2. *Prüfung* 3. *Prüfung* 4. *Prüfung* 5. *Prüfung* 6. *Prüfung* 7. *Prüfung* 8. *Prüfung* 9. *Prüfung* 10. *Prüfung* 11. *Prüfung* 12. *Prüfung* 13. *Prüfung* 14. *Prüfung* 15. *Prüfung* 16. *Prüfung* 17. *Prüfung* 18. *Prüfung* 19. *Prüfung* 20. *Prüfung* 21. *Prüfung* 22. *Prüfung* 23. *Prüfung* 24. *Prüfung* 25. *Prüfung* 26. *Prüfung* 27. *Prüfung* 28. *Prüfung* 29. *Prüfung* 30. *Prüfung* 31. *Prüfung* 32. *Prüfung* 33. *Prüfung* 34. *Prüfung* 35. *Prüfung* 36. *Prüfung* 37. *Prüfung* 38. *Prüfung* 39. *Prüfung* 40. *Prüfung* 41. *Prüfung* 42. *Prüfung* 43. *Prüfung* 44. *Prüfung* 45. *Prüfung* 46. *Prüfung* 47. *Prüfung* 48. *Prüfung* 49. *Prüfung* 50. *Prüfung* 51. *Prüfung* 52. *Prüfung* 53. *Prüfung* 54. *Prüfung* 55. *Prüfung* 56. *Prüfung* 57. *Prüfung* 58. *Prüfung* 59. *Prüfung* 60. *Prüfung* 61. *Prüfung* 62. *Prüfung* 63. *Prüfung* 64. *Prüfung* 65. *Prüfung* 66. *Prüfung* 67. *Prüfung* 68. *Prüfung* 69. *Prüfung* 70. *Prüfung* 71. *Prüfung* 72. *Prüfung* 73. *Prüfung* 74. *Prüfung* 75. *Prüfung* 76. *Prüfung* 77. *Prüfung* 78. *Prüfung* 79. *Prüfung* 80. *Prüfung* 81. *Prüfung* 82. *Prüfung* 83. *Prüfung* 84. *Prüfung* 85. *Prüfung* 86. *Prüfung* 87. *Prüfung* 88. *Prüfung* 89. *Prüfung* 90. *Prüfung* 91. *Prüfung* 92. *Prüfung* 93. *Prüfung* 94. *Prüfung* 95. *Prüfung* 96. *Prüfung* 97. *Prüfung* 98. *Prüfung* 99. *Prüfung* 100. *Prüfung*



ANEXO 14

INDUCCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

656 64 28 
V2constructores@gmail.com 
Carrera 8 No. 10-30 
Toluca, Estado de México 
Teléfono: 656 64 28



INDUCCIÓN DE PERSONAL

Empleador : M2L CONSTRUCTORES S.A.S
Nit. : 900500467-6
Proyecto : Construcción redes de acueducto y alcantarilla en
Barrio villa paraíso.

Yo Juan Esteban Górriz R. identificado con número de cédula de ciudadanía 13 719 820 certifico mediante documento que recibí inducción el día 4 del mes 12 del año 2021 y fui informado sobre los siguientes temas relacionados con el desempeño de mi cargo, normas de salud ocupacional, seguridad industrial y normas generales de proyectos a desarrollar mis funciones encomendadas por la empresa.

- Funciones y responsabilidades del cargo -
- Reglamento interno de trabajo -
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Programa de salud ocupacional
- Comité paritario de salud ocupacional
- Factores de riesgo a los que se expone en su labor
- Uso y mantenimiento de los equipos de protección personal
- Normas de conductas generales de la obra

Informo que he participado en la inducción de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto de construcción donde laboro, bajo los temas anteriormente y acepto estas condiciones.

FIRMA DEL TRAJADOR


NOMBRE COMPLETO

Juan Esteban Górriz R.

Juan Esteban Górriz R.

13 719 820
CEDULA

Axiliario de construcción
CARGO



2024

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE FARMACODEPENDENCIA, TABAQUISMO Y ALCOHOL

Con el objetivo de promover y mantener un ambiente de trabajo saludable, seguro y en armonía; libres de los efectos ocasionados por el alcohol, la farmacodependencia y el tabaquismo en la salud integral, el desempeño y la productividad de sus trabajadores, la Empresa Acepta como política para sus empleados; las siguientes directrices:

Es de carácter obligatorio:


- Participar activamente en los programas de sensibilización y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente Política.
- Facilitar la realización de las pruebas necesarias para esclarecer indicios de abuso de drogas y/o alcohol o para descartar, cuando el empleado esté involucrado en un accidente, la ingestión de dichas sustancias.
- Abstenerse de consumir tabaco en los puestos de trabajo y en general todas las áreas de la empresa.

Es de carácter prohibitivo:

- Poseer, utilizar, distribuir y vender sustancias alucinógenas dentro y fuera de las áreas de trabajo o durante el desarrollo de las actividades se constituye causa justa para dar por terminada la respectiva relación laboral.
- Consumir alcohol, en el horario laboral, dentro de las áreas de la empresa y/o encontrarse bajo los efectos del mismo, constituye causa justa para dar por terminada la respectiva relación laboral.
- El fumar dentro de las instalaciones de la empresa constituye una violación igual que las anteriores mencionadas por eso dará lugar a una sanción que corrija esta situación. .

Las anteriores directrices constituyen la esencia de la política de la empresa y son de obligatoria observancia y cumplimiento para todos y cada uno de los trabajadores y contratista de la empresa.

Representante Legal


C.C. 3.530.772

El trabajador


C.C. 3.719.870



COMPROMISO DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

Yo, Guan Esteban Jaramil, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13 719 870 de Bucaramanga, por medio del presente Documento Acredito que he leído y conozco las políticas de la empresa del No Consumo De Alcohol, Tabaco Y Drogas. Así mismo Autorizo a la empresa empleadora para que me sea practicado las pruebas médicas de laboratorio que se requieran para acreditar que no consumo alguna sustancia alucinógena o alcohol, durante la jornada laboral o el tiempo que preste mis servicios en la empresa, o en el lugar sea designado.

De igual manera la empresa se Notifica al Empleado que si se flagase a vez bajo la influencia de sustancias alucinógenas o alcohol al sitio de trabajo, y si al realizarse la respectiva prueba médica, su resultado es Positivo, el empleado será suspendido de las labores diarias y se deberá presentar al día siguiente ante su supervisor inmediato o quien haga sus veces, dado que dicha conducta se constituirá como motivo suficiente para imponer una sanción Disciplinaria contemplada en el Contrato de trabajo; reglamento interno de trabajo, Reglamento de Higiene y seguridad, así como en las Políticas de no Consumo de FARMACODEPENDENCIA, TABAQUISMO Y ALCOHOL, que ira desde una suspensión hasta la terminación del contrato de trabajo. De igual manera si el trabajador se Niega a que la prueba sea practicada se dará como entendido positivo el consumo y se tomaran las mismas medidas sancionatorias.

El Trabajador

El Empleador

Guan Esteban Jaramil
cc. 13 719 870

[Firma]
cc. 13 539 772



AVANCE DE OBRA 1
22 NOV-06 DIC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~7. The following information was obtained from the records of the Department of Social Services:~~

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1974 1000 06 01 0000
 ACT = 0000
 1974 1000 06 01 0000

ITEM N° 15 DE PLACADO

PRECIO UN CUB. M. 1.000,00

CONTEN. 1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPORTE: EMENDAR LAS ACIONES DE ACUMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCADA EN LA CALLE N° 108 ENTRE PASADIZO Y PASADIZO - MARIBO VILLA ANILLO DEL PUEBLO DE CALABO.

CONTRATISTA: INIL CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENIENTE: JORRINO S.A.S.

MADEIRADOR: ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ

CANTIDAD: 5,0 M2 DE ALICATADO

SUBCANTIDAD: 1

Valor presupuesto: 5.000,00

CONTRATO N°: 00000000000000000000

CONTRATANTE: INTERVENIENTE

UNIDAD: M2

UNIDADES: 5,0

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

ALICATADO

2.0

VARIABLE

OBSERVACIONES

1.35

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

TOTAL

10,22

ING. MIGUEL ANTONIO ARDILA DUEZ
SUPERVISOR
ING. ERO CALABO

[illegible]

ACHA	DD	MM	CCYY	ST
------	----	----	------	----

CONTINUED	
-----------	--

OBJETO: CONSULTA PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTO DE REGISTRO DE LA COMPRA DE LA VILLA DE LA ARROYA, DISTRITO DE LA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE TACNA, PERÚ DEL COMPAÑERO

2010 RELEASE UNDER E.O. 14176

— 5.4.5. —

MUNICIPALITY	INC. BUREAU OF THE CITY AND COUNTY
--------------	------------------------------------

OTRO	SI	CONTRACANTADO	SUBCAPITULO:	7.1	Legado y fideicomiso de entidad autista

1.2.1 Group 1: failure due material weakness

CC-BY-NC-ND 4.0

100-2115-1

U.S. Civil Service

0101-7214-1992-0001

45611514

7137711-71577

[illegible]

!

1

.....

5

2010年12月

REFERENCES

	10
--	----

• • •

~~CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION~~

John J. DeMunnich, Jr.
John J. DeMunnich, Jr. Attorney at Law

252 11110 DRAINAGE
4001A39407
23405 11110 DRAINAGE 11110

~~TYPE 30 220117M ZP QINQJHF 3903 VR~~

UNDERWRITING CIVIL SERVICE
4-2613374407

RECEIVED

[illegible]

[illegible]
