

**OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DEL 2021 -
INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021
QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE
LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE
12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO
DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**



**INFORME DEL INTERVENTOR AL ACTA PARCIAL N°1 DEL
CONTRATO DE OBRA N°107-2021-CONSTRUIR LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12
ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE
CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA
PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**

**PERIODO:
22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONTRATISTA: M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

INTERVENTOR: INTERING S.A.S.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DEL 2021 se realiza la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al CONTRATO DE OBRA N°107-2021 que tiene por objeto **CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 25 Y 3A Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**.

Este informe muestra las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre del 2021 al 23 de diciembre de 2021, con relación a la parte técnica, ambiental, administrativa y financiera del proyecto. Además, se muestra el avance que se tiene a la fecha.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El proyecto "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 25 Y 3A Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" se encuentra ubicada en el casco urbano del Municipio de Lebrija-Santander entre la calle 12 entre carreras 2b y 3a y la carrera 20 entre calle 12 y 12a- barrio Villa Paraíso.



Imagen 1. Localización Geografía del municipio de Lebrija



Imagen 2. Localización Barrio Villa Paraíso

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021**1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT: 800.137.201-6
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900.603.467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
INTERVENTORÍA	INTERING S.A.S. NIT: 300.872.416-6 R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISIÓN	SUPERVISOR TÉCNICO E.S.F. YAMILE FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E.S.P.
OBJETO:	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE. (\$386.342.515,37)
PLAZO INICIAL	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	23 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE 2021
MUNICIPIO:	LEBRIJA

Tabla 1. Resumen general del contrato de obra N° 107-2021

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

ACTA	FECHA	CONSERVACIÓN
INICIO DE INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE DESEMBOLOSO DEL ANTICIPO	29/11/2021	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. (\$15.902.754,50)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	23/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01	29/12/2021	AVANCE PARCIAL DEL 26,32%

Tabla 2. Relación de actas del contrato de obra N° 107-2021.

1.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato de obra no presenta ningún cambio técnico o modificación.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Las actividades técnicas realizadas en el presente periodo fueron:

1.01 cerramiento

Se realizó instalación de cerramiento en tela verde, con el fin de aislar y delimitar la zona donde se ejecutarán las actividades del contrato.

1.02 señalización del área de trabajo

Se realizó instalación de señalización vial tubular, cinta de peligro y reflectores en la zona de ejecución del contrato, según lo dispuesto por el ministerio de transporte y la entidad contratante.

1.03 Campamento de obra (25 m2)

Se realizó edificación del sitio que funcionará como campamento para el personal de la obra, e que contempla zona de acodo para el depósito de materiales y un almacén para el resguardo de herramientas y equipos.

1.04 localización, Medición, Replanteo y Control de Obra

Se realizó la localización, nivelación, control, medición y levantamiento topográfico de la zona a mantener siguiendo las referencias de proyecto.

1.05 desinstalación Tubería existente

Se realizó la demolición, desinstalación y retiro de tubería de alcantarillado de grés y concreto existente, con el fin de garantizar una zona adecuada para la ejecución de las actividades del contrato.

3.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.03 relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se relleno con arena para nivelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de deságüe, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y cobricamente soportada en toda su longitud.

3.05 Carga y retiro de material sobrante

Se realizó el carga y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, demoliciones y desinstalaciones ejecutadas.

3.06 Sum e Inst. Tubería novafort de 12"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafort de 12" para la red de alcantarillado de acuerdo a los freamientos consignados en los planos del proyecto verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.07 Sum e Inst. Tubería novafort de 10"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafort de 10" para la red de alcantarillado de acuerdo a los freamientos consignados en los planos del proyecto verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

4.03 Construcción Pozos de inspección D=1,20m H=1,2-2,0m

Se realizó la construcción de Pozos de inspección de D=1,20m y H=(1,2-2,0)m en ladrillo mate, de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

		CONDICIONES		ACTA
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	INICIALES CANT	PARCIALES CANT
1 PRELIMINARES				
1.01	Cerramiento	ML	378,00	183,60
1.02	Señalización de área de trabajo	GLB	1,00	1,00
1.03	Campamento de obra (25 m2)	GLB	1,00	1,00
1.04	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra	MES	2,00	1,00
1.05	Desinstalación Fuseria existente	ML	258,65	18,00
2 RED DE ACUEDUCTO				
2.01	Excavación manual en material común	m3	102,00	0,00
2.02	Relleno compactado material común	m3	34,00	0,00
2.03	Relleno seleccionando	m3	42,50	0,00
2.04	Relleno en arena para orientación de Fuseria	m3	25,50	0,00
2.05	Concreto para atraque 3000 psi	m3	5,31	0,00
2.06	Carga y retiro de material sobrante	m3	88,00	0,00
2.07	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios UM	ml	84,33	0,00
2.08	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios UM	ml	128,20	0,00
2.09	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 ps	un	1,00	0,00
2.10	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 ps	un	1,00	0,00
2.11	sum e Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi	un	1,00	0,00
2.12	TEE Hierro Ductil de 3"	un	2,00	0,00
2.13	TEE Hierro Ductil de 2"	un	2,00	0,00
2.14	Codo 90° Hierro Ductil 2"	un	4,00	0,00
2.15	Codo 45° Hierro Ductil 2"	un	2,00	0,00
2.16	Accesorios Hidráulica	un	16,00	0,00

3 REJO DE ALCANTARILLADO				
3.01	Excavación en material común	m3	391.52	391.39
3.02	Relevo compactado material común	m3	143.59	142.10
3.03	Relevo seleccionado	m3	102.36	52.61
3.04	Relevo en arena para cimentación de Tubería	m3	102.36	54.72
3.05	Carga y recibo de material sobrante	m3	247.93	232.82
3.06	Sume Inst. Tubería novato de 12"	ml	149.20	18.00
3.07	Sume Inst. Tubería novato de 10"	ml	144.15	12.00
3.08	Acometida Alcantarillado	un	18.00	6.00
4 POZOS Y SUMIDEROS				
4.01	Sumidero Transversal	ml	18.00	0.00
4.02	Sumidero Lateral SL200	un	2.00	0.00
4.03	Construcción Pozos de Inspección D=1.23m H=11.2-2.00m	un	11.00	2.00
4.04	Mejoramiento pozos existentes	un	1.00	0.00
4.05	Conexión a pozo existente (incluye demolición y empuje)	un	1.00	0.00

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:

El avance corresponde a un 26.32% y presenta un retraso respecto a la programación de obra debido a las fuertes lluvias presentadas durante la jornada laboral, las cuales han impedido el desarrollo normal de las actividades.

3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD
Director De Obra	1
Residente De Obra	1
Profesional SST	1
Oficiales	2
Ayudantes	4
PERSONAL TOTAL	9

4. EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VOLQUETA	1	7 M3
RETROEXCAVADORA	1	
COMPACTADOR	1	SALTARIN
COMPACTADOR	1	RANA
CORTADORA	1	ELECTRICA
PULIDORA	1	ELECTRICA
DEMOLIDOR	1	
HERRAMIENTA MENOR	1	GLOBAL

5. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron fuertes lluvias, las cuales afectaron directamente las actividades ejecutadas a la intemperie, disminuyendo el rendimiento de la obra debido a deterioro del terreno e inundaciones en las excavaciones.

6. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: SEGUROS MUNICIPAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	B-100021377	25/11/2021	30/12/2021
BUEN MANEJO DEL AMBIENTE		22/11/2021	30/12/2021
PRESTACIONES SOCIALES		25/11/2021	30/12/2021
ESTABILIDAD DE LA OBRA		22/11/2021	30/12/2021
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	B-100004609	22/12/2021	30/12/2021
PATRONAL		22/12/2021	30/12/2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		22/12/2021	30/12/2021
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/12/2021	30/12/2021

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DE 2021

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT: 800.127.201-5
CONTRATISTA:	INTERING S.A.S. NIT: 800.872.415-5 R.L CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARREPAS 2B Y 3A Y LA CARREPA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL:	VEINTIDCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE. (\$29.617.964,08)
PLAZO INICIAL:	TRÉNTA Y OCHO (38) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	LEBRIJA

Tabla 3. Resumen general del contrato de consultoría No. 108/2021.

El objetivo principal de la Interventoría consiste en realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra verificando que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en el contrato celebrado con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., también tiene como responsabilidad contar con el equipo de profesional calificado y que los recursos humanos deben ser suficientes para realizar de manera eficaz los procesos y actividades necesarios que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del Contrato de Obra respectivo.

2.2. RELACION DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA.

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	22.11.2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22.12.2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 22/12/2021

Tabla 4. Cuadro resumen relación actas de Interventoría No. 108/2021

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

3.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

La interventoría revisa las especificaciones técnicas y verifica que el contratista cumpla con todas las actividades descritas en el presupuesto.

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Verificación y revisión de las cantidades ejecutadas por el contratista durante el presente periodo.
- Medición y control de las excavaciones y rellenos
- Verificación de la correcta instalación de tubería.
- Verificación de la correcta construcción de pozos de inspección.

Se ha exigenciado que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que se da por parte de aceptación que las actividades ejecutadas se encuentra dentro de los estándares de calidad.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Bitácora de obra donde se registra cada una de las actividades ejecutadas. La cual se encuentra firmada por parte de la obra y la interventoría.
- Seguimiento y control a la programación de obra, donde se evidencia un avance con el cronograma de actividades presentado inicialmente. Se pudo comprobar que debido a la época de sequía algunos proveedores de materiales han suspendido actividades hasta el próximo año.
- Verificación de los pagos de planillas de Seguridad Social del personal de obra e interventoría.
- Disponibilidad para la atención de la comunidad ante dudas que se presentan con respecto al proyecto, siendo atendidos por los residentes de obra e interventoría.
- Se hace la revisión permanente de las actividades ejecutadas, esto se hace en conjunto con el contratista.
- Se toma registro fotográfico del avance de obra.

3.1.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- A la fecha del presente informe se ha realizado seguimiento y verificación de la octava revisión del anticipo, se realiza proyección del acta para el N° 11 de contratista.

3.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento a la disposición final de los desechos en los lugares apropiados. Todas las labores se realizan teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

3.1.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Se verifica que el personal de obra del contratista posea los planos del proyecto.
- Se verifican todas las actividades ejecutadas en obra.
- Socialización con los trabajadores sobre la importancia de realizar un trabajo de calidad.
- Control de la disposición de residuos en la obra, interviniendo que se encuentren en los lugares indicados.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

3.2.1. PERSONAL:

CARGO	CANTIDAD
Director De Interventoría	1
Residente De Interventoría	1
Topógrafo	1
Asesor Ambiental	1

Asegur Siso	1
PERSONAL TOTAL	5

Tabla 5. Retiro del Personal de Interventoría

3.2.2. OTROS RECURSOS:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Edición De Informes	1
Equipos Oficina	1
Comunicaciones	1
Vehículo	1

Tabla 6. Retiro de los Recursos de Interventoría

3.3. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	B-100321390	15/11/2021	10/05/2022
PRESTACIONES SOCIALES		15/11/2021	16/01/2025
CALIDAD DEL SERVICIO		15/11/2021	16/01/2027


Tabla 7. Pólizas de Interventoría

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance del contrato de obra durante el presente periodo corresponde a un porcentaje acumulado del 29.32%.
- Se realiza control y vigilancia durante los diferentes procesos constructivos de tal manera se garantiza la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se efectuó el seguimiento a las actividades sociales, ambientales, inspección de uso de elementos de protección personal en el frente de obra.
- Se recomienda realizar una suspensión temporal al contrato de obra teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales en la zona de ejecución del proyecto. Del mismo modo se evidenció que la entrega de materiales para el desarrollo del objeto contractual se encuentra retrasada debido a los retrasos contables que realizan internamente los proveedores.

5. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CÉSAR AUGUSTO ARÉVALO HERNÁNDEZ
 S.P. INTERING S.A.S.

INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° 137 DE 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001-2021
CONTRATO DE OBRA No. 107-2021

CONTRATO	107-2021
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 3A Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
PLAZO	IREINTA Y OCHO (38) DIAS
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S NIT No. 902600467-8 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No. 13.539.772 expedida en Lebrija
INTERVENTORIA	INTERING S.A.S R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ C.C. # 1.095.792.322 expedida en Lebrija
VALOR ACTA PARCIAL No. 01 MENOS AMORTIZACION	\$ 171.670.407,19 - \$33.501.122,14 = SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS (MCTE1571.169.285,03)
PERIODO	22 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

En el Municipio de Lebrija, el veintitrés (23) de diciembre del año 2021 en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron, YAMILLE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisor administrativo y técnico designados por la ESP, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL identificado con CC No. 13.539.772 expedida en Lebrija, en calidad de representante legal de la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S; y CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ representante legal de la INTERVENTORIA, INTERING S.A.S; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001 del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 comprendida entre el 22 de noviembre y el 23 de diciembre del 2021, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en la presente acta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe de los supervisores y del contratista.

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1		PENDIENTES POR EJECUTAR		
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT.	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$ 30.000.000,00		\$ 16.379.501,33		\$ 13.620.498,67
1	Conveniencia	M2L	37,000	\$ 25.000,00	\$ 925.000,00	23,00	\$ 575.000,00	14,00	\$ 350.000,00
1	Señalamiento del área de trabajo	GIS	1,00	\$ 1.954.850,00	\$ 1.954.850,00	1,00	\$ 1.954.850,00	0,00	\$ 0,00
	Campeamento de obra (25 m2)	GIS	1,00	\$ 4.325.348,00	\$ 4.325.348,00	1,00	\$ 4.325.348,00	0,00	\$ 0,00
1	Ubicación, medición, replanteo y control de obra	DES	2,00	\$ 4.174.200,00	\$ 8.348.400,00	1,00	\$ 4.174.200,00	1,00	\$ 4.174.200,00
1.1	Deslinde de terreno existente	M2L	254,55	\$ 15.000,00	\$ 3.818.750,00	12,00	\$ 306.120,00	242,55	\$ 3.512.630,00
2	RED DE ACUEDUCTO				\$ 46.556.285,05		\$ 6,00		\$ 46.556.285,05
2	Transporte manual en material común	m2	102,00	\$ 42.800,00	\$ 4.365.600,00	0,00	\$ 0,00	102,00	\$ 4.365.600,00
2	Relevo compactado material común	m3	30,00	\$ 59.750,00	\$ 1.792.500,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 1.792.500,00
2	Relevo en tubería de	m3	40,50	\$ 57.000,00	\$ 2.318.250,00	0,00	\$ 0,00	40,50	\$ 2.318.250,00
2	Relevo en tubería para cimentación de tubería	m3	25,50	\$ 149.675,00	\$ 3.816.812,50	0,00	\$ 0,00	25,50	\$ 3.816.812,50
2.1	Concreto para albañilería 3000 psi	m3	5,31	\$ 348.122,50	\$ 1.859.350,38	0,00	\$ 0,00	5,31	\$ 1.859.350,38
2.1	Cargos y relleno de material sustrante	m3	68,00	\$ 27.981,00	\$ 1.903.116,00	0,00	\$ 0,00	68,00	\$ 1.903.116,00
2.1	Sum. e inst. Tubería Pol. HDPE-21 de 3" inc accesorios UFA	ml	84,00	\$ 79.026,04	\$ 6.645.912,16	0,00	\$ 0,00	84,00	\$ 6.645.912,16
2.1	Sum. e inst. Tubería Pol. HDPE-21 de 2" inc accesorios UFA	ml	128,30	\$ 79.026,04	\$ 9.961.935,38	0,00	\$ 0,00	128,30	\$ 9.961.935,38
2.1	Sum. e inst. Válvula compuesta de hierro 3" 300 psi	un	1,00	\$ 405.855,20	\$ 405.855,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 405.855,20
2.1	Sum. e inst. Válvula compuesta de hierro 2" 300 psi	un	1,00	\$ 312.515,20	\$ 312.515,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 312.515,20
2.1	Sum. e inst. Válvula 1/2" 300 psi	un	1,00	\$ 301.455,20	\$ 301.455,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 301.455,20
2.1	TEC. Hierro Ductil de 3"	un	2,00	\$ 122.750,00	\$ 245.500,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 245.500,00
2.1	TEC. Hierro Ductil de 2"	un	1,00	\$ 93.510,00	\$ 93.510,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 93.510,00
2.1	Codo 90° Hierro Ductil 2"	un	4,00	\$ 779.110,00	\$ 3.116.440,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 3.116.440,00
2.1	Codo 45° Hierro Ductil 2"	un	2,00	\$ 103.711,60	\$ 207.423,20	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 207.423,20
2.1	Accesorios para ducto	m	15,00	\$ 365.400,00	\$ 5.481.000,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 5.481.000,00
3	RED DE ALICANTARILLADO				\$ 163.299.987,20		\$ 45.791.336,27		\$ 117.508.650,93


3	Relato de estado de	m2	102,35	\$ 87.871,00	\$ 8.948.801,80	55,80	\$ 5.140.712,15	42,54	\$ 3.729.094,65
3	Relato en área para cimentación en	m3	102,35	\$ 145.679,00	\$ 15.311.147,44	14,72	\$ 9.190.474,85	47,64	\$ 1.130.007,14
3.1	Cargas verticales de material inerte	m3	247,99	\$ 27.987,00	\$ 6.934.815,01	217,80	\$ 5.515.315,35	15,11	\$ 421.597,66
3.1	Sumidero lateral Tubo de 12"	ml	148,50	\$ 175.447,85	\$ 26.014.717,76	18,00	\$ 3.158.397,80	19,30	\$ 22.881.775,14
3.1	Sumidero lateral Tubo de 10"	ml	144,75	\$ 117.592,27	\$ 17.008.585,72	12,00	\$ 1.415.911,24	132,75	\$ 15.592.678,48
3.1	Accesorios de tubería	un	16,30	\$ 230.058,30	\$ 3.680.937,60	0,00	\$ 0,00	16,30	\$ 3.680.937,60
4	Trasdos y sumideros				\$ 195.274.759,01		\$ 5.140.475,14		\$ 97.374.799,97
4	Sumidero lateral	ml	18,30	\$ 2.750.172,47	\$ 50.595.595,56	0,00	\$ 0,00	18,30	\$ 50.595.595,56
4	Sumidero lateral S-300	un	1,00	\$ 5.000.419,77	\$ 5.170.439,42	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.170.439,42
4	Construcción de losas de concreto en 1,10m	m2	11,00	\$ 4.572.127,57	\$ 50.272.513,27	2,00	\$ 4.140.475,14	9,00	\$ 41.132.038,13
4	Mejoramiento de losas existentes	m2	1,00	\$ 157.841,13	\$ 152.541,10	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 151.841,10
4.1	Forma en el piso existente (incluye	un	1,00	\$ 140.071,64	\$ 144.071,54	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 142.971,66
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 286.179.640,32		\$ 75.571.412,73		\$ 210.608.227,59
ADMINISTRACIÓN				7%	\$ 20.032.095,69		\$ 21.840.305,69		\$ 51.151.786,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.861.796,40		\$ 753.124,11		\$ 7.108.382,28
UTILIDAD				5%	\$ 14.308.982,02		\$ 3.765.570,64		\$ 10.543.411,38
TOTAL OBRAS				45%	\$ 100.162.874,11		\$ 20.376.394,46		\$ 79.786.479,65
ACUMULADO COSTO TOTAL					\$ 386.342.514,43		\$ 100.670.437,19		\$ 285.672.107,24
					NETO A PAGAR		\$ 101.670.407,19		


Valor primera cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001	\$ 101.670.407,19
Menos amortización por anticipo	\$ 30.501.122,16
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 71.169.285,03

Se expide en Lebrija, el veintitrés (23) de diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 SUPERVISORA



Diego Fernando Ardila Gomez
 SUPERVISOR


M2L CONSTRUCTORES S.A.S.
R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
 Representante legal
 CONTRATISTA


INTERING S.A.S
R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
 Representante legal
 INTERVENIORIA

CORTE 1

22 NOV-23 DIC



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	1
-------------	---

1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 2554-2555
 2556-2557
 2558-2559
 2560-2561
 2562-2563
 2564-2565
 2566-2567
 2568-2569
 2570-2571
 2572-2573
 257

[illegible]

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE	OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL	WASHINGTON, D.C. 20530
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

[illegible]


1001	(A) FIFTY-ONE (51)	
1002		

[illegible][illegible]

1. $\frac{1}{2}$

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Figure 1



UNION DE LA REPUBLICA

FECHA: 20/05/2011 CONTRATO: 1

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE LA CARPETA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATADO: EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

FECHA DE TERMINACION: 19/05/2012

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000

FECHA DE INICIO: 20/05/2011

[illegible]

Year	mm	mm	mm
1997	10	10	10
1998	10	10	10
1999	10	10	10
2000	10	10	10
2001	10	10	10
2002	10	10	10
2003	10	10	10
2004	10	10	10
2005	10	10	10
2006	10	10	10
2007	10	10	10
2008	10	10	10
2009	10	10	10
2010	10	10	10
2011	10	10	10
2012	10	10	10
2013	10	10	10
2014	10	10	10
2015	10	10	10
2016	10	10	10
2017	10	10	10
2018	10	10	10
2019	10	10	10
2020	10	10	10
2021	10	10	10
2022	10	10	10
2023	10	10	10
2024	10	10	10
2025	10	10	10
2026	10	10	10
2027	10	10	10
2028	10	10	10
2029	10	10	10
2030	10	10	10
2031	10	10	10
2032	10	10	10
2033	10	10	10
2034	10	10	10
2035	10	10	10
2036	10	10	10
2037	10	10	10
2038	10	10	10
2039	10	10	10
2040	10	10	10
2041	10	10	10
2042	10	10	10
2043	10	10	10
2044	10	10	10
2045	10	10	10
2046	10	10	10
2047	10	10	10
2048	10	10	10
2049	10	10	10
2050	10	10	10
2051	10	10	10
2052	10	10	10
2053	10	10	10
2054	10	10	10
2055	10	10	10
2056	10	10	10
2057	10	10	10
2058	10	10	10
2059	10	10	10
2060	10	10	10
2061	10	10	10
2062	10	10	10
2063	10	10	10
2064	10	10	10
2065	10	10	10
2066	10	10	10
2067	10	10	10
2068	10	10	10
2069	10	10	10
2070	10	10	10
2071	10	10	10
2072	10	10	10
2073	10	10	10
2074	10	10	10
2075	10	10	10
2076	10	10	10
2077	10	10	10
2078	10	10	10
2079	10	10	10
2080	10	10	10
2081	10	10	10
2082	10	10	10
2083	10	10	10
2084	10	10	10
2085	10	10	10
2086	10	10	10
2087	10	10	10
2088	10	10	10
2089	10	10	10
2090	10	10	10
2091	10	10	10
2092	10	10	10
2093	10	10	10
2094	10	10	10
2095	10	10	

[illegible]

DATE RECEIVED		BY	
APPROVED BY		SIGNATURE	

[illegible]

MEMORIA	NO. 1	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

COUNTRY	J.F.	CÓDIGO ALFANUMÉRICO		Zona libre, Tabacalera, etc. de la "Z"	VALOR	n	ORIGINAL DEL DOCUMENTO	VALOR MONEDA
		1	2					
ARGENTINA	14	1	1					

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

100

[illegible][illegible]

Case	α	β	γ	δ	ϵ	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	$\omicron$	π	ρ	σ	τ	υ	ϕ	χ	ψ	ω
1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
7	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
8	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
9	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
10	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
11	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
12	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
13	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
14	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
15	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
16	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
17	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1													


[illegible][illegible]

[illegible]


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación cerramiento en tela verde

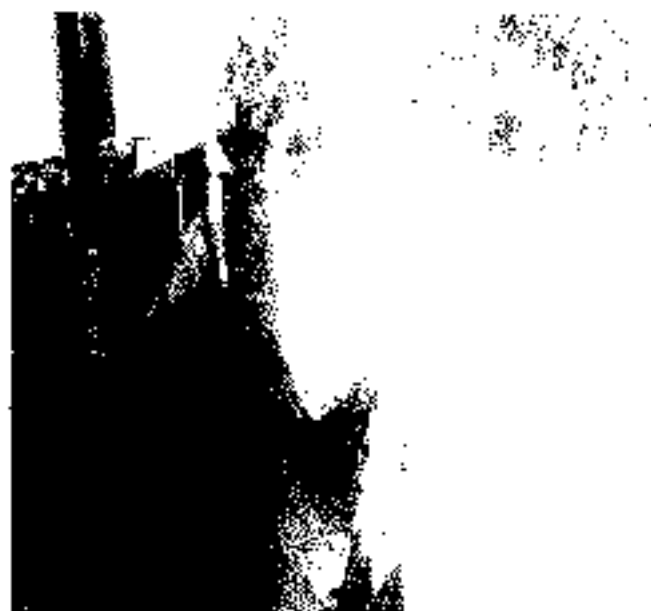

Instalación cerramiento en teja verde

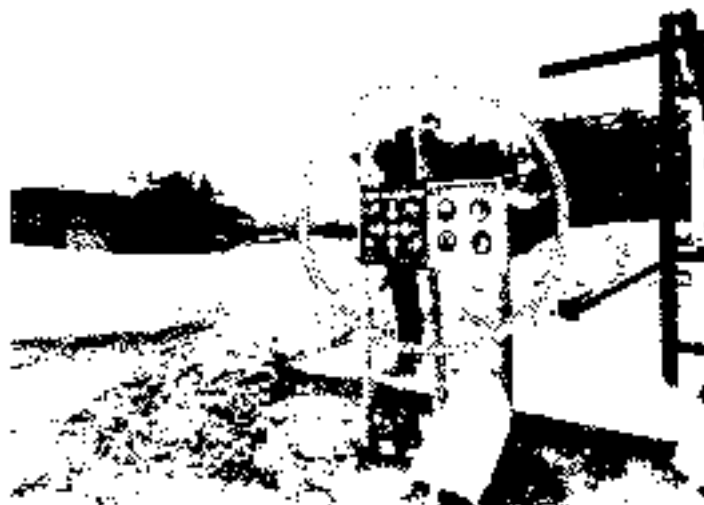

Instalación señalización.



Adecuación Campamento



Localización Y Replanteo



Localización Y Replanteo



Desinstalación Tubería Existente



Excavaciones En Material Común




Excavaciones En Material Común



Relleno En Material Común



Re lleno En Material Común

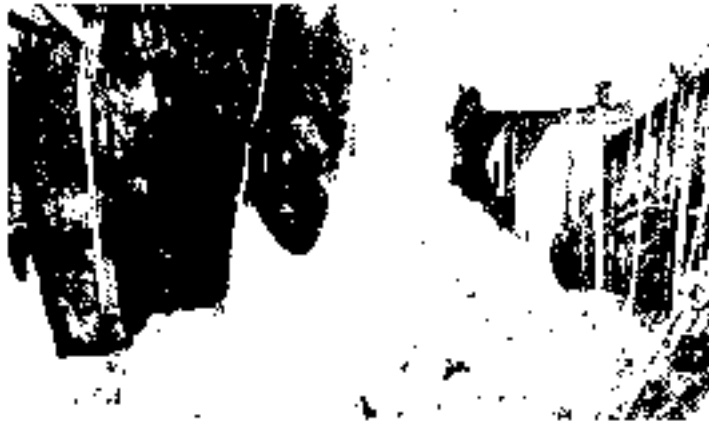

Re lleno En Material Seleccionado



Re lleno En Arena Para Cimentación De Tubería



Instalación de tubería sanitaria 12"



Instalación de tubería sanitaria 10"



Cargue y retiro de material sobrante



Construcción Pozo De Inspección
