

PERIODO:

CONTRATISTA: M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

INTERVENTOR: INTERING S.A.S.

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT 800.137.201-5
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT 900.530.467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL
INTERVENTORÍA	INTERING S.A.S. NIT 900.872.418-6 R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO OLIVERA DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TÉCNICO E.S.P.
SUPERVISIÓN	YAMIL F. FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E.S.P.
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SIETE CENTAVOS MOTE. (\$386.342.515,07)
VALOR ADICIONAL	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MOTE. (\$122.376.314,96)
PLAZO INICIAL	TREINTA Y OCHO (38) DIAS
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N°01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO N°02	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO	LEBRIJA

Tabla 1. Resumen general del contrato de obra No. 107/2021

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE DESMBOLSO DEL ANTICIPO	29/11/2021	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINQUENTA CENTAVOS MOTE. (\$15.932.754,50)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01	23/12/2021	AVANCE PARCIAL DEL 20,32%
ACTA DE REINICIO N°01	11/01/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS

ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	DE 13/01/2022	SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE REINICIO N°02	25/03/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
OTROSÍ	31/03/2022	ADICIÓN EN VALOR POR \$122 376 314,96 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01	31/03/2022	VARIACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02	En Trámite	AVANCE PARCIAL DEL 66,35% Y AVANCE ACUMULADO DEL 88,89%

Tabla 2. Cronograma de ejecución de los actos del contrato de obra N° 167/2021

1.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato de obra ha presentado las siguientes modificaciones:

Pozos de inspección: aunque se tenían contemplados la construcción de pozos de inspección, se habían definido con alturas menores a 2 metros, basados en el catastro del municipio y en la información preliminar, una vez realizada las excavaciones se puede identificar que se presentaron anomalías en las profundidades de los pozos, y teniendo hasta alcantarillados en contra flujo, lo cual estaba haciendo colmatación en los pozos y generando filtraciones en el terreno. Debido a esta situación se realiza una inspección detallada del alcantarillado para determinar las condiciones reales de excavación en temas de profundidad.

Así mismo el alcantarillado de aguas residual y agua lluvia está generando una sola excavación en su anchura debido a que están condicionados a estar cercanos por los espacios que existen en las respectivas vías, así mismo por el comportamiento del terreno a la hora de excavar a cual no se podía emborcar por separado. Y sus respectivas profundidades donde no era posible excavar de forma vertical y localizar en forma de trapezo.

El nuevo ítem de pozos de inspección va enfocarse a construir pozos de alturas superiores a 2 m e inferiores a 4 m, de esta forma garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado con las pendientes requeridas por la Resolución 0330 de junio de 2017.

Silla Yee, para las conexiones correctas del sistema de alcantarillado y las acometidas, se hace necesario por medio de accesos realizar el respectivo amparre, con el fin de evitar algún tipo de fuga que posteriormente genere erosión en el terreno.

Entre accesos pueden ser silla Yee, cajas de transición o llegar a respectivos pozos, para generar mayor estabilidad en el proceso constructivo se proyecta con las Silla Yee para cada una de las acometidas.

Una de las características encontradas en el sistema existente es que las viviendas no contaban con estos elementos de conexión y se conectaban por medio de mangueras hacia los pozos y al tubo de forma artesanal.

Cajas de inspección: debido a que las viviendas no contaban con las cajas de inspección existentes, se deben realizar con el fin de instalar de forma adecuada la conexión de la acometida.

Se aprueba el ítem y la construcción de caja de inspección 0.60x0.45 en maniquera y debido a que así se garantiza las conexiones de las viviendas hacia el sistema de abastecimiento principal frente a cada vivienda, además sirve de respaldo a cualquier situación de obstrucción o filtraciones que se presenten, para efectos de la estanquidad de la obra y su proyección a futuro se hace viable contemplar el ítem y todos los ítems que converjan, con este fin la interventoría avala la solicitud de este ítem.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Las actividades técnicas realizadas en el presente período fueron:

El crecimiento

Se realizó instalación de cerramiento en tela verde, con el fin de aislar y delimitar la zona donde se ejecutarán las actividades del contrato.

1.04 localización, elección, Replantes y Control de Obra

Se realizó la localización, nivelación control, medición y levantamiento topográfico de la zona a intervenir siguiendo las referencias del proyecto.

1.05 Desinfectación Tuberos existente

Se realizó la demolición, desinstalación y retiro de tubería de alcantarillado de gres y concreto existente con el fin de garantizar una zona adecuada para la ejecución de las actividades del contrato.

2.01 excavation and material control

Se regularon excavaciones en material común correspondientes a la red de acueducto de acuerdo a los freamientos consignados en los planos del proyecto.

2.02 Reducido compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zonas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a las especificaciones contempladas en los planos del proyecto.

2,02 cellule selezionato

Se realizará relleno y compactación de material seleccionado en las zonas de los pillos indicados para la construcción de la red de acueducto de acuerdo a los alineamientos consignados en los planos del proyecto.

2.04 relleno en arena para cimentación de Tuberia

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se rellena con arena para revelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y correctamente soportada en todo su longitud.

1.05 Concrete para abrigue 3000 psi

3.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.03 Relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se relleno con arena para nivelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y correctamente soportada en toda su longitud.

3.05 Cargue y retiro de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, cementaciones y desinstalaciones ejecutadas.

3.06 Sum. e Inst. Tubería novafon de 12"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafon de 12" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.07 Sum. e Inst. Tubería novafon de 10"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafon de 10" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.08 Acometida Alcantarillado

Se realizó la instalación correspondiente a las derivaciones que parten de las cajas de inspección con alcantarillas y que llegan hasta la red secundaria de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

4.01 Sumidero Transversal

Se realizó la construcción de sumideros transversales de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

4.03 Construcción Pozos de Inspección Ø=1,20m H=1,2-2,0m

Se realizó la construcción de Pozos de inspección de D=1.20m y H=(1.2-2.0)m en ladrillo teleta, de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

4.04 Mejoramiento pozos existentes

Se realizó mejoramiento a los pozos existentes corrigiéndose las deficiencias encontradas en los mismos.

4.05 Conexión a pozo existente (incluye demolición y arreglo)

Se realizó la perforación y resaca que los pozos de inspección existentes con el fin de conectar las tuberías.

5.01 Construcción Pozos de inspección D=1.20m H=(2.0-5.0)m

Se realizó la construcción de Pozos de inspección de D=1.20m H=(2.0-5.0)m en ladrillo teleta, de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

5.02 SELLA YEE 6"X10" PVC

Se realizó la conexión a la red de alcantarillado se por medio de SILLA YEE 6"X10" PVC de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

5.03 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60X0.60

Se realizó la construcción de CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60 de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

ITEM	ACTIVIDADES	UNID.	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA PARCIAL 2	ACUMULADO
			CANT	CANT	CANT
1 PRELIMINARES					
1.01	Comunicación	ML	276.00	138.40	137.60
1.02	Señalización del área de trabajo	Q.B.	1.00		1.00
1.03	Compensación de obra (25 m ²)	Q.B.	1.00		1.00
1.04	Inspección, Medición, Registro y Control de Obra	MES	1.00	1.00	2.00
1.05	Desmantelamiento Tubería existente	ML	230.00	238.65	258.55
2 RED DE ACUEDUCTO					
2.01	Extracción manual del material común	m ³	134.14	134.14	134.14
2.02	Relevo compactado material común	m ³	16.47	16.72	21.72
2.03	Relevo seleccionado	m ³	27.14	27.14	27.14
2.04	Relevo en arena para cementación de Tubería	m ³	10.55	24.72	24.72
2.05	Concreto para estaca 3000 psi	m ³	3.74	1.43	1.43
2.06	Concreto a retiro de material sobran	m ³	61.66	61.66	61.66
2.07	sum. a Inst. Tubería P.V.C. RDE-2" 14.7' inc. accesorios UN	m	24.30	75.00	75.00
2.08	sum. a Inst. Tubería P.V.C. RDE-2" 14.7' inc. accesorios UN	m	146.20	61.32	61.32
2.09	sum. a Inst. válvula compuerta de diam. 2" 300 ps.	un	1.00	1.00	1.00
2.10	sum. a Inst. válvula compuerta de diam. 2" 300 ps.	un	1.00	1.00	1.00
2.11	sum. a Inst. válvula de cierre 1" 300 psi	un	1.00	1.00	1.00
2.12	TEE Horno Ductil de 2"	un	2.00	2.00	2.00
2.13	TEE Horno Ductil de 2"	un	2.00	2.00	2.00
2.14	Codo 90° Horno Ductil de 2"	un	4.00	4.00	4.00
2.15	Codo 45° Horno Ductil de 2"	un	2.00	2.00	2.00
2.16	Accesorio de Hidráulica	un	29.00	0.00	0.00

3. RED DE ALCANTARILLADO					
3.01	Excavación en material común	m3	813,35	527,46	513,35
3.02	Relevo con pedregal material común	m3	451,54	251,35	435,34
3.03	Relevo selectivo	m3	16,46	45,76	16,46
3.04	Relevo en arena con empuje en la Tubería	m3	121,32	73,60	118,32
3.05	Cargue y retiro de material secundario	m3	665,76	455,94	658,76
3.06	Suma Inst. Tubería novata de 12"	m	154,40	155,40	154,40
3.07	Suma Inst. Tubería novata de 10"	m	144,15	132,15	144,15
3.08	Acopio de Alcantarillado	m	25,00	5,00	12,00
4. POZOS Y SUMIDORES					
4.01	Sumidero Transversal	m	18,00	5,00	12,00
4.02	Sumidero Lateral SL23P	m	2,00		0,00
4.03	Construcción Pozo de Inspección de 1,23m H=1,20-5,9m	m	6,00	4,00	6,00
4.04	Mejoramiento poro existentes	m	2,00	2,00	2,00
4.05	Conexión a pozos existentes (duros, peraltados y empujes)	m	2,00	2,00	2,00
5. FEMEC PRESTIGIO					
5.01	Construcción Pozo de Inspección de 1,23m H=1,20-5,9m	UN	5,00	5,00	5,00
5.02	SIJLA VEE 60X30 PVC	UN	20,00	15,00	18,00
5.03	CAJA DE INSPECCIÓN 60X30,30	UN	20,00	15,00	18,00

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:

El avance físico de obra corresponde a un 86,69%, cumpliéndose con los rendimientos y plazos establecidos en la programación de obra

3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD
Director De Obra	1
Residente De Obra	1
Profesional SST	1
Oficiales	1
Ayudantes	11
PERSONAL TOTAL	15

4. EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VOLQUETA	1	7 M3
RETROEXCAVADORA	1	
COMPACTADOR	2	SALTARIN
COMPACTADOR	2	RAMA
CORTADORA	3	ELECTRICA
PULIDORA	3	ELECTRICA
DEMOLIDOR	3	
HERRAMIENTA MENOR		GLOBAL

5. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron fuertes lluvias, las cuales afectaron directamente las actividades ejecutadas a la intemperie, disminuyendo el rendimiento de la obra debido a desmoronamiento del terreno e inundaciones en las excavaciones.

6. CUADRO DE CONTROL DE FÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	B-100021377	27/11/2021	31.05/2022
SITIO MANEJO DEL ANTICIPO		22/11/2021	31.05/2022
PRESTACIONES SOCIALES		27/11/2021	31.01/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		22/11/2021	31.05/2022
AMPARO BÁSICO- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	B-10004609	22/12/2021	31.05/2022
PATRÓNAL		22/12/2021	31.05/2022
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		22/12/2021	31.05/2022
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/12/2021	31.05/2022

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DE 2021

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E S.P. NIT: 800 137 201-5
CONTRATISTA:	INTERING S.A.S NIT: 800 872.413-8 R.L JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 28 Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS M.C.T.E. (\$28.617.964.08)
VALOR ADICIONAL:	NOVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M.C.T.E. (\$9.342.590.00)
PLAZO INICIAL:	VEINTA Y OCHO (38) DÍAS
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N°01:	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO N°02:	28 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO:	LEBRIJA

Tafel 3 Resumen estado del contrato de consultoría N° 108/2021.

El objetivo principal de la Interventoría consiste en realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra verificando que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en el contrato celebrado con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E S.P.;

también tiene como responsabilidad contar con el equipo de profesional calificada y que los recursos humanos deben ser suficientes para realizar de manera eficaz los procesos y actividades necesarias que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del Contrato de Odra respectivo.

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA.

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	22-11-2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22-12-2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE REINICIO N°01	11-01-2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	13-01-2022	SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE REINICIO N°02	28-03-2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
OTROS	31-03-2022	ADICIÓN EN VALOR POR \$5 042.000,00 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES

Tabla 4. Cuadro resumen resumido de actas de Interventoría N° 01 y 02

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

3.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

La interventoría revisa las especificaciones técnicas y verifica que el contratista cumpla con todas las actividades descritas en el presupuesto.

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Verificación y revisión de las cantidades ejecutadas por el contratista durante el presente periodo.
- Medición y control de las excavaciones y rellenos.
- Verificación de la correcta instalación de tubería con sus respectivos accesorios.
- Verificación de la correcta instalación de válvulas de compuerta y vericón.
- Verificación de la correcta construcción de pozos de inspección.
- Verificación de la correcta construcción de sumideros transversales.
- Verificación de la correcta instalación de la acometida de alcantarillado.

Se ha evidenciado que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que se da por de cumplimiento que las actividades ejecutadas se encuentra dentro de los estándares de calidad.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Elaboración de obra donde se registra cada una de las actividades ejecutadas. La obra se encuentra firmada por parte de la obra y la interventoría.
- Verificación de los pagos de planillas de Seguridad Social del personal de obra e interventoría.
- Disponibilidad para la atención de la comunidad ante dudas que se presenten con respecto al proyecto, siendo atendidos por los residentes de obra e interventoría.
- Se hace la revisión permanente de las actividades ejecutadas, esto se hace en conjunto con el contratista.

- Se toma registro fotográfico de avance de obra.

3.1.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- A la fecha del presente informe se ha realizado seguimiento y verificación de la correcta inversión del anticipo, se realiza proyección de acta parcial N°02 del contratista.

3.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento a la disposición final de los desechos en los lugares apropiados. Todas las labores se realizan teniendo en cuenta lo establecido en los estudios e evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

3.1.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Se verifica que el personal de obra del contratista posea los planos del proyecto.
- Se verifican luego las actividades ejecutadas en obra.
- Socialización con los trabajadores sobre la importancia de realizar un trabajo de calidad.
- Control de la disposición de residuos en la obra, observando que se encuentren en los lugares indicados.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

3.2.1. PERSONAL:

CARGO	CANTIDAD
Director De Interventoría	1
Residente De Interventoría	1
Topógrafo	1
Asesor Ambiental	1
Asesor S.S	1
PERSONAL TOTAL	5

Tabla 5: Relación del Personal de Interventoría

3.2.2. OTROS RECURSOS:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Edición De Informes	1
Equipos Oficina	1
Comunicaciones	1
Vehículo	1

Tabla 6: Relación de los Recursos de Interventoría

3.3. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DIAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	B-16002*360	31/03/2022	30/09/2022
PRESTACIONES SOCIALES		31/03/2022	31/03/2025

CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2022	31/05/2022
----------------------	------------	------------

Tabla N° 03 de Planificación.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance del contrato de obra durante el presente periodo corresponde a un porcentaje parcial del 66.89% y un porcentaje acumulado del 86.89%.
- Se realiza control y vigilancia durante los diferentes procesos constructivos de la manera se garantiza la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se efectuó el seguimiento a las actividades sociales, ambientales, recepción de uso de elementos de protección personal en el frente de obra.

5. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



JOHN


SARMIENTO

JOHN FERNANDO SARMIENTO EL-RAM

R.L. INTERING S.A.S.

INTERVENCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 107 DE 2021



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002-2022
CONTRATO DE OBRA No. 107-2021

CONTRATO No.	107-2021
FECHA DE CELEBRACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASE	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD	INVITACION PRIVADA
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. NIT No. 800.137.201-5 R.L. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.
OBJETO	"CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 23 Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TÉCNICA: SUBGERENCIA TÉCNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.
INTERVENTORIA	INTERING S.A.S.
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
ADICION	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$122.076.314,96)
VALOR TOTAL	QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)
PLAZO	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS
PRORROGA	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN No. 01	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022
REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
SUSPENSIÓN No. 02	13 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2022
REINICIO No. 02	29 DE MARZO DE 2022
TERMINACIÓN FINAL	31 DE MAYO DE 2022
VALOR A PAGAR	(\$340.074.870,26 - \$85.403.532,34)=
ACTA PARCIAL No. 002 MENOS AMORTIZACIÓN	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$254.673.237,92)
PERIODO	11 AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022 29 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2022

En el Municipio de Lebrija, el veintinueve (29) días del mes de abril en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron, YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisor administrativo y técnico

[illegible]



Entidad de Servicios Públicos Locales
Comandante en Jefe (ESPL)
M. P. 2022


designados por la ESP, LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL identificado con CC No. 13.539.772 expedida en Lebrija, en calidad de representante legal de la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S.; y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN representante legal de la INTERVENTORIA, INTERING S.A.S; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002 del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 comprendida entre el 11 al 13 de enero de 2022 y desde el 29 de marzo al 23 de abril del año 2022, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en la presente acta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe de los supervisores y del contratista y el anexo con las actividades ejecutadas en la presente acta.

Valor primera cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002	\$340.074.870,26
Menos amortización por anticipo	\$85.401.632,34
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$254.673.237,92

Se expide en Lebrija, veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.


YAMILE FÚÑEZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


M2L CONSTRUCTORES S.A.S.
R.L. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL
Representante legal
CONTRATISTA


INTERING S.A.S
R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN
Representante legal
INTERVENTORIA

RECIBIDO: 7 E N S

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002 del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021
comprendida entre el 11 al 13 de enero de 2022 y desde el 29 de marzo al 23 de abril del año 2022

DATE	TIME	LOCATION	TYPE	STATUS	REMARKS
2023-10-25	08:00	Room 101	Check-in	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-25	10:30	Room 101	Check-out	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-25	14:00	Room 102	Check-in	Success	Guest Mrs. Jones
2023-10-25	18:00	Room 102	Check-out	Success	Guest Mrs. Jones
2023-10-26	08:00	Room 101	Check-in	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-26	10:30	Room 101	Check-out	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-26	14:00	Room 102	Check-in	Success	Guest Mrs. Jones
2023-10-26	18:00	Room 102	Check-out	Success	Guest Mrs. Jones
2023-10-27	08:00	Room 101	Check-in	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-27	10:30	Room 101	Check-out	Success	Guest Mr. Smith
2023-10-27	14:00	Room 102	Check-in	Success	Guest Mrs. Jones
2023-10-27	18:00	Room 102	Check-out	Success	Guest Mrs. Jones

CORTE 2
11 AL 13 ENERO- 29
MARZO AL 23 ABRIL

100	20	4	100
100	20	4	100

20 2700 FAX: 804 683 2008 AC CREDIT ADVISORY: CALL 12 911 604 61 6486 2000410

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS
10/1/01	DEPOSIT	100.00		CHASE	
10/5/01	PAYROLL	50.00	101	CHASE	
10/10/01	RENT	25.00	102	CHASE	
10/15/01	UTILITIES	15.00	103	CHASE	
10/20/01	FOOD	10.00	104	CHASE	
10/25/01	TRANSPORT	20.00	105	CHASE	
10/30/01	SALES	75.00	106	CHASE	
11/5/01	DEPOSIT	100.00		CHASE	
11/10/01	PAYROLL	50.00	107	CHASE	
11/15/01	RENT	25.00	108	CHASE	
11/20/01	UTILITIES	15.00	109	CHASE	
11/25/01	FOOD	10.00	110	CHASE	
11/30/01	TRANSPORT	20.00	111	CHASE	
12/5/01	SALES	75.00	112	CHASE	
12/10/01	DEPOSIT	100.00		CHASE	
12/15/01	PAYROLL	50.00	113	CHASE	
12/20/01	RENT	25.00	114	CHASE	
12/25/01	UTILITIES	15.00	115	CHASE	
12/30/01	FOOD	10.00	116	CHASE	
1/5/02	TRANSPORT	20.00	117	CHASE	
1/10/02	SALES	75.00	118	CHASE	
1/15/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
1/20/02	PAYROLL	50.00	119	CHASE	
1/25/02	RENT	25.00	120	CHASE	
1/30/02	UTILITIES	15.00	121	CHASE	
2/5/02	FOOD	10.00	122	CHASE	
2/10/02	TRANSPORT	20.00	123	CHASE	
2/15/02	SALES	75.00	124	CHASE	
2/20/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
2/25/02	PAYROLL	50.00	125	CHASE	
2/28/02	RENT	25.00	126	CHASE	
3/5/02	UTILITIES	15.00	127	CHASE	
3/10/02	FOOD	10.00	128	CHASE	
3/15/02	TRANSPORT	20.00	129	CHASE	
3/20/02	SALES	75.00	130	CHASE	
3/25/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
3/30/02	PAYROLL	50.00	131	CHASE	
4/5/02	RENT	25.00	132	CHASE	
4/10/02	UTILITIES	15.00	133	CHASE	
4/15/02	FOOD	10.00	134	CHASE	
4/20/02	TRANSPORT	20.00	135	CHASE	
4/25/02	SALES	75.00	136	CHASE	
4/30/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
5/5/02	PAYROLL	50.00	137	CHASE	
5/10/02	RENT	25.00	138	CHASE	
5/15/02	UTILITIES	15.00	139	CHASE	
5/20/02	FOOD	10.00	140	CHASE	
5/25/02	TRANSPORT	20.00	141	CHASE	
5/30/02	SALES	75.00	142	CHASE	
6/5/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
6/10/02	PAYROLL	50.00	143	CHASE	
6/15/02	RENT	25.00	144	CHASE	
6/20/02	UTILITIES	15.00	145	CHASE	
6/25/02	FOOD	10.00	146	CHASE	
6/30/02	TRANSPORT	20.00	147	CHASE	
7/5/02	SALES	75.00	148	CHASE	
7/10/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
7/15/02	PAYROLL	50.00	149	CHASE	
7/20/02	RENT	25.00	150	CHASE	
7/25/02	UTILITIES	15.00	151	CHASE	
7/30/02	FOOD	10.00	152	CHASE	
8/5/02	TRANSPORT	20.00	153	CHASE	
8/10/02	SALES	75.00	154	CHASE	
8/15/02	DEPOSIT	100.00		CHASE	
8/20/02	PAYROLL	50.00	155	CHASE	
8/25/02	RENT	25.00	156	CHASE	
8/30/02	UTILITIES	15.00	157	CHASE	
9/5/02	FOOD	10.00			

[illegible]

600 P.M.H.C.	3,00	Local cal'dn, Mendelsohn, Vegetation Cycle of 2014	—	—
PRINCE JED	1.0	PRINCE JED	—	—

[illegible][illegible]

מחיר: 100 ש"ח

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

$\vdots$

	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

COMPANIES:

Handwritten signature

 1. $\frac{1}{2} \text{ cup} = 8 \text{ ounces}$

[illegible]

...
H01116607 C4V1 RZPL
R0998H0Y1310

CONTINUED

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LOCALIZATION	14CHD	:SHALFUD	41°0
CITY NAME			

Case	Age	Sex	Site	Pathologic	Survival
1	60	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 years
2	65	F	Rectum	Adenocarcinoma	12 years
3	70	M	Rectum	Adenocarcinoma	15 years
4	75	F	Rectum	Adenocarcinoma	18 years
5	80	M	Rectum	Adenocarcinoma	20 years
6	85	F	Rectum	Adenocarcinoma	22 years
7	90	M	Rectum	Adenocarcinoma	25 years
8	95	F	Rectum	Adenocarcinoma	28 years
9	100	M	Rectum	Adenocarcinoma	30 years
10	105	F	Rectum	Adenocarcinoma	32 years

[illegible]

Flow, m ³ /s	Q ₂	Q ₁
0.0	0.0	0.0
0.1	0.1	0.1
0.2	0.2	0.2
0.3	0.3	0.3
0.4	0.4	0.4
0.5	0.5	0.5
0.6	0.6	0.6
0.7	0.7	0.7
0.8	0.8	0.8
0.9	0.9	0.9
1.0	1.0	1.0
1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9
2.0	2.0	2.0
2.1	2.1	2.1
2.2	2.2	2.2
2.3	2.3	2.3
2.4	2.4	2.4
2.5	2.5	2.5
2.6	2.6	2.6
2.7	2.7	2.7
2.8	2.8	2.8
2.9	2.9	2.9
3.0	3.0	3.0
3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2
3.3	3.3	3.3
3.4	3.4	3.4
3.5	3.5	3.5
3.6	3.6	3.6
3.7	3.7	3.7
3.8	3.8	3.8
3.9	3.9	3.9
4.0	4.0	4.0
4.1	4.1	4.1
4.2	4.2	4.2
4.3	4.3	4.3
4.4	4.4	4.4
4.5	4.5	4.5
4.6	4.6	4.6
4.7	4.7	4.7
4.8	4.8	4.8
4.9	4.9	4.9
5.0	5.0	5.0
5.1	5.1	5.1
5.2	5.2	5.2
5.3	5.3	5.3
5.4	5.4	5.4
5.5	5.5	5.5
5.6	5.6	5.6
5.7	5.7	5.7
5.8	5.8	5.8
5.9	5.9	5.9
6.0	6.0	6.0
6.1	6.1	6.1
6.2	6.2	6.2
6.3	6.3	6.3
6.4	6.4	6.4
6.5	6.5	6.5
6.6	6.6	6.6
6.7	6.7	6.7
6.8	6.8	6.8
6.9	6.9	6.9
7.0	7.0	7.0
7.1	7.1	7.1
7.2	7.2	7.2
7.3	7.3	7.3
7.4	7.4	7.4
7.5	7.5	7.5
7.6	7.6	7.6
7.7	7.7	7.7
7.8	7.8	7.8
7.9	7.9	7.9
8.0	8.0	8.0
8.1	8.1	8.1
8.2	8.2	8.2
8.3	8.3	8.3
8.4	8.4	8.4
8.5	8.5	8.5
8.6	8.6	8.6
8.7	8.7	8.7
8.8	8.8	8.8
8.9	8.9	8.9
9.0	9.0	9.0
9.1	9.1	9.1
9.2	9.2	9.2
9.3	9.3	9.3
9.4	9.4	9.4
9.5	9.5	9.5
9.6	9.6	9.6
9.7	9.7	9.7
9.8	9.8	9.8
9.9	9.9	9.9
10.0	10.0	10.0

100

[illegible]

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

—

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

β	β
17.01	17.01
17.02	17.02
17.03	17.03
17.04	17.04
17.05	17.05
17.06	17.06
17.07	17.07
17.08	17.08
17.09	17.09
17.10	17.10
17.11	17.11
17.12	17.12
17.13	17.13
17.14	17.14
17.15	17.15
17.16	17.16
17.17	17.17
17.18	17.18
17.19	17.19
17.20	17.20
17.21	17.21
17.22	17.22
17.23	17.23
17.24	17.24
17.25	17.25
17.26	17.26
17.27	17.27
17.28	17.28
17.29	17.29
17.30	17.30
17.31	17.31
17.32	17.32
17.33	17.33
17.34	17.34
17.35	17.35
17.36	17.36
17.37	17.37
17.38	17.38
17.39	17.39
17.40	17.40
17.41	17.41
17.42	17.42
17.43	17.43
17.44	17.44
17.45	17.45
17.46	17.46
17.47	17.47
17.48	17.48
17.49	17.49
17.50	17.50
17.51	17.51
17.52	17.52
17.53	17.53
17.54	17.54
17.55	17.55
17.56	17.56
17.57	17.57
17.58	17.58
17.59	17.59
17.60	17.60
17.61	17.61
17.62	17.62
17.63	17.63
17.64	17.64
17.65	17.65
17.66	17.66
17.67	17.67
17.68	17.68
17.69	17.69
17.70	17.70
17.71	17.71
17.72	17.72
17.73	17.73
17.74	17.74
17.75	17.75
17.76	17.76
17.77	17.77
17.78	17.78
17.79	17.79
17.80	17.80
17.81	17.81
17.82	17.82
17.83	17.83
17.84	17.84
17.85	17.85
17.86	17.86
17.87	17.87
17.88	17.88
17.89	17.89
17.90	17.90
17.91	17.91
17.92	17.92
17.93	17.93
17.94	17.94
17.95	17.95
17.96	17.96
17.97	17.97
17.98	17.98
17.99	17.99
18.00	18.00

$$||\psi_m||_{L^{\infty}(\Omega)} \leq C \|N\|_{C^0(\overline{\Omega})}$$

AYKAPIL OLUMLU BİYOL. SİTİLLERİNE

[illegible]

— Onze heer in den nacht.

























































































































































































































22 NOV 1963
 11:53 LOCAL TIME
 11:53 LOCAL TIME
 11:53 LOCAL TIME

Q1N31W342 25 MICR

**WORLDWIDE
SOLUTIONS**

100111-2-CTN570AANU|CPO2-PT-0-00...8

[illegible]

2

Copy No.	2
----------	---

[illegible]

СЕНТЕНА ГОМО.

REF ID: A66551

3

for D35, I received from the P.A. 1000000

Year	QYD
------	-----

Page 10

WILLIAM A. WILSON

— — — — —

1. **Introduction**

101

100	100
-----	-----

1

--	--



APPENDIX

1570 -

1.500

[illegible]

2014年 5月 26日 星期三
 2014年 5月 26日 星期三
 2014年 5月 26日 星期三

TO: JAMES EARL RAY, JR., GENERAL
IN: COUNCIL OF THE CITY OF
MEMPHIS, TENNESSEE

[illegible]

[illegible][illegible]

CALLE 12-20		CALLE 12-20		CALLE 12-20		CALLE 12-20		CALLE 12-20	
AREA	LONGITUD	ANCHO	PERIMETRO	AREA	LONGITUD	ANCHO	PERIMETRO	AREA	LONGITUD
CALLE 12-20 (12-20)									
1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00
3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00
5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00
6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00
7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00
8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00
9.00	90.00	9.00	90.00	9.00	90.00	9.00	90.00	9.00	90.00
10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
11.00	110.00	11.00	110.00	11.00	110.00	11.00	110.00	11.00	110.00
12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00
13.00	130.00	13.00	130.00	13.00	130.00	13.00	130.00	13.00	130.00
14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00
15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00
16.00	160.00	16.00	160.00	16.00	160.00	16.00	160.00	16.00	160.00
17.00	170.00	17.00	170.00	17.00	170.00	17.00	170.00	17.00	170.00
18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00
19.00	190.00	19.00	190.00	19.00	190.00	19.00	190.00	19.00	190.00
20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00
21.00	210.00	21.00	210.00	21.00	210.00	21.00	210.00	21.00	210.00
22.00	220.00	22.00	220.00	22.00	220.00	22.00	220.00	22.00	220.00
23.00	230.00	23.00	230.00	23.00	230.00	23.00	230.00	23.00	230.00
24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00
25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00
26.00	260.00	26.00	260.00	26.00	260.00	26.00	260.00	26.00	260.00
27.00	270.00	27.00	270.00	27.00	270.00	27.00	270.00	27.00	270.00
28.00	280.00	28.00	280.00	28.00	280.00	28.00	280.00	28.00	280.00
29.00	290.00	29.00	290.00	29.00	290.00	29.00	290.00	29.00	290.00
30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00
31.00	310.00	31.00	310.00	31.00	310.00	31.00	310.00	31.00	310.00
32.00	320.00	32.00	320.00	32.00	320.00	32.00	320.00	32.00	320.00
33.00	330.00								

[illegible]

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1969

INFORMACIÓN DE CALIDAD

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382. ☐ 383. ☐ 384. ☐ 385. ☐ 386. ☐ 387. ☐ 388. ☐ 389. ☐ 390. ☐ 391. ☐ 392. ☐ 393. ☐ 394. ☐ 395. ☐ 396. ☐ 397. ☐ 398. ☐ 399. ☐ 400. ☐ 401. ☐ 402. ☐ 403. ☐ 404. ☐ 405. ☐ 406. ☐ 407. ☐ 408. ☐ 409. ☐ 410. ☐ 411. ☐ 412. ☐ 413. ☐ 414. ☐ 415. ☐ 416. ☐ 417. ☐ 418. ☐ 419. ☐ 420. ☐ 421. ☐ 422. ☐ 423. ☐ 424. ☐ 425. ☐ 426. ☐ 427. ☐ 428. ☐ 429. ☐ 430. ☐ 431. ☐ 432. ☐ 433. ☐ 434. ☐ 435. ☐ 436. ☐ 437. ☐ 438. ☐ 439. ☐ 440. ☐ 441. ☐ 442. ☐ 443. ☐ 444. ☐ 445. ☐ 446. ☐ 447. ☐ 448. ☐ 449. ☐ 450. ☐ 451. ☐ 452. ☐ 453. ☐ 454. ☐ 455. ☐ 456. ☐ 457. ☐ 458. ☐ 459. ☐ 460. ☐ 461. ☐ 462. ☐ 463. ☐ 464. ☐ 465. ☐ 466. ☐ 467. ☐ 468. ☐ 469. ☐ 470. ☐ 471. ☐ 472. ☐ 473. ☐ 474. ☐ 475. ☐ 476. ☐ 477. ☐ 478. ☐ 479. ☐ 480. ☐ 481. ☐ 482. ☐ 483. ☐ 484. ☐ 485. ☐ 486. ☐ 487. ☐ 488. ☐ 489. ☐ 490. ☐ 491. ☐ 492. ☐ 493. ☐ 494. ☐ 495. ☐ 496. ☐ 497. ☐ 498. ☐ 499. ☐ 500. ☐ 501. ☐ 502. ☐ 503. ☐ 504. ☐ 505. ☐ 506. ☐ 507. ☐ 508. ☐ 509. ☐ 510. ☐ 511. ☐ 512. ☐ 513. ☐ 514. ☐ 515. ☐ 516. ☐ 517. ☐ 518. ☐ 519. ☐ 520. ☐ 521. ☐ 522. ☐ 523. ☐ 524. ☐ 525. ☐ 526. ☐ 527. ☐ 528. ☐ 529. ☐ 530. ☐ 531. ☐ 532. ☐ 533. ☐ 534. ☐ 535. ☐ 536. ☐ 537. ☐ 538. ☐ 539. ☐ 540. ☐ 541. ☐ 542. ☐ 543. ☐ 544. ☐ 545. ☐ 546. ☐ 547. ☐ 548. ☐ 549. ☐ 550. ☐ 551. ☐ 552. ☐ 553. ☐ 554. ☐ 555. ☐ 556. ☐ 557. ☐ 558. ☐ 559. ☐ 560. ☐ 561. ☐ 562. ☐ 563. ☐ 564. ☐ 565. ☐ 566. ☐ 567. ☐ 568. ☐ 569. ☐ 570. ☐ 571. ☐ 572. ☐ 573. ☐ 574. ☐ 575. ☐ 576. ☐ 577. ☐ 578. ☐ 579. ☐ 580. ☐ 581. ☐ 582. ☐ 583. ☐ 584. ☐ 585. ☐ 586. ☐ 587. ☐ 588. ☐ 589. ☐ 590. ☐ 591. ☐ 592. ☐ 593. ☐ 594. ☐ 595. ☐ 596. ☐ 597. ☐ 598. ☐ 599. ☐ 600. ☐ 601. ☐ 602. ☐ 603. ☐ 604. ☐ 605. ☐ 606. ☐ 607. ☐ 608. ☐ 609. ☐ 610. ☐ 611. ☐ 612. ☐ 613. ☐ 614. ☐ 615. ☐ 616. ☐ 617. ☐ 618. ☐ 619. ☐ 620. ☐ 621. ☐ 622. ☐ 623. ☐ 624. ☐ 625. ☐ 626. ☐ 627. ☐ 628. ☐ 629. ☐ 630. ☐ 631. ☐ 632. ☐ 633. ☐ 634. ☐ 635. ☐ 636. ☐ 637. ☐ 638. ☐ 639. ☐ 640. ☐ 641. ☐ 642. ☐ 643. ☐ 644. ☐ 645. ☐ 646. ☐ 647. ☐ 648. ☐ 649. ☐ 650. ☐ 651. ☐ 652. ☐ 653. ☐ 654. ☐ 655. ☐ 656. ☐ 657. ☐ 658. ☐ 659. ☐ 660. ☐ 661. ☐ 662. ☐ 663. ☐ 664. ☐ 665. ☐ 666. ☐ 667. ☐ 668. ☐ 669. ☐ 670. ☐ 671. ☐ 672. ☐ 673. ☐ 674. ☐ 675. ☐ 676. ☐ 677. ☐ 678. ☐ 679. ☐ 680. ☐ 681. ☐ 682. ☐ 683. ☐ 684. ☐ 685. ☐ 686. ☐ 687. ☐ 688. ☐ 689. ☐ 690. ☐ 691. ☐ 692. ☐ 693. ☐ 694. ☐ 695. ☐ 696. ☐ 697. ☐ 698. ☐ 699. ☐ 700. ☐ 701. ☐ 702. ☐ 703. ☐ 704. ☐ 705. ☐ 706. ☐ 707. ☐ 708. ☐ 709. ☐ 710. ☐ 711. ☐ 712. ☐ 713. ☐ 714. ☐ 715. ☐ 716. ☐ 717. ☐ 718. ☐ 719. ☐ 720. ☐ 721. ☐ 722. ☐ 723. ☐ 724. ☐ 725. ☐ 726. ☐ 727. ☐ 728. ☐ 729. ☐ 730. ☐ 731. ☐ 732. ☐ 733. ☐ 734. ☐ 735. ☐ 736. ☐ 737. ☐ 738. ☐ 739. ☐ 740. ☐ 741. ☐ 742. ☐ 743. ☐ 744. ☐ 745. ☐ 746. ☐ 747. ☐ 748. ☐ 749. ☐ 750. ☐ 751. ☐ 752. ☐ 753. ☐ 754. ☐ 755. ☐ 756. ☐ 757. ☐ 758. ☐ 759. ☐ 760. ☐ 761. ☐ 762. ☐ 763. ☐ 764. ☐ 765. ☐ 766. ☐ 767. ☐ 768. ☐ 769. ☐ 770. ☐ 771. ☐ 772. ☐ 773. ☐ 774. ☐ 775. ☐ 776. ☐ 777. ☐ 778. ☐ 779. ☐ 780. ☐ 781. ☐ 782. ☐ 783. ☐ 784. ☐ 785. ☐ 786. ☐ 787. ☐ 788. ☐ 789. ☐ 790. ☐ 791. ☐ 792. ☐ 793. ☐ 794. ☐ 795. ☐ 796. ☐ 797. ☐ 798. ☐ 799. ☐ 800. ☐ 801. ☐ 802. ☐ 803. ☐ 804. ☐ 805. ☐ 806. ☐ 807. ☐ 808. ☐ 809. ☐ 810. ☐ 811. ☐ 812. ☐ 813. ☐ 814. ☐ 815. ☐ 816. ☐ 817. ☐ 818. ☐ 819. ☐ 820. ☐ 821. ☐ 822. ☐ 823. ☐ 824. ☐ 825. ☐ 826. ☐ 827. ☐ 828. ☐ 829. ☐ 830. ☐ 831. ☐ 832. ☐ 833. ☐ 834. ☐ 835. ☐ 836. ☐ 837. ☐ 838. ☐ 839. ☐ 840. ☐ 841. ☐ 842. ☐ 843. ☐ 844. ☐ 845. ☐ 846. ☐ 847. ☐ 848. ☐ 849. ☐ 850. ☐ 851. ☐ 852. ☐ 853. ☐ 854. ☐ 855. ☐ 856. ☐ 857. ☐ 858. ☐ 859. ☐ 860. ☐ 861. ☐ 862. ☐ 863. ☐ 864. ☐ 865. ☐ 866. ☐ 867. ☐ 868. ☐ 869. ☐ 870. ☐ 871. ☐ 872. ☐ 873. ☐ 874. ☐ 875. ☐ 876. ☐ 877. ☐ 878. ☐ 879. ☐ 880. ☐ 881. ☐ 882. ☐ 883. ☐ 884. ☐ 885. ☐ 886. ☐ 887. ☐ 888. ☐ 889. ☐ 890. ☐ 891. ☐ 892. ☐ 893. ☐ 894. ☐ 895. ☐ 896. ☐ 897. ☐ 898. ☐ 899. ☐ 900. ☐ 901. ☐ 902. ☐ 903. ☐ 904. ☐ 905. ☐ 906. ☐ 907. ☐ 908. ☐ 909. ☐ 910. ☐ 911. ☐ 912. ☐ 913. ☐ 914. ☐ 915. ☐ 916. ☐ 917. ☐ 918. ☐ 919. ☐ 920. ☐ 921. ☐ 922. ☐ 923. ☐ 924. ☐ 925. ☐ 926. ☐ 927. ☐ 928. ☐ 929. ☐ 930. ☐ 931. ☐ 932. ☐ 933. ☐ 934. ☐ 935. ☐ 936. ☐ 937. ☐ 938. ☐ 939. ☐ 940. ☐ 941. ☐ 942. ☐ 943. ☐ 944. ☐ 945. ☐ 946. ☐ 947. ☐ 948. ☐ 949. ☐ 950. ☐ 951. ☐ 952. ☐ 953. ☐ 954. ☐ 955. ☐ 956. ☐ 957. ☐ 958. ☐ 959. ☐ 960. ☐ 961. ☐ 962. ☐ 963. ☐ 964. ☐ 965. ☐ 966. ☐ 967. ☐ 968. ☐ 969. ☐ 970. ☐ 971. ☐ 972. ☐ 973. ☐ 974. ☐ 975. ☐ 976. ☐ 977. ☐ 978. ☐ 979. ☐ 980. ☐ 981. ☐ 982. ☐ 983. ☐ 984. ☐ 985. ☐ 986. ☐ 987. ☐ 988. ☐ 989. ☐ 990. ☐ 991. ☐ 992. ☐ 993. ☐ 994. ☐ 995. ☐ 996. ☐ 997. ☐ 998. ☐ 999. ☐ 1000. ☐ 1001. ☐ 1002. ☐ 1003. ☐ 1004. ☐ 1005. ☐ 1006. ☐ 1007. ☐ 1008. ☐ 1009. ☐ 1010. ☐ 1011. ☐ 1012. ☐ 1013. ☐ 1014. ☐ 1015. ☐ 1016. ☐ 1017. ☐ 1018. ☐ 1019. ☐ 1020. ☐ 1021. ☐ 1022. ☐ 1023. ☐ 1024. ☐ 1025. ☐ 1026. ☐ 1027. ☐ 1028. ☐ 1029. ☐ 1030. ☐ 1031. ☐ 1032. ☐ 1033. ☐ 1034. ☐ 1035. ☐ 1036. ☐ 1037. ☐ 1038. ☐ 1039. ☐ 1040. ☐ 1041. ☐ 1042. ☐ 1043. ☐ 1044. ☐ 1045. ☐ 1046. ☐ 1047. ☐ 1048. ☐ 1049. ☐ 1050. ☐ 1051. ☐ 1052. ☐ 1053. ☐ 1054. ☐ 1055. ☐ 1056. ☐ 1057. ☐ 1058. ☐ 1059. ☐ 1060. ☐ 1061. ☐ 1062. ☐ 1063. ☐ 1064. ☐ 1065. ☐ 1066. ☐ 1067. ☐ 1068. ☐ 1069. ☐ 1070. ☐ 1071. ☐ 1072. ☐ 1073. ☐ 1074. ☐ 1075. ☐ 1076. ☐ 1077. ☐ 1078. ☐ 1079. ☐ 1080. ☐ 1081. ☐ 1082. ☐ 1083. ☐ 1084. ☐ 1085. ☐ 1086. ☐ 1087. ☐ 1088. ☐ 1089. ☐ 1090. ☐ 1091. ☐ 1092. ☐ 1093. ☐ 1094. ☐ 1095. ☐ 1096. ☐ 1097. ☐ 1098. ☐ 1099. ☐ 1100. ☐ 1101. ☐ 1102. ☐ 1103. ☐ 1104. ☐ 1105. ☐ 1106. ☐ 1107. ☐ 1108. ☐ 1109. ☐ 1110. ☐ 1111. ☐ 1112. ☐ 1113. ☐ 1114. ☐ 1115. ☐ 1116. ☐ 1117. ☐ 1118. ☐ 1119.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación cerramiento en tela verde



instalación cerramiento en tela verde



Localización Y Replanteo



Desinstalación Tubería Existente



Desinstalación Tubería Existente



Excavaciones En Material Común



Refracto En Material Común



Releno En Material Común



Releño En Material Seleccionado



Releño En Material Seleccionado



Releño En Arena Para Cimentación De Tubería



Atraca En Concreto De 3,000 Para Tubería



Atraca En Concreto De 3,000 Para Tubería



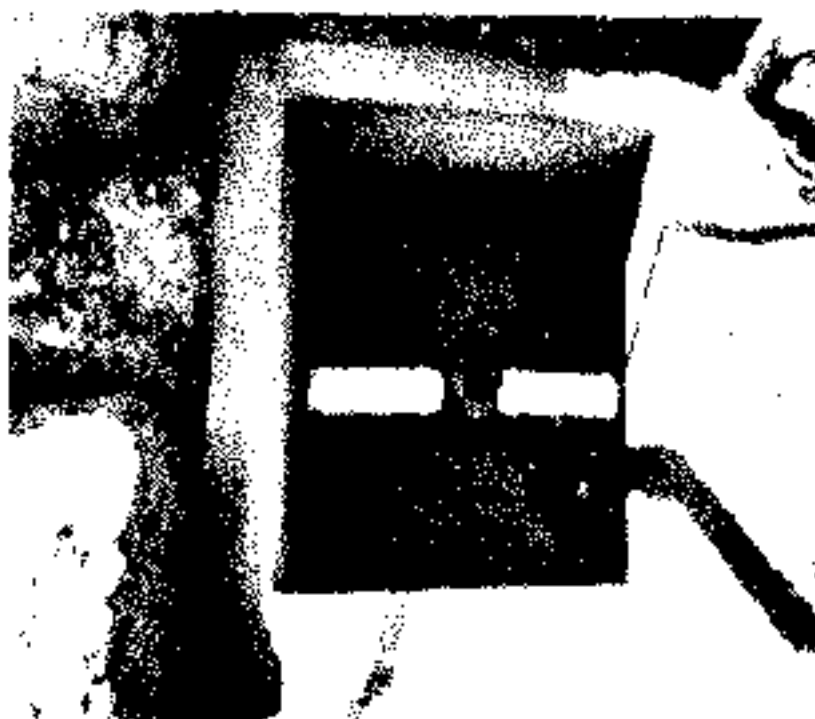
Instalación Tubería PVC RDE-21 De 3"



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 2"



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 2"



Instalación Válvula De Compuerta De Cierre 3" 300 Psi



Instalación Válvula De Compuerta De Cierre 2" 300 Psi



Instalación Válvula Ventosa 1" 300 psi



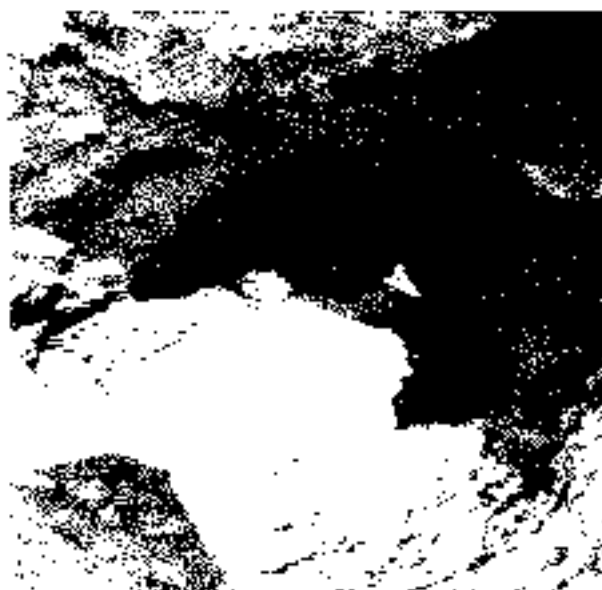
Instalación Válvula Ventosa 1" 300 psi



Instalación TEE Hierro Dúctil de 3"



Instalación TEE Hierro Dúctil de 2"



Instalación Codo 90° Hierro Dúctil 2"



Instalación Codo 45° Hierro Dúctil 2"



Excavación En Material Común



Excavación En Material Común



Relleño En Material Común



Releño En Material Común



Releño Seleccionado



Releño En Arena Para Cimentación De Tubería



Instalación de tubería sanitaria 10"



Acometida a cantarillado



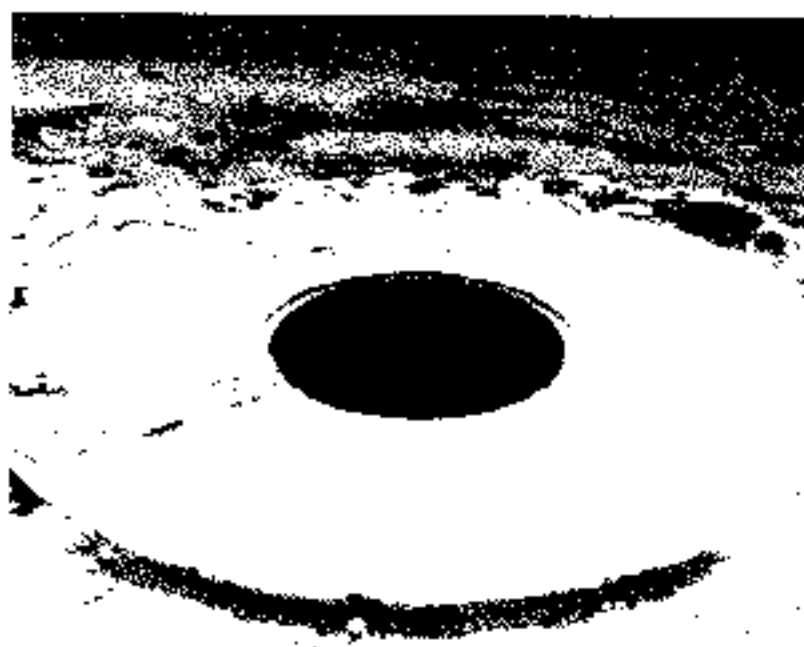
Sumidero Transversal



Construcción Pozo De Inspección



Mejoramiento De Pozos Existentes



Mejoramiento Da Pozos Existentes



Demolición para conexión pozo existente



Embone para conexión pozo existente



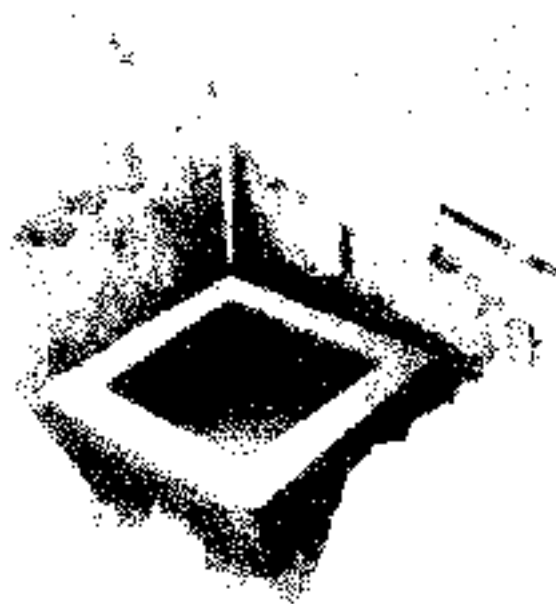
Construcción Pozos de inspección Ø=1,20m H=(2,0-5,0)m



Instalación SILLA YEE 6"X10" PVC



Instalación SILLA YEE 6"X18" PVC



Construcción CAJA DE INSPECCIÓN 0.50X0.60



Construcción CAJA DE INSPECCIÓN 0.50X0.50
