




INGENIERÍA FUTURA S.A.S.
CALLE 14 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA

ITEM 4.03: Pozo de Inspección $D=1,20m$ de H (1 mts a 2 mts): Se ejecutó la realización de pozo de Inspección P (7-13) R2 $D=1,20m$ de H (1 mts a 2 mts) para aguas sanitarias.

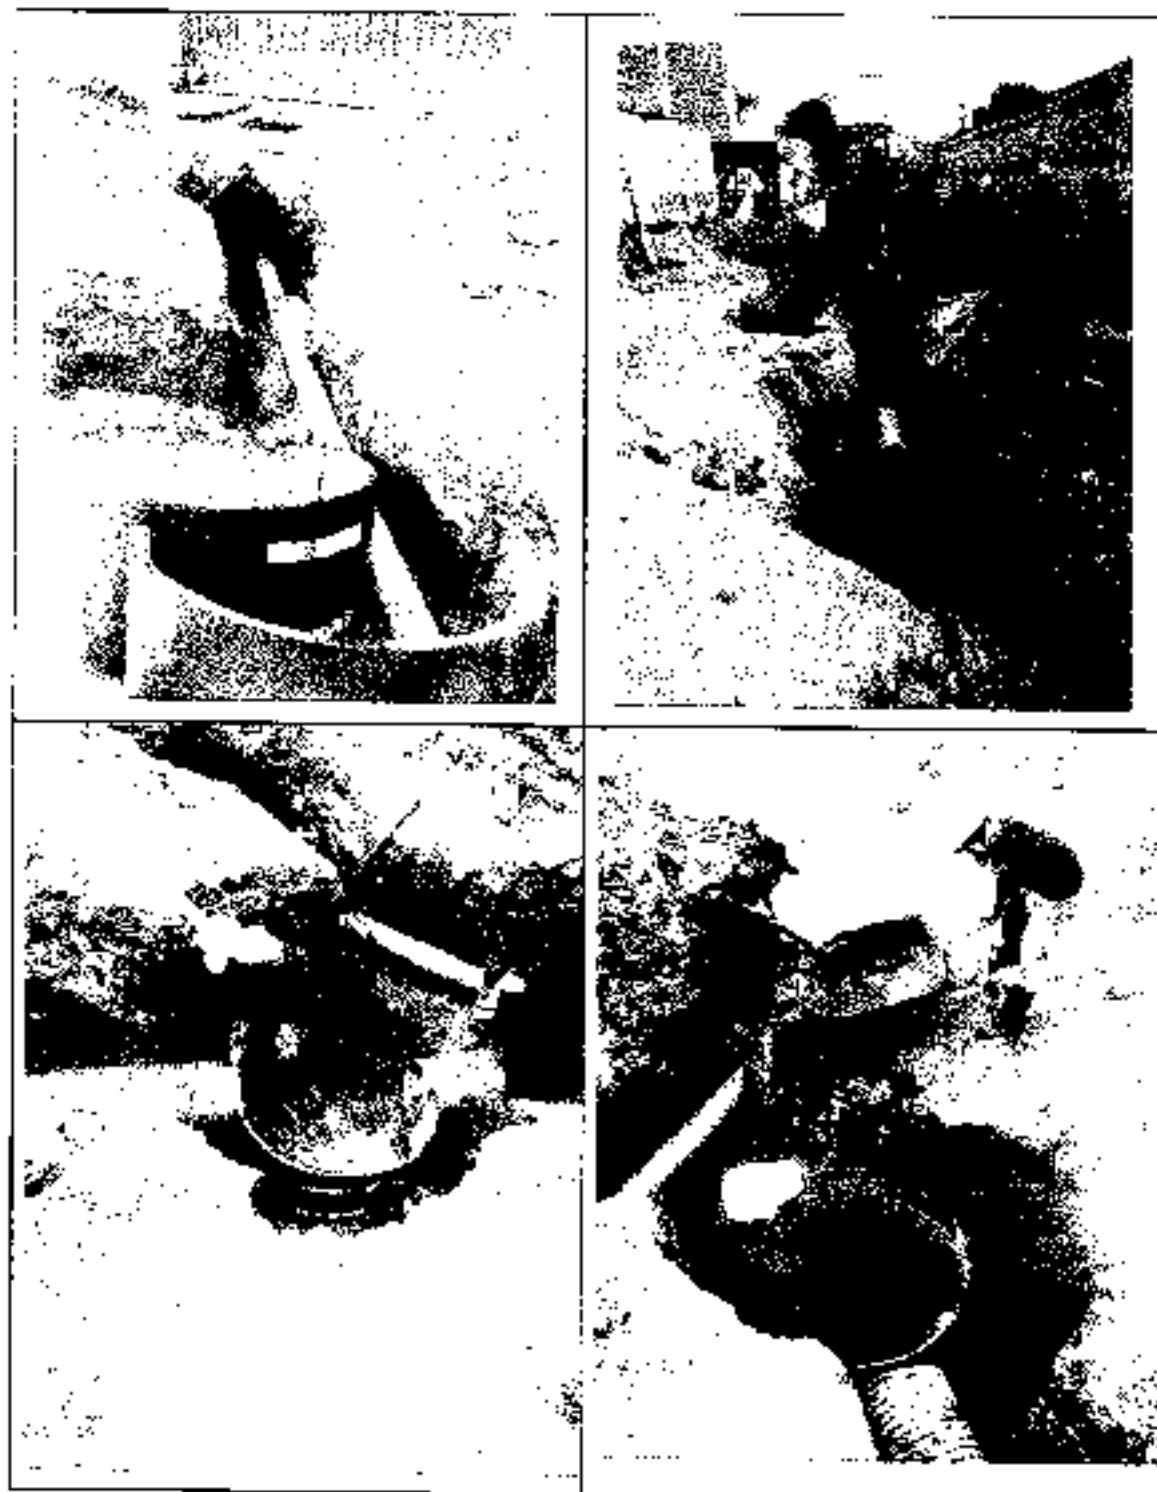

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistasas@gmail.com




INGENIERIA
FUTURISTAS



CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistas@gmail.com



INGENIERÍA FUTURISTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA

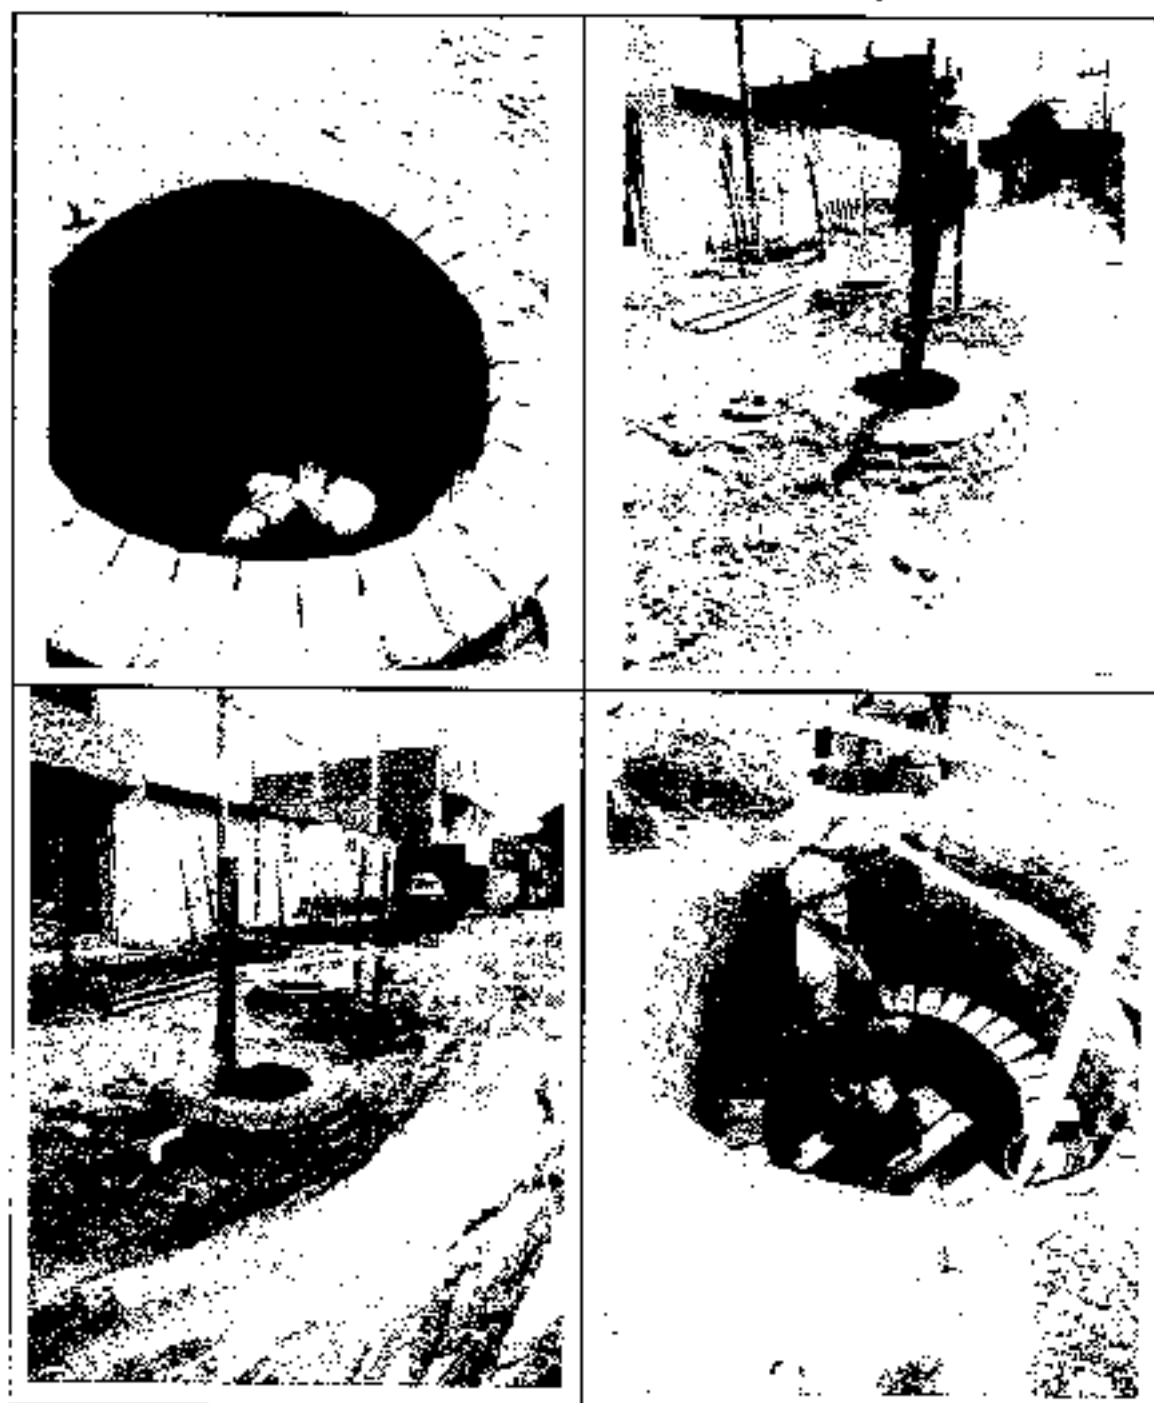

Fuente: Autor


CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistasas@gmail.com



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

1.4.2 Retrasos de obra

Debido a las fuertes lluvias de la última semana de diciembre se generaron retrasos en la ejecución de la obra.

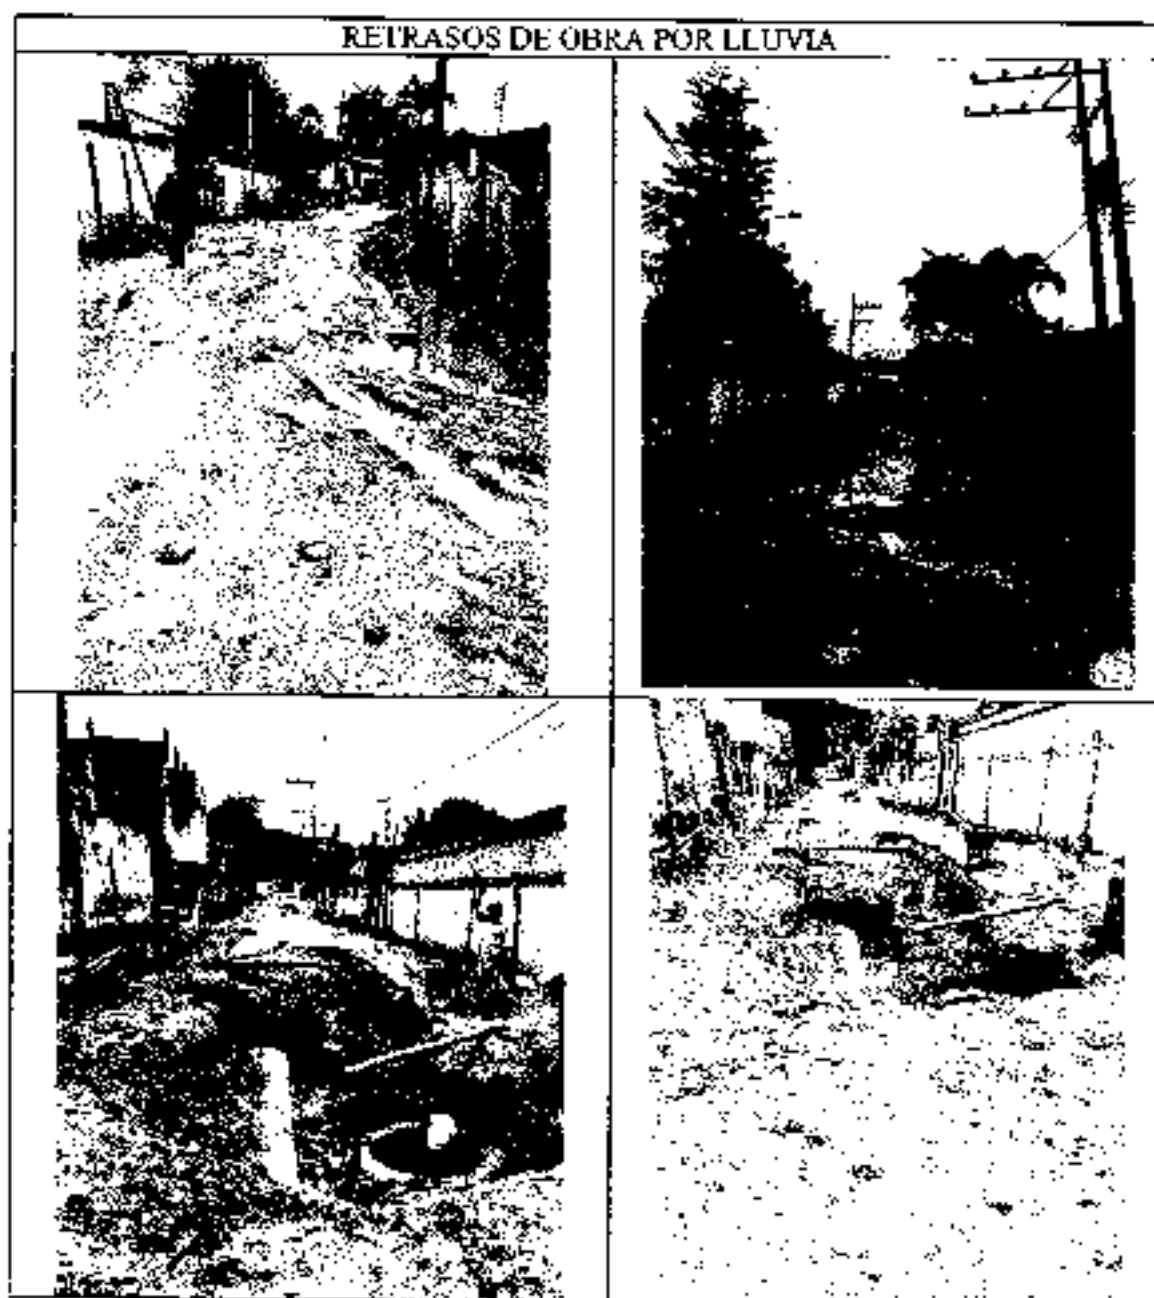

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistasas@gmail.com





Plan de saneamiento ambiental
del municipio de Bucaramanga
2012-2015



CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenierlafuturistas@gmail.com




INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.
CALLE 14 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA

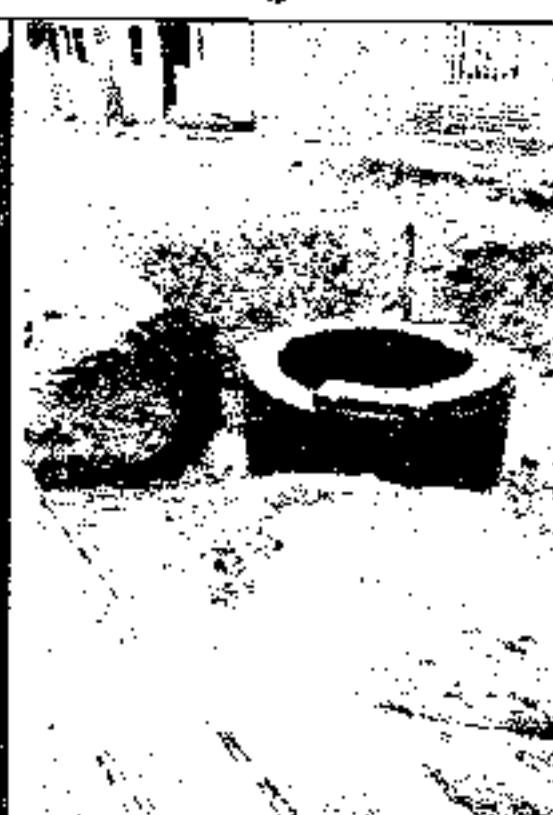

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistasas@gmail.com



INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.
CALLE 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA

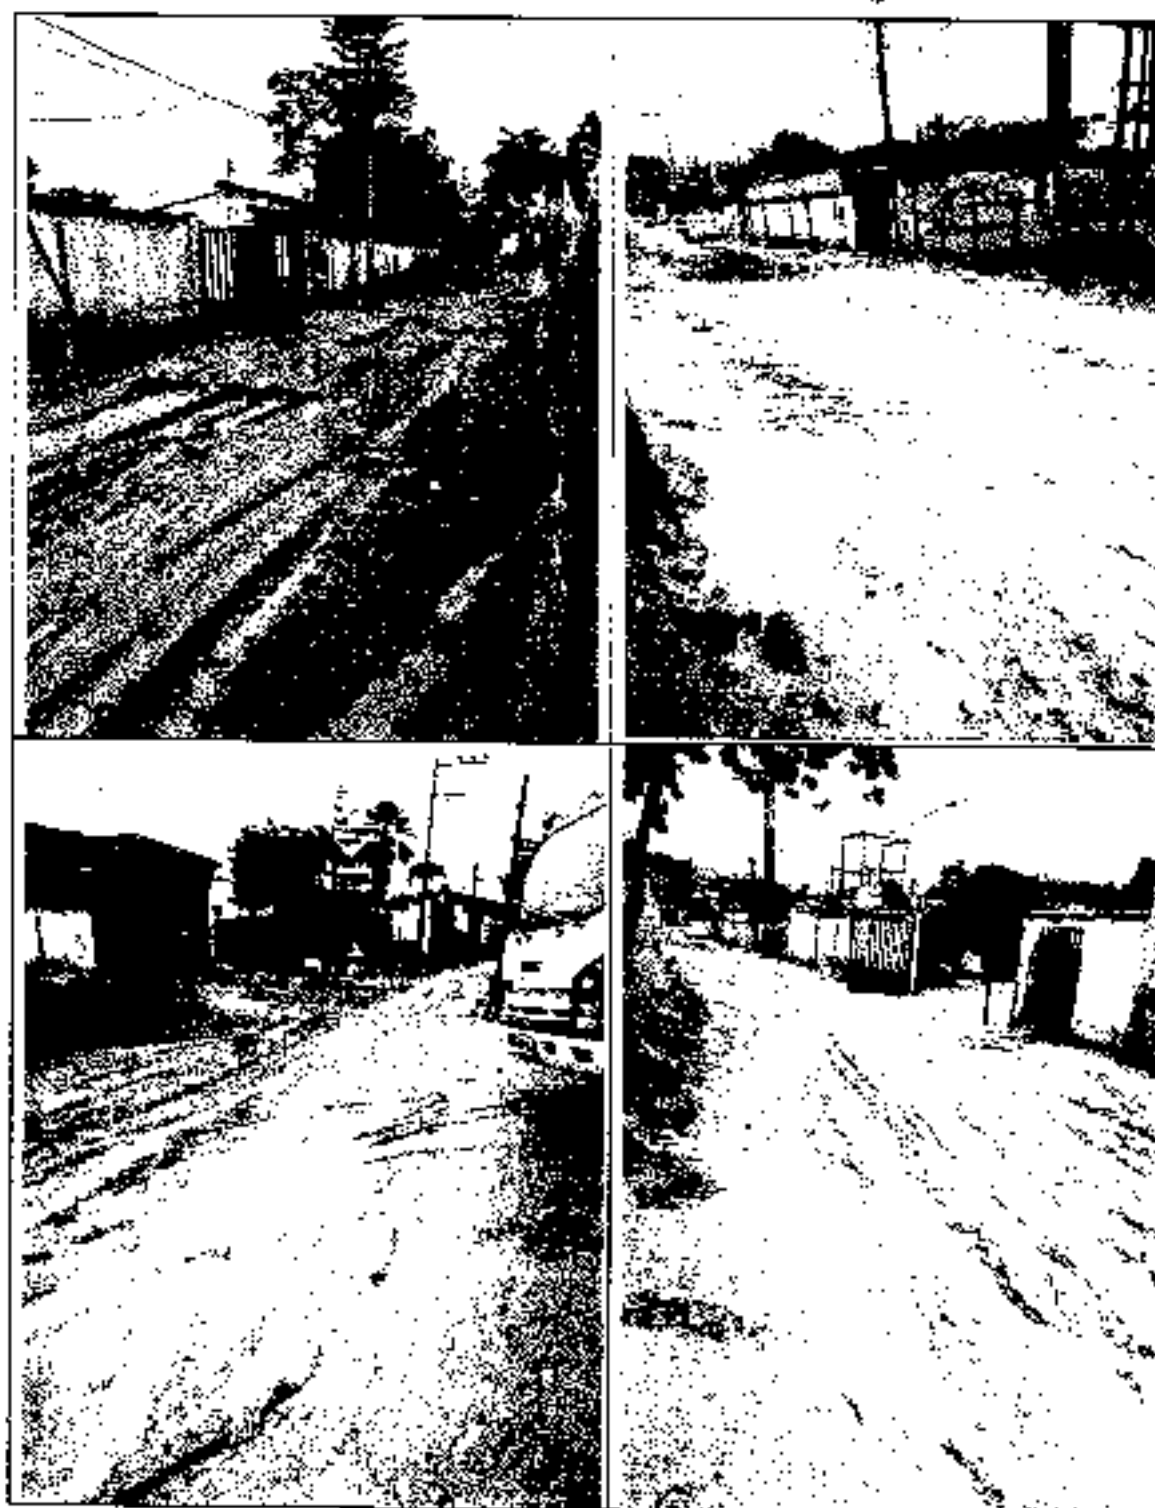

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistasas@gmail.com



INGENIERIA FUTURISTAS
CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA



CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
Ingenieriafuturistas@gmail.com



INGENIERIA FUTURISTAS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2017



CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistas@gmail.com



Escuela Superior de Planificación y Lenguaje
Carrera 18 # 14-26 San Francisco
Bucaramanga



Fuente: Autor

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenierlafuturistasas@gmail.com



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA

1.4.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para el presente contrato llevar la Bitácora de obra a cargo del Ingeniero Residente, hacer el seguimiento a la programación de la obra, tramitar los permisos que requiera el proyecto, afiliar al personal de la obra a los sistemas de seguridad social, mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad, actualizar las pólizas, llevar una carpeta del contrato donde se deben archivar todos los documentos referentes al contrato.

Dotación: Cada trabajador recibió los siguientes elementos de protección personal:

- Un par de guantes
- Gafas de seguridad
- Un tapabocas
- Camisa manga larga
- Botas de seguridad
- Elementos de Bioseguridad, como Amonio cuaternario de quinta generación.

Pensión: Se utilizaron las siguientes entidades para cotizar los aportes a Pensión: PORVENIR.

ARL – Riesgos Laborales: La entidad escogida por el Contratista para la prestación de los Riesgos Profesionales de los trabajadores fue SURA.

Para la ejecución del contrato se realizaron los trabajos con la siguiente planta de personal:

Nombre		Cargo		Novedad			
Roberto Enrique Rodríguez Ruiz		Director de obra		-			
Jesús Pedro Nel Serrano Meneses		Residente de obra		-			

		REPORTE DE PERSONAL			Código: 90-957-001		
		Reporte de personal fijo y de educación la cual asuma entre otras:			Institución:		
		La cantidad de trabajadores urbanos en el municipio de obra			FECHA: DICIEMBRE DEL 2021		
		Unidad:					
NÚMERO	IDENTIFICACIÓN PERSONAL	NÚMERO DE CÉPULA	ESTADO ACTUAL	SEXO	EDAD	EDUCACIÓN	CEPULAS
1	Luis Eduardo Ruiz Romero	90.461.619	ACTIVO	MALE	37 años	ACADEMIA	2195178559
2	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214
3	Luis Eduardo Ruiz Romero	90.461.619	ACTIVO	MALE	37 años	ACADEMIA	2195178559
4	José de Jesús Rojas Ramírez	1.025.852.045	ACTIVO	MALE	30 años	ACADEMIA	3016418214
5	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214
6	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214
7	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214
8	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214
9	Aracely María Rodríguez Rodríguez	1.025.852.045	ACTIVO	FEMEA	30 años	ACADEMIA	3016418214

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistas@gmail.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LEBRIJA

**"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS
13 Y QUEBRADA LAS RAJES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
SANTANDER"**

VALOR DEL CONTRATO				\$ 1.220.014.433,41
ANTICIPO				\$ 366.004.330
ACTA	VALOR BRUTO	AMORTIZACION	VALOR NETO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ANTICIPO			\$ 366.004.330,00	
ACTA 01	\$ 230.126.422,55	\$ 69.037.926,77	\$ 161.088.495,79	19%
ACTA 02	\$ 136.768.649,01	\$ 41.030.594,70	\$ 95.738.054,31	11%
TOTALES	\$ 366.895.071,56	\$ 110.068,521,47	\$ 622.830,880,10	30%

1.4.5 ACTIVIDADES AMBIENTALES

Socialización del proyecto con la comunidad y veeduría, dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores, seguridad social para los trabajadores, señalización preventiva en la obra, tramite de permiso de aprovechamiento forestal, disposición de desechos en los lugares apropiados y en general todo lo relacionado en la Guía Ambiental.

1.4.6 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control a los materiales, maquinaria y equipo, calidad del personal, calidad y cantidad de la señalización preventiva, cumplimiento de la seguridad industrial y social, control de pólizas, cumplimiento del programa de trabajo.

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Residente	1	Si
Director de obra	1	Si
Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional	1	Si
Maestro	1	Si
Oficial	2	Si
Ayudantes	7	Si
PERSONAL TOTAL	13	

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenieriafuturistas@gmail.com



MINISTERIO DE SALUD
PROVINCIA DE LA HABANA

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

1.5.1 ACTIVIDADES TECNICAS

Las actividades realizadas en el presente contrato fueron las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1.02	Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)	Se continuará la realización de la respectiva señalización en el área de trabajo con el objetivo de dejar en evidencia el riesgo que hay en la obra con sus respectivas prevenciones.
1.05	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	Se continuará la con la elaboración de las actividades diarias de topografía en la medición y replanteo para el control de la obra, garantizando la correcta instalación de tubería de alcantarillado sanitario y pluvial y acueducto.
1.08	Demolición de Pozos existentes	Se ejecutará la labor de demolición de Pozos existentes sanitarios con el fin de ser reemplazados.
1.09	Desinstalación de Tubería	Se continuará la ejecución de la labor de desinstalación de tubería sanitaria existente de la calle séptima, por motivo de que se instalará tubería nueva para realizar su funcionamiento.
1.12	Entibados para excavación Prof. = o > a 1,60 mts	Por cada avance de excavación de tubería se realizará la entibación de las zanjas con profundidad mayor a 1.60 m para evitar cualquier movimiento de tierra que pueda perjudicar al personal de la obra.
1.13	Manejo de Aguas	Se continuará la con la realización del manejo de aguas a través de la instalación de tuberías.
2.01	Excavación en material común	Se continuará la ejecución de la excavación en material común por medio de la utilización de retroexcavadora para llegar a la profundidad de la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y pluvial y acueducto.
2.02	Excavación manual en material común	Se continuará la realización de la excavación manual en material común para encontrar las domiciliarias y así realizar el respectivo cambio de tubería y cajas de inspección.
2.03	Relleno compacto material común	Se continuará la elaboración del Relleno compacto material común sobre la tubería principal y domiciliaria.
2.04	Relleno compacto material seleccionado.	Se realizó el relleno con material seleccionado sobre la tubería de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial y la red de acueducto.
2.05	Relleno en arena para asentar tubería	Se continuará la realización del Relleno en arena para asentar tubería sobre la tubería de alcantarillado sanitario y pluvial, acueducto y conexiones domiciliaria.
2.06	Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado	Se continuará la realización del Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado por medio de camioneta de carga con ayuda de la retro excavadora.
3.02	Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM	Se continuará la ejecución del Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM para generar el cambio de la tubería de agua potable

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenleriafuturistas@gmail.com



INGENIERÍA
FUTURISTAS

3.06	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24"	Se continuará la ejecución del el Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24" para el manejo de aguas lluvias.
3.08	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16"	Se continuará la ejecución del el Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16" para el manejo de aguas residuales.
3.14	Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud < o = a 6,0 m	Se continuará la ejecución de las conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm para y así realizar el respectivo cambio de tubería y cajas de inspección.
4.03	Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)	Se continuará la ejecución realización de pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts) para red de alcantarillado sanitario y pluvial.

Elaborado por

JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES
Residente de Obra

CARRERA 18 # 14-26 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA
3123051275
ingenleriafuturistas@gmail.com

ACTA No:	04
FECHA:	16 - Diciembre - 2021
CONTRATO No:	
OBJETO:	Reposición de alcantarillado y cauducto

I. PARTICIPANTES

de la calle 7ma entre ca 13B y quebrada las Áncas del casco urbano en el municipio de Lebaja, Santander.

Supervisor: Ing Diego Ardila, Siso Mónica Herrera.

Interventor: Ing Jair Vasquez, Ing. Emerson Guerrero.

Contratista: Ing David Guerrero, Siso Harold Ardila.

II. TEMAS TRATADOS

• Avance de obra. Al día de hoy después de realizar el respectivo recorrido a la obra se evidencia que se mantiene el atraso en las labores de la obra, las cuales se deben a varios inconvenientes que ha manifestado el contratista, igualmente la interventoría y la supervisión le reiteran al contratista la importancia de mejorar el porcentaje de avance teniendo en cuenta que ha transcurrido 1 mes de ejecución.

• La supervisión recomienda, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido el contratista con la ejecución de la instalación de tubería de alcantarillado, realizar la instalación de tubería hidráulica teniendo en cuenta que este proceso puede ser ejecutado sin interferir en la ejecución de las demás actividades.


J. D. VASQUEZ

 INGENIERÍA
FUTURISTA
S.A.S.

III. COMPROMISOS

- Realizar las correcciones pertinentes según la revisión de la Supervisión al primer informe y entrega del segundo informe tanto de contratista como interventoría.
- Se recomienda hacer pozo de inspección en lotes que tengan gran extensión de área y que no cuenten con su respectiva acometida. El supervisor se compromete a realizar la entrega del detalle del pozo mencionada.

IV. CONSTANCIA DE ASISTENCIA

NOMBRE	MR VEDANT / Eneida Guevara	
En Representación de	INTERVISTORA	
Correo electrónico	januariasg@gmail.com	
Teléfono	313244089	
NOMBRE	Dora Fernanda Arbeláez Gómez	
En Representación de	Empulabría	
Correo electrónico	ingenieria.civil@empulabría-garcia.com	
Teléfono	3156291495	
NOMBRE	David Guastier	
En Representación de	Contratista	
Correo electrónico	ingenieriafuturista2021@gmail.com	
Teléfono	3152857368	


J. V. RIVERA

 INGENIERIA
FUTURISTA

Fecha: Miércoles 15 de diciembre del 2021

Con la ayuda de topografía se realizó replanteo y nivelación de la excavación del último tramo de tubería de aguas lluvias que encausa con el río, con el fin de orientar y dejar suministrado en el terreno la pendiente requerida según los planos.

Los profesionales SISO del contratista e interventora dieron charla sobre los implementos de seguridad y de los posibles problemas que pueden tener en obra; estos estarán atentos a cualquier necesidad que requiera el obrero. Se recibe amablemente la visita del vecino. Todo perfecto.

Ingeniero residente	SISO Contratista	Herramienta y equipo
Auxiliar ingeniero residente	SISO Interventora	Herramienta menor
Ingeniero Interventor	Topógrafo	Vibro compactadora
Auxiliar ingeniero interventor	Cadenero	Martillo eléctrico
Martillo	Seis obreros	Equipo topografía

Fecha: Jueves 16 de diciembre del 2021

Se trabaja como de obra para dar claridad a los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, también se explicó en caso de rechazar los pozos de inspección para ser later con gran extensión.

Se realizaron actividades de excavación y relleno manual. Se realizaron cajas de inspección.

Ingeniero residente	Topógrafo	Herramienta y equipo
Auxiliar ingeniero residente	Cadenero	Herramienta menor
Ingeniero Interventor	Auxilio	Vibro compactadora
Auxiliar ingeniero interventor	Seis obreros	Martillo eléctrico
Supervisor empalme		Equipo de topografía
SISO Contratista		

Nº 000

Fecha: Viernes 12 de diciembre del 2021

A primera hora se retomó labores de excavación con la retroexcavadora e instalación de tubería de aguas lluvias en el lugar en donde encausarlo con el río.
Se realizaron nuevas cajas de inspección.

Participantes:

Ingeniero residente	Maestro	Herramienta mano y espejo
Auxiliar ingeniero residente	Seis obreros	Herramienta menor
Ingeniero interventor	operador retro	Vibracompactadora
Auxiliar ingeniero interventor		Perforadora eléctrica
SISO		Equipo de topografía
Topógrafo - cadenero		Retroexcavadora

Fecha: Sábado 18 de diciembre del 2021

Se realizaron labores de excavación manual para las respectivas domiciliarias para la instalación de nuevas cajas de inspección.

Con la retroexcavadora se excava para la instalación de tubería de aguas negras y lluvias, en donde son protegidos con una cama de arena superior e inferior antes de ser sellado en material arena y seleccionados Participantes

Ingeniero residente	Herramienta y equipo:
Auxiliar ingeniero residente	Herramienta mano
Ingeniero interventor	Vibracompactadora
Auxiliar ingeniero interventor	Equipo de topografía
SISO	Retroexcavadora
Topógrafo	
Cadenero	
Maestro	
Seis obreros	
Operador retro	

Fecha: Lunes 20 de diciembre del 2021

Se realiza copia de inspección con su conexión domiciliar.
Se continúa la labor de excavación con retroexcavadora, posterior
se hace la respectiva entibación de las zanjas.
Retiran escombros de la obra por medio de camión de carga.
Se inicia labores de realización de pozo de alcantarillado.
Se instala tubería y se rellena con la capa de arena.
Se realizó demarcación de muro de contención para instalación final de tubería de 16"

Ingeniero residente

Topógrafo

Herramienta manual y equipo

Auxiliar ingeniero residente

Cadeneta

Herramienta manual Herrillo eléctrico

Ingeniero interventor

Huella

Vibracompuñadora

Auxiliar ingeniero interventor

cuatro obreros

Equipo de topografía

SJ30

Retractor

Retractor

Fecha: Martes 21 de diciembre del 2021

El día amaneció con fuerte lluvia por lo que se no
la necesidad de suspender las actividades durante
la jornada de la mañana.

En la tarde se dio pocas labores debido al mal
estado del terreno.

Se realizó el pozo de inspección y domiciliario.

Ingeniero residente

Topógrafo

Herramienta manual

Auxiliar ingeniero residente

Cadeneta

Equipo de topografía

Ingeniero interventor

Huella

Auxiliar ingeniero interventor

cuatro obreros

SJ30

Fecha: Miércoles 22 de diciembre del 2021

El día amaneció con buena lluvia por lo que se vio la necesidad de suspender labores por la mañana.

Se continuó con la realización del pozo.

Se evidenció un movimiento de tierra en el lugar que se está realizando labores de perforación de muro, por lo que solo quedó un poquito para pasar personal participante.

Se realizó control de obra.

Ingeniero residente

SESO

Herramienta menor

Auxiliar ingeniero residente

Maestro

Supervisor intermedio

Seis obreros

Auxiliar ingeniero intermedio

Fecha: Jueves 23 de diciembre del 2021

El día amaneció con buena lluvia por lo que se vio la necesidad de suspender labores por la mañana.

Se continuó con la realización del pozo de inspección.

Ingeniero residente

SESO

Herramienta menor

Auxiliar ingeniero residente

Maestro

Supervisor intermedio

Seis obreros

Auxiliar ingeniero intermedio

Fecha: Viernes 24 de diciembre del 2021

El día amaneció templado en donde se pudo realizar actividades de relleno y estabilidad del terreno para poder generar cercamiento en los lugares que lo requieran. Continuó actividad de demolición de muros.

Ingeniero residente	Maestro	Herramientas y equipo:
Auxiliar ingeniero residente	Ocho obreros	Herramienta menor
Ingeniero interventor	Topógrafo	Equipo de topografía
Auxiliar ingeniero interventor	Cadeneta	Retra excavadora
STSO	Operador retro	Vibracompactor - Martillo Eléctrico

Solo se trabajo medio día para que el día de día se dio para el festivo del 24 fecha de nacimiento y navidad. Se suspendieron labores hasta el día 10 de enero por la ola invernal.



MINISTERIO
DE SALUD
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA

16 DE DICIEMBRE -24 DE DICIEMBRE /2021

JAVIER FRANCISCO HERRERA BAHAMON

HESQ

**INFORME 3 DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
DICIEMBRE
2021**

NOMBRE	ELABORADO POR:	REVISADO POR:
	JAVIER FRANCISCO HERRERA BAHAMON	EMPULEBRIJA
CARGO	HESQ	SUPERVISOR CONTRACTO
FECHA	DICIEMBRE DEL 2021	DICIEMBRE DEL 2021

JOSE MANUEL RUEDA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERIA
FUTURISTA S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

FECHA	DICIEMBRE DEL 2021
CONTRATISTA	JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
FRENTE DE OBRA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S
ACTIVIDAD	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORADO POR	JAVIER FRANCISCO HERRERA BAHAMON

ACTIVIDADES O TEMAS TRATADOS

NOMBRE DEL PROYECTO	EN REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRUA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL	José Manuel Rueda García
INGENIERO RESIDENTE	Jesús Pedro Nel Serrano Meneses
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA	Jair Albano Vásquez Carrillo
AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Emerson Fabian Guerrero Correa
HSEQ	JAVIER FRANCISCO HERRERA BAHAMON



INGENIERIA FUTURISTA
S.A.S.
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

Es por ello que INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en sst, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo de la obra. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL. La prevención en SST dentro de la obra está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.



INGENIERIA FUTURISTA
S.A.S. - INGENIERIA Y
SERVICIOS


INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

Objetivos

- Proteger, preservar y mantener la integridad física, mental de los trabajadores y demás personas relacionadas al proyecto en las prácticas y procedimientos de estas especificaciones adecuadas a la higiene y seguridad en el trabajo.
- Capacitar y fomentar la participación de los trabajadores en las prácticas y procesos de las actividades a realizar.
- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas de INGENIERIA FUTURISTA S.A.S, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales»



Emisión
10/01/2021

Version 01

PAGOS
S.A.

PLANTILLA NRO. 22384990


REFERENCIA DE PAGO (TITULO)

Fecha Paso Placilla: 2022-01-19

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR				
TO: THE DIRECTOR	100-441111	FROM: SAC, NEW YORK	SUBJECT: [REDACTED]	DATE: 10/1/68
FROM: SAC, NEW YORK	100-441111	TO: THE DIRECTOR	SUBJECT: [REDACTED]	DATE: 10/1/68

MATERIALS CONTRACT NO. 100100		MATERIALS CONTRACT NO. 100100		MATERIALS CONTRACT NO. 100100	
DATE: 2021	REV: 12	DATE: 2022	REV: 01	SHEET NO. 100100	
MATERIALS CONTRACT NO. 100100		MATERIALS CONTRACT NO. 100100		MATERIALS CONTRACT NO. 100100	

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO										PROFESSOR
PROVA DE FUNDAMENTOS	TIPO	VALOR MÁXIMO	VALOR REALIZADO	NOTA	PROVA	VALOR MÁXIMO	VALOR REALIZADO	NOTA	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	01	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	02	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	03	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	04	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	05	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	06	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	07	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	08	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	09	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	
PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	10	PROVA DE FUNDAMENTOS	10	10	10	PROFESSOR	



Emisión
10/01/2021

Version 01



Certificat de
Page

Se certifica que la empresa, identificada con NI-901236770 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL
DE ITEZA
CALLE 100 No. 100-100
TELEFONO: 3204000000

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

2. Relación de personal periodo Diciembre



ALCALDIA MUNICIPAL
DE ITEZA
CALLE 100 No. 100-100
TELEFONO: 3204000000

RELACIÓN DE PERSONAL
Reposición de afluencia y seguridad de la calle séptima entre carrera
13 y quebrada las raíces del casco urbano en el municipio de Iteza
sancander

CODIGO: SS-SST-001

VERSION: 001

FECHA: DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE COTILA	ESTADO ACTUAL	EPS	AGE	RENTA	TELEFONO
1	Julio Edsardo Paer Almeida	91.463.016	ACTIVO	SALUD TOTAL SIN EPS	POSITIVA	POSITIVA	3185130800
2	Braisán Soreh Boharquez Rodriguez	1.038.653.046	ACTIVO	subsidio	POSITIVA	POSITIVA	3016423214
3	Jose Manuel Paer Almeida	5.725.251	ACTIVO	SALUD TOTAL	POSITIVA	POSITIVA	3204026899
4	José de las Rosas Restrepo	1.089.377.791	ACTIVO	COGSAJUD	POSITIVA	POSITIVA	3204000859
5	Holmer Santos Pueros	5.069.375.355	ACTIVO	NUOVA EPS	POSITIVA	POSITIVA	3135130100
6	Vicente Páez Romero	5.670.428	ACTIVO	NUOVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	3185130900
7	Jose Julian Manuel Cristobal Tapia	5.351.470.905	ACTIVO	COGSAJUD	POSITIVA	POSITIVA	3204000150
8	Gustavo Adolfo Torres Andia	1.104.130.348	ACTIVO	WEDIMUS	POSITIVA	POSITIVA	3105340905
9	Mauricio Manegras Cebaldero	13.537.062	ACTIVO	COGSAJUD	POSITIVA	POSITIVA	3204000856

3. Afiliación seguridad social personal administrativo.

CARGO	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Residente	Si
Director de obra	Si
Seguridad y salud en el trabajo	Si
Maestro	Si
Oficial	Si
Ayudantes	Si



CONSTRUCCIONES
SOLUCIONES
ECONÓMICAS

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

4. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

- Durante el periodo del 17 de diciembre del 2021 Al 24 de diciembre del 2021. se presentaron lluvia, por tal motivo se tuvo que realizar suspensión de actividades en la obra.





Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
M.T.S.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión:
10/01/2021

Versión 01





INSTITUTO VENEZOLANO
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

Como se pudo ver en las imágenes anteriormente plasmadas, los riesgos eran altos para exponer el personal a trabajar.

Riesgos presentados:

- Riesgo físico
- Riesgo locativo
- Riesgo natural

5. Entrega de EPP

Muchos trabajos pueden presentar riesgos y peligros para quienes los realizan. Por este motivo, el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) es fundamental para resguardar su seguridad y protegerlos frente a algún accidente.

Los Elementos de Protección Personal (EPP) corresponden a cualquier equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado y fabricado para resguardar al cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. En este contexto, y por ley, es el empleador quien debe proveer los EPP a quienes lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen.



INGENIERÍA
FUTURA S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

Por sí mismos, los EPP no eliminan los riesgos y peligros en los espacios de trabajo, pero sí protegen a las personas y pueden llegar a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un accidente. Por este motivo, su uso se enmarca dentro de un plan preventivo que respalde su implementación.

Tipos de Elementos de Protección Personal

Los EPP que se implementen en cada organización dependerán de las actividades de riesgo a las que estén expuestos los trabajadores, y se pueden categorizar de acuerdo a la zona del cuerpo que protegen:

Cabeza: los cascos de seguridad permiten proteger la cabeza frente a posibles impactos, choques eléctricos o quemaduras. Deben utilizarse con sus correas ajustadas correctamente en la quijada.

Oídos: cuando el ruido en el lugar de trabajo excede los niveles establecidos por el Ministerio de Salud, las personas expuestas deben utilizar protección auditiva. Existen dos tipos: los tapones que se insertan en el conducto auditivo externo y las orejeras que van alrededor de la cabeza, absorbiendo el ruido ambiente.

Ojos: cuando se está en presencia de proyección de partículas, líquidos, humos, vapores, gases y radiaciones, se deberá utilizar protectores de ojos (que solo cubren la zona ocular).

 MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Emisión 10/01/2021
		Versión 01

Rostro: los protectores faciales no solo protegen los ojos sino también el resto del rostro, bloqueando el paso de rayos ultravioletas o infrarrojos y de otros cuerpos extraños como plástico transparente, cristal templado o rejillas metálicas.

Vías respiratorias:

se debe proteger al trabajador de contaminantes presentes en el ambiente tales como polvos, neblinas, vapores orgánicos o gases. Para esto existen distintos tipos de respiradores con sus respectivos filtros.

Pies y piernas: el calzado de seguridad es fundamental ya que protegen de la humedad, de sustancias calientes y de caídas o golpes en superficies peligrosas e inestables. Además, para proteger las piernas de salpicaduras de metales fundidos se deben utilizar polainas de seguridad resistentes al calor.

Piel: Los trabajadores que realizan labores prolongadas bajo los rayos ultravioletas deben aplicarse protector solar cada dos horas y utilizar vestimenta que cubra la piel expuesta a la radiación para evitar todo tipo de quemaduras.

-SOPORTE DE ENTREGA DE EPP




MINISTERIO DE SALUD
PROMUEVE LA VIDA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

ENTREGA DE DOTACIÓN		FECHA DE ENTREGA		FECHA DE RECEPCIÓN	
NOMBRE		CÉDULA No.		CÉDULA No.	
BORGUET, J.					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS					
ITEM	DOTACIÓN, TPO ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECEBIDO	
1	Tapabocas + Alcohol	1	12-12-2020	[Firma]	
2	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
3	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
4	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
5	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
6	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
7	Tapabocas + Alcohol	1	13-12-2020	[Firma]	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
NOMBRE		CÉDULA No.		CÉDULA No.	
BORGUET, J.				0491322433	
CARGO		FIRMA		[Firma]	
SISO					
COMPROBANDO					
He comprobado y verificado adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenidos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido la información sobre el uso adecuado de los mismos.					
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.					
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:					
CÉDULA No:					



Emisión
10/01/2021

Version 01

 MINISTERIO DE SALUD REPUBLICA DE CUBA		ENTREGA DE PROTECCIÓN/CTP		CATEGORÍA: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 VERSIÓN: 1.0 AÑO: 2021
NOMBRE: ENTREGA EPP.		CECULA No.	CARGO:	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN/EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECEPCION
1	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
2	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
3	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
4	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
5	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
6	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
7	Guantas de cama 22	1	22-12-2021	<i>[Signature]</i>
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS				
NOMBRE: HAZEL OROBON MORALES S.		CECULA No. 1.054 372 413	FIRMA: <i>[Signature]</i>	
CARGO: SISO		COMPROBADO He comprobado y valorado adecuadamente durante la entrega laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenidos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que corresponden a la actividad: física, psicológica y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.		
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.				
FECHA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:				
CECULA No.:				



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

AGENCIA AUTÓNOMA		ENTREGA DE DOTACIÓN Y PP		CÓDIGO: 1000010101	
NOMBRE:		CÓDIGO PA:	CARGO:	VERSIÓN: 01.01	
ENTREGA GPP				ANEXO 1000	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS					
ITEM	DOTACIÓN, EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECEBIDO	
1	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
2	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
3	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
4	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
5	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
6	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
7	Casco y gafas de seguridad	1	22-12-21		
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
NOMBRE	Manolo Daga Andino S	CÓDIGO PA:	1000010101		
CARGO	Sico	FIRMA			
COMPROBANTE					
He comprobado a visual personalmente que en la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mencionados en este informe, cumplen con las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
El presente comprobante sirve como elemento de protección personal entregado.					
PLAZA DE GTRN RECIBE EL ELEMENTO Y USE EL COMPROBANTE:					
CÓDIGO PA:					



CONSEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

6. Capacitaciones

PAUSAS ACTIVAS:

Es de nuestro completo conocimiento que las pausas activas y los descansos entre labores son necesarios para incrementar la creatividad y la productividad en el trabajo, prevenir lesiones osteomusculares e incluso mejorar el clima laboral y combatir la monotonía. Pese a tener claridad sobre esto, muchas veces olvidamos hacer estas pausas durante el día o simplemente las pasamos por alto con la excusa de que no tenemos mucho tiempo o no sabemos qué ejercicios y actividades realizar para beneficiar cada parte del cuerpo.

Hoy queremos ayudarte a mejorar tu salud laboral, hablándote de la importancia de las pausas activas y dándote una idea de los ejercicios que puedes realizar en tu jornada diaria para mantenerte activo y llenar tu cuerpo y mente de beneficios.



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Version 01

SOPORTE: ASISTENCIA

		INGENIERIA FUTURISTA S.A.S		Código:SG.SST.FR.001	
		CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES		Versión: 01	
				Página 1 de 1	

FECHA: DD/11/2021		CONFERENCIISTA(S): DON JUAN SANCHEZ (SSE)			
Tipo de evento	Reunión	Capacitación	X	Ver	Comisión
Justificación	Reunión	Formación	Formación	Formación	Formación
Tema: Pauta activa		Intensidad: 30 minutos			
PUNTOS TRATADOS:					
Nº	NOMBRE	CECULA	CARGO	FIRMA	
1	STANLEY A. TELLO AGUIAR	7604730330	AYUDANTE		
2	HOLIVIA TELLO AGUIAR	7000572355	AYUDANTE		
3	DIEGO GARCIA	1072522130	AYUDANTE		
4	RODRIGO GARCIA	2047323333	AYUDANTE		
5	RODRIGO GARCIA	50007333	AYUDANTE		
6	NICOLAS PILOTE	5070400	AYUDANTE		
7	TERESA DIAZ	1054322030	AYUDANTE		
8	ALBA TUDON GARCIA	1044322401	AYUDANTE		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Tipo	Nº DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	TEMA TRATADO	FECHA	HORA	FIRMA
CL	1-07-372-473	ALBA TUDON GARCIA		2021	3:30 PM	



INGENIERIA PUJARRISTA S.A.S
CALLE 100 No. 100-100
BARRIO EL CENTRO, BOGOTÁ

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

CAPACITACIÓN EN BIOSEGURIDAD

Brindar recomendaciones básicas sobre medidas de bioseguridad necesarias en el marco de la actual epidemia de COVID-19 fue el objetivo de esta capacitación DIRIGIDA al personal con el fin de que en estas fiestas de fin de año no bajemos la guardia.



INGENIERIA PUJARRISTA S.A.S
CALLE 100 No. 100-100
BARRIO EL CENTRO, BOGOTÁ

INGENIERIA PUJARRISTA S.A.S
CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES Y
CAPACITACIONES

Código: SQ, SST PR 001

Versión: 01

Página 1 de 1

FECHA: 20/12/2020	ASISTENTES: 44/2021	CONFERENCISTA(S): [Firma]		
EMPRESA: [Firma]	FECHA: 20/12/2020	EMPRESA: [Firma]	FECHA: 20/12/2020	EMPRESA: [Firma]
TEMA: [Firma]		INTERIOR: [Firma]		
PUNTOS TRATADOS:				
Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	REMA
1	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
2	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
3	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
4	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
5	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
6	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
7	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
8	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Tipo	No. de documento	Asistencia y nombres completos	Temas tratados	Fecha
CC	100034472	[Firma]	[Firma]	[Firma]



RIESGOS FISICOS:

En las obras de construcción casi todos los riesgos son motivados por condiciones existentes inseguras (huecos sin tapar, bordes de forjados sin proteger, etc.), por factores personales (mala utilización de equipos de trabajo, etc.). Es evidente que estas condiciones pueden provocar riesgos conducentes a accidentes laborales, de cuya existencia da buena cuenta la seguridad laboral.

Sin embargo, existen otros riesgos, que, aunque en su gran mayoría no son de carácter mortal, si pueden provocar una afectación en cuanto a que se manifiestan con enfermedades crónicas en los trabajadores. Dichos riesgos son motivados por agentes químicos, físicos y biológicos.

RIESGOS MECANICOS:

La construcción es una actividad arriesgada está catalogada como clase V en la escala de valores es decir como de alto riesgo en la que se tiene una probabilidad tres veces mayor de causar muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás sectores productivos (agricultura, industria y servicios) como caer desde una altura; quedar atrapado por la tierra o los escombros; recibir golpes por la caída de materiales y herramientas; sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas; entrar en contacto con sustancias peligrosas, etc

Muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican que el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control y que el 20% restante se debe a errores de ejecución. De ahí la importancia de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como obliga la actual legislación (Estudio de Seguridad y Salud), y la necesidad de que todas las



personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y su prevención.

Un riesgo mecánico se puede definir al conjunto de factores físicos que desencadenan en lesiones al trabajador, provocando eventos fisiopatológicos como, por ejemplo: cortes, punciones, golpes, aplastamientos, quemaduras, entre otros, al realizar operaciones que impliquen el uso o manipulación de herramientas, bien sea: manuales, maquinaria (lijadoras, taladros, tornos, prensas, etc.), manipulación de aparatos de elevación (grúas, puentes grúa, etc.), utilización de vehículos.



Cortes o fractura



Aplastamiento de mano



Atroce en máquinas



Quemaduras



Ejemplos de riesgos mecánicos



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

SOPORTE DE CAPACITACIÓN



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

INGENIERIA FUTURISTA S.A.S

Código: SG-SST-FR-001

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES Y
CAPACITACIONES

Versión: 01

Página 1 de 1

FECHA: DD 17 MAR 12 AA 2021

CONFERENCIISTA(S): YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ (SSS)

TIPO DE EVENTO
(MARQUE CON X CADA
OPCIÓN DE EVENTO)

Reunión

Capacitación

Veo

Simulacro

Formación

Formación

Formación

Ciclo - Taller

Formación

TEMA: Implementación y uso adecuado de los elementos de
protección personal

INTENSIDAD: 30 minutos

PUNTOS TRATADOS:

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA
1	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
2	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
3	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
4	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
5	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
6	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
7	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
8	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	7.100.777.809	AYUDANTE	17/03/2021
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Tipo	No DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	TEMA TRATADO	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	FECHA
CC	1-094 512-473	YOFEL OCHOA TELLO SANCHEZ	Uso adecuado de los EPP	7:00 AM	7:30 AM	17/03/2021



INVESTIGACIÓN
DE CAUSAS Y
EFFECTOS

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01





MINISTERIO DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

Observaciones recibidas por parte de ESPL





7. SEÑALIZACIÓN DE OBRA

OBJETO DE LA SEÑALIZACIÓN

La señalización de obras tiene por objeto:

- Informar de la presencia de obras.
- Ordenar la circulación en la zona afectada para garantizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios independientemente del modo de transporte utilizado.

PRINCIPIOS BÁSICOS

La señalización y balizamiento de las obras es fundamental en la seguridad vial. Los principios básicos de la buena señalización son:

- Claridad.
- Sencillez.
- Uniformidad
- Estar justificada y ser creíble
- Actualizada con la evolución de la obra.
- Anulada tan pronto acabe la afección

Para unión temporal Portugal 2021, es de vital importancia mantener señalizado para evitar cualquier tipo de incidente con los residentes de esta comunidad, y evitar también que personal ajeno ingrese a la obra.




INGENIERÍA
FOTOLÉPTICA
S.A.S

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

SOPORTE FOTOGRAFICO

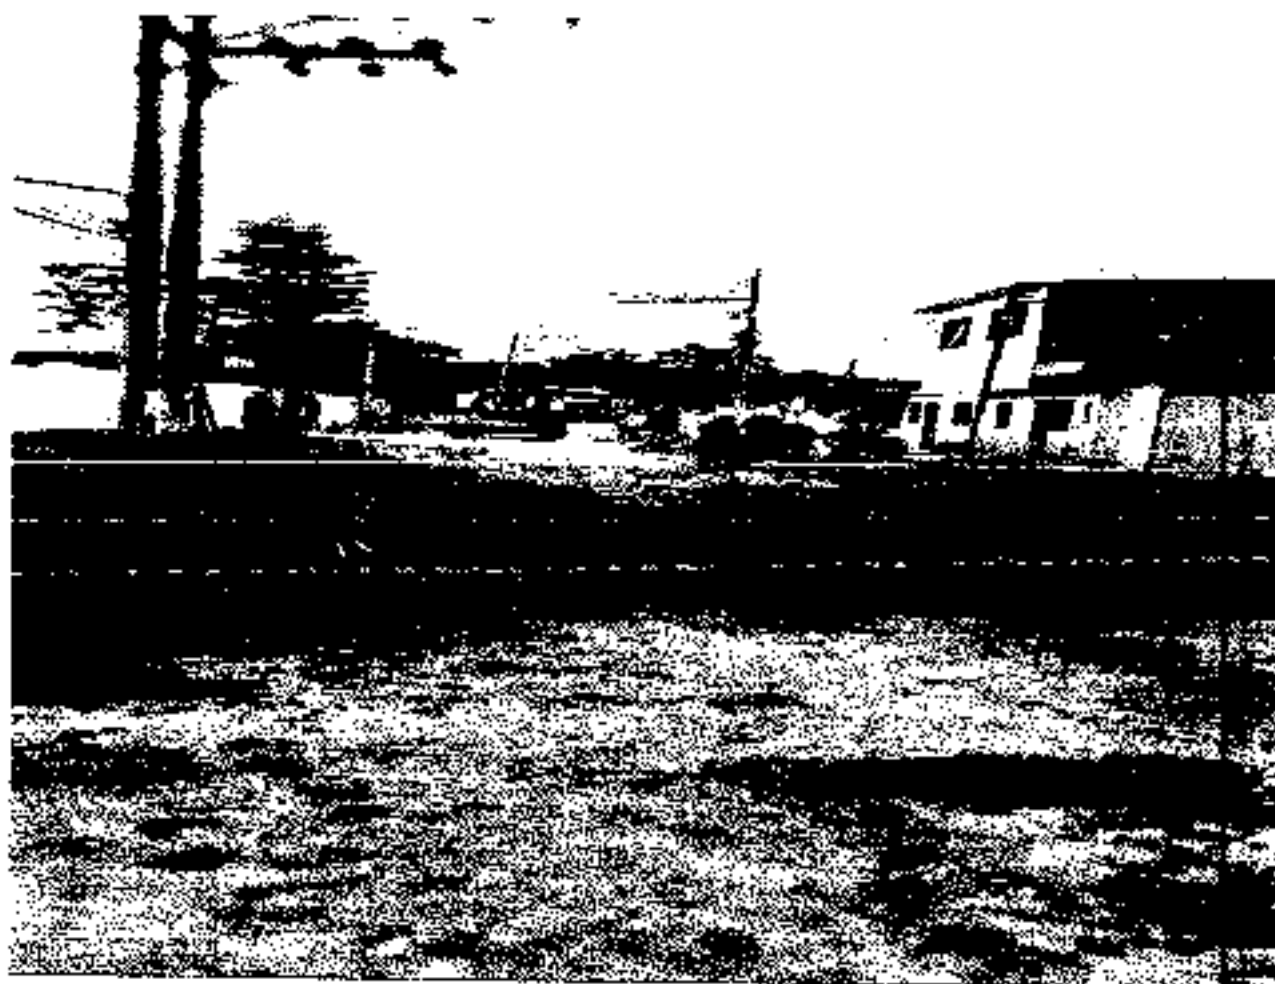



INFORME DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01






INFORME DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01





INSTITUTO VENEZOLANO
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Version 01

8. INDICADORES DE AUSENTISMO

En el mes de DICIEMBRE y en los días laborados que se llevan de diciembre aun no se ha presentado ningún accidente de trabajo, ni tampoco incapacidad medica.



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

CONCLUSIONES

- INGENIERIA FUTURISTA S.A.S somos Conscientes de la importancia de la prevención de riesgos laborales en nuestro sector de la construcción, sabemos que es prioritario realizar la gestión de riesgos laborales por parte de un profesional en el área al igual que la compra de los elementos de protección adecuados.
- La prevención de riesgos laborales consiste en evitar el riesgo, y en el ámbito laboral, un riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un percance a consecuencia del trabajo. El riesgo laboral será grave o inminente cuando aumenten las posibilidades de que se produzca un accidente de trabajo y las consecuencias del mismo se consideren graves.

FIRMAS

HAROLD DAYAN ARDILA
SISO CONTRATISTA

JESUS PEDRONEL SERRANO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
TÉCNICO


**INFORME DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO**

Emisión
10/01/2021

Versión 01

RESPONSABLES

FIRMAS



JAVIER FRANCISCO HERRERA BAHAMON

SISO CONTRATISTA



JOSE MANUEL RUEDA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
