



**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS No. 01  
CONTRATO DE OBRA No. 107- 2021**

CONTRATO No.	107-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÍJA E.S.P.
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S, NIT No. 900500467-6 R.L LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebríja.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
ADICION AL CONTRATO	CIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$122.076.314,96)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALIF 17 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRÍJA
PLAZO	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	DOS (02) MESES
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.
INTERVENTORIA	INTERING S A S JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN Representante legal

En Lebríja a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del 2022 se reunieron: LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS en calidad de Gerente General de la E S P YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ, en calidad de supervisores administrativo y técnico respectivamente, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL, en representación legal de la empresa contratante M2L CONSTRUCTORES S.A.S. y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN representante de la empresa Interventora INTERING S A S; con el fin de suscribir la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01 del contrato de obra No. 107-2021

**CONSIDERANDO**

Que las cantidades del contrato de obra han variado con respecto a las proyectadas inicialmente  
Que se ve la necesidad de generar un balance físico al proyecto, el cual no representa afectaciones al presupuesto, generando mayores y menores cantidades de obra, con el fin de cumplir a cabalidad con el proyecto (se adjunta comité de obra)



## MAYORES CANTIDADES

### **ITEM 1.04 LOCALIZACIÓN, MEDICIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE OBRA:**

Este ítem es modificado debido a la necesidad de ampliar el plazo para poder terminar los procesos constructivos y con el fin de tener un personal que esté realizando el respectivo seguimiento en la localización, medición, replanteo y control de la obra en las excavaciones, pendientes y rellenos, por tal motivo esta cantidad pasa de 2,00 a 3.00.

### **ITEM 2.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de las acometidas existentes y faltantes que se requieren para cada vivienda que tenga matrícula y que solicita el servicio, esto con el fin de dejarlas instaladas en este proceso y no posterior a la entrega del proyecto. Por tal motivo esta cantidad pasa de 102,00 m<sup>3</sup> a 154,14 m<sup>3</sup>.

### **ITEM 2.02 RELLENO COMPACTADO MATERIAL COMÚN**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de las acometidas existentes y faltantes que se requieren para cada vivienda que tenga matrícula y que solicita el servicio, esto con el fin de dejarlas instaladas en este proceso y no posterior a la entrega del proyecto y posterior a cada excavación. Por tal motivo esta cantidad pasa de 34,00 m<sup>3</sup> a 96,47 m<sup>3</sup>.

### **ITEM 2.04 RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de las acometidas existentes y faltantes que se requieren para cada vivienda que tenga matrícula y que solicita el servicio, esto con el fin de dejarlas instaladas en este proceso y no posterior a la entrega del proyecto y posterior a cada excavación. Por tal motivo esta cantidad pasa de 25,50 m<sup>3</sup> a 30,53 m<sup>3</sup>.

### **ITEM 2.08 SUM. E INST. TUBERÍA PVC RDE-21 DE 2" INC ACCESORIOS LIM**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo para hacer empalme con la red existente en las diferentes zonas donde no se van a intervenir y se dejan las proyecciones. Por tal motivo esta cantidad pasa de 128,20 ml a 146,20 ml.

### **ITEM 2.16 ACOMETIDA HIDRÁULICA**

Este ítem es modificado dada la necesidad de algunos usuarios que no tenían el servicio, y que no hacían parte de sistema de servicio en las oficinas de Emputebríja, una vez realizada la socialización con la comunidad, requieren el servicio el cual se debe solicitar en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P. Por tal motivo esta cantidad pasa de 16,00 un a 29,00 un.

### **ITEM 3.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo una vez identificado las excavaciones para las respectivas acometidas, para los pozos de inspección, sumideros y los cambios generados en el terreno debido a condiciones con las que estaban las conexiones existentes y los contraflujos que tenía el alcantarillado. Por tal motivo esta cantidad pasa de 391,52 m<sup>3</sup> a 613,35 m<sup>3</sup>.

### **ITEM 3.02 RELLENO COMPACTADO MATERIAL COMÚN**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de rellenar el material excavado según condiciones encontradas en el terreno de las tuberías en contraflujo y de las acometidas que



no se tenían identificadas, debido a que no tenían la respectiva matrícula. Por tal motivo esta cantidad pasa de 143,59 m<sup>3</sup> a 435,54 m<sup>3</sup>.

#### **ITEM 3.03 RELLENO SELECCIONADO**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de rellenar el material excavado según condiciones encontradas en el terreno de las tuberías en contraflujo y de las acometidas que no se tenían identificadas, debido a que no tenían la respectiva matrícula. Por tal motivo esta cantidad pasa de 102,36 m<sup>3</sup> a 105,56 m<sup>3</sup>.

#### **ITEM 3.04 RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de rellenar el material excavado según las acometidas que no se tenían identificadas, debido a que no tenían la respectiva matrícula. Por tal motivo esta cantidad pasa de 102,36 m<sup>3</sup> a 128,32 m<sup>3</sup>.

#### **ITEM 3.05 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de rellenar el material excavado según condiciones encontradas en el terreno de las tuberías en contraflujo y de las acometidas que no se tenían identificadas, debido a que no tenían la respectiva matrícula. Por tal motivo esta cantidad pasa de 247,93 m<sup>3</sup> a 668,76 m<sup>3</sup>.

#### **ITEM 3.06 SUMEROS INST. TUBERÍA NOVAFOR DE 12"**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de la ubicación de sumideros y conexión a pozos existente, el cual se hace a retoma en campo. Por tal motivo esta cantidad pasa de 148,30 ml a 154,40 ml.

#### **ITEM 3.08 ACOMETIDA ALCANTARILLADO**

Este ítem es modificado dada la necesidad que se presentó con los usuarios que no tenían matrícula y se comprometieron a solicitarla en Empulebrija, con el fin de que queden incluidas en los respectivos procesos constructivos. Por tal motivo esta cantidad pasa de 16,00 un a 29,00.

#### **ITEM 4.04 MEJORAMIENTO POZOS EXISTENTES**

Este ítem es modificado dada la necesidad de conectar a un pozo existente la red de alcantarillado en la carrera 2D con calle 12 con el fin de dejarla proyectada en una zona a intervenir posteriormente. Por tal motivo esta cantidad pasa de 1,00 un a 2,00 un.

#### **ITEM 4.05 CONEXIÓN A POZO EXISTENTE (INCLUYE DEMOLICIÓN Y EMBONE)**

Este ítem es modificado dada la necesidad de conectar a un pozo existente la red de alcantarillado en la carrera 2D con calle 12, con el fin de dejarla proyectada en una zona a intervenir posteriormente. Por tal motivo esta cantidad pasa de 1,00 un a 1,00 un.

### **MENORES CANTIDADES**

#### **ITEM 2.03 RELLENO SELECCIONADO**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de las acometidas existentes y faltantes que se requieren para cada vivienda que tenga matrícula y que solicita el servicio, esto con el fin de dejarlas instaladas en este proceso y no posterior a la entrega del proyecto y posterior a cada excavación. Por tal motivo esta cantidad pasa de 42,50 m<sup>3</sup> a 27,14 m<sup>3</sup>.



**ITEM 2.06 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo el cual no requiere de ser extraído del proyecto, para lo cual disminuye la cantidad. Por tal motivo esta cantidad pasa de 68,00 m<sup>3</sup> a 61,56 m<sup>3</sup>

**ITEM 4.03 CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20m H=(1.20-2.0)m**

Este ítem es modificado dado que algunos pozos superaron la altura de 2,0m. debido a los contrapendientes que se tenían en los alcantarillados, de esta forma se requieren de menos pozos con alturas hasta 2.0m. Por tal motivo esta cantidad pasa de 11,00 ml a 6,50 m

**ITEMS NO PREVISTOS**

**ITEM 5.01 CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20M H=(2.0-5,0)M**

Este ítem es incluido dada la necesidad de construir pozos superiores a la altura de 2m, debido a los contrapendientes que tenía el alcantarillado existente y se desconocían del levantamiento topográfico. Por tal motivo esta cantidad se adiciona en 5,00 un.






**ITEM 5.02 SILLA YEE 6"X10" PVC**

Este ítem es incluido dada la necesidad de la conexión de alcantarillado con las acometidas de cada vivienda, con el fin de dejar una conexión correcta sin fugas. Por tal motivo esta cantidad se adiciona en 29.00 un.

**ACUERDAN**

Modificar las cantidades iniciales del contrato, tal y como se consigna en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta.

En constancia y aceptación firman los que en ella intervienen.

 <p>M2L CONSTRUCTORES S.A.S. R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL CONTRATISTA</p>	 <p>INTERING S.A.S R.I. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN INTERVENTOR</p>
 <p>YAMILE FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO</p>	 <p>DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO</p>
 <p>LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS Gerente General E.S.P.</p>	



# **MODIFICATORIA 1**

MEMORIAL DE CALCULO

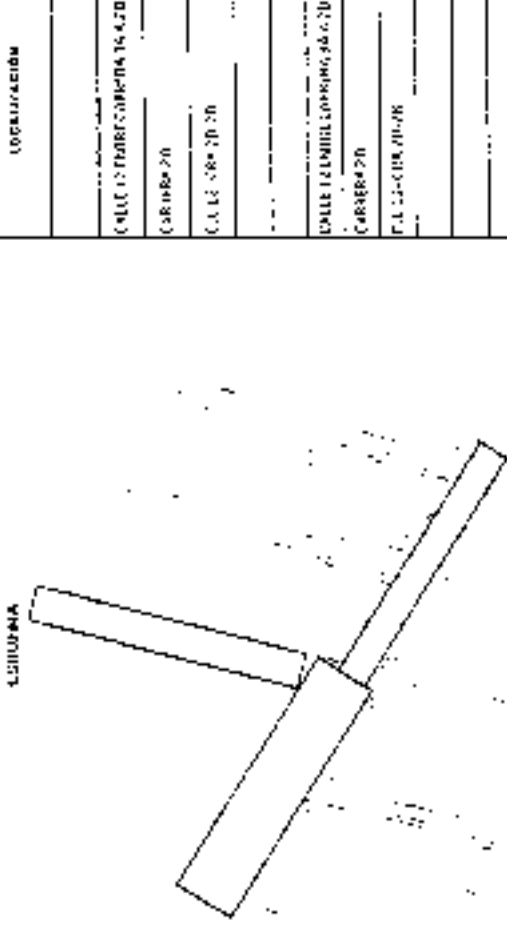
FECHA: 10/04/2014 PROYECCION: 1

OBJETO DEL CONTRATO: PLAN DE MANEJO DEL AGUAFRÍO Y ALGANTARILLADO DE LA FAJTA DE MITER, LAS PARRILLAS 20 Y LA CAJETA CANTERA 20 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TAMBORA

CONTRATISTA: M.C. CONSTRUCTORES S.A.S.  
 CLIENTE: S. DIEGO FERNANDEZ MEDA COMPAÑIA S.A.S.

VALOR ESTIMADO: 1.000.000.000

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACION PROYECTO	ALTO	DIMENSIONES		MEDIDA TOTAL
							ANCHO	COMPUTO	
<b>CONCRETOS</b>									
		CALLE CANTERA 20	140,00						140,00
		CALLE 20	100,00						100,00
		CALLE 20	115,00						115,00
		<b>TOTAL:</b>							<b>355,00</b>
<b>PROYECTOS</b>									
		CALLE CANTERA 20	340,00						340,00
		CALLE 20	100,00						100,00
		CALLE 20	125,00						125,00
		<b>TOTAL:</b>							<b>565,00</b>
		<b>TOTAL:</b>							<b>920,00</b>



VALOR ESTIMADO: 920.000.000

CONTRATISTA: M.C. CONSTRUCTORES S.A.S.  
 CLIENTE: S. DIEGO FERNANDEZ MEDA COMPAÑIA S.A.S.

FECHA: 10/04/2014

MEMORIAL DE CALCULO










**MEMORIAL DE CONTRATO**

FECHA: DD / MM / AAAA 2022 HORA: ...:..:..

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  
 CONTRATO No. ...  
 LOCALIZACIÓN: ...

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	
<b>CONTRATACIONES</b>						
...	...	...	...	...	...	...
<b>PROYECCIONES</b>						
...	...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL</b>						0.00

  
 ...  
 ...

MEMORIAS DE PAVIMENTO																																																																			
FECHA	DD	MM	AA	DE	CURSO No.																																																														
OBJETO DEL CONTRATO	UNIDAD COMUNITARIA DE LAS CALLES DEL SUJETO Y ALCAÑTARILLOS DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CALLES 10 Y 11 - CARRETERA 30 ENTRE CALLE 11 - 12A EN EL CASO URBANO QUAREZ VILLA DEL RAYO DEL MUNICIPIO DE IZAPALA																																																																		
EMPRESA	MEL CONSTRUCTORES S.A.S																																																																		
PROYECTO	MHO. PAVIMENTO DE CALLES																																																																		
SECTOR	1.0	PRELIMINAR	NO. CANTON	1.01	LOCALIDAD	Los Ahueses, Municipio, cantón de Ocosingo	USUARIO	MUNICIPIO	VILLAFRANCA																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">MES</th> <th rowspan="2">MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>ANCHO</th> <th>LARGO</th> <th>ALTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">CONCRETADOS</td> </tr> <tr> <td>INDICACION REGIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>INDICACION LOCAL DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">PROYECTADOS</td> </tr> <tr> <td>INDICACION REGIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>INDICACION LOCAL DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MES	MEDIDA TOTAL	ANCHO	LARGO	ALTO	CONCRETADOS						INDICACION REGIONAL				2.00	2.00	INDICACION LOCAL DE OBRA				TOTAL	2.00	PROYECTADOS						INDICACION REGIONAL				1.00	1.00	INDICACION LOCAL DE OBRA				TOTAL	1.00	TOTAL											2.00	2.00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MES	MEDIDA TOTAL																																																														
	ANCHO	LARGO	ALTO																																																																
CONCRETADOS																																																																			
INDICACION REGIONAL				2.00	2.00																																																														
INDICACION LOCAL DE OBRA				TOTAL	2.00																																																														
PROYECTADOS																																																																			
INDICACION REGIONAL				1.00	1.00																																																														
INDICACION LOCAL DE OBRA				TOTAL	1.00																																																														
TOTAL																																																																			
					2.00	2.00																																																													
																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">SUSCRIPCIONES:</td> <td colspan="5">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										SUSCRIPCIONES:					TOTAL																																																				
SUSCRIPCIONES:					TOTAL																																																														
																																																																			
MHO. PAVIMENTO DE CALLES INDICACION REGIONAL INDICACION LOCAL DE OBRA					MHO. PAVIMENTO DE CALLES INDICACION REGIONAL INDICACION LOCAL DE OBRA																																																														

PROYECTOS DE CONSTRUCCION

FECHA	DD	MM	AAAA	HORA	MIN	SEG

PROYECTO DE

CONSTRUCCION DE

OBJETO DEL CONTRATO: **CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA Y ALBERGUE PARA DESPLAZADOS EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LA VILLA PARADO DEL TAJAMON, MUNICIPIO DE LA VILLA PARADO DEL TAJAMON, GUATEMALA.**

EMPRESA: **CONSTRUCCIONES S.A.**

PROYECTO: **PROYECTO 2.4.3**

SUPERVISOR: **ING. WILSON FERNANDEZ ARON COMEL**

ESTADO: **PRELIMINAR**

NUM. CONTRATO: **1.00**

CONTRATO No. **0048** VOLUMEN No. **001** DE **001**

CONTRATO No. **1-1709** FOLIO No. **187** DE **232**

DESCRIPCION	UNIDAD	M	PRECIO UNITARIO	VALOR	%	DESCRIPCION		M	PRECIO UNITARIO	VALOR	
						ANCHO	ALTO				
<b>COMPRAS</b>											
ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA		22.25	1.00	22.25	1.00					22.25	
ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA		29.20	1.00	29.20	1.00					29.20	
ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA		45.20	1.00	45.20	1.00					45.20	
ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA		59.30	1.00	59.30	1.00					59.30	
ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA		55.20	1.00	55.20	1.00					55.20	
<b>TOTAL</b>										<b>206.15</b>	
<b>PRELIMINAR</b>											
ALICATADO DE LA OBRA		25.20	1.00	25.20	1.00					25.20	
ALICATADO DE LA OBRA		29.20	1.00	29.20	1.00					29.20	
ALICATADO DE LA OBRA		25.20	1.00	25.20	1.00					25.20	
ALICATADO DE LA OBRA		25.20	1.00	25.20	1.00					25.20	
ALICATADO DE LA OBRA		29.20	1.00	29.20	1.00					29.20	
<b>TOTAL</b>										<b>134.00</b>	

CONSTRUCCIONES S.A.

ING. WILSON FERNANDEZ ARON COMEL

CONSTRUCCIONES S.A.

ING. WILSON FERNANDEZ ARON COMEL

CONSTRUCCIONES S.A.

ING. WILSON FERNANDEZ ARON COMEL



















MEMORIAL DE LA OBRA

LOCALIDAD:  MUNICIPIO:  DEPARTAMENTO:

OBJETO DEL CONTRATO: **DEPTO. CONCEPCION LA RINCONADA AGUADO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 7 EN LA CARRERA DE CATEDRAL Y 7 EN EL MUNICIPIO DE BARRIO MARIANO VILLA FABIANO DE MUNICIPIO DE TIBURCIO**

CONTRATISTA: **CONSTRUCION TORO S.A.S**

INGENIERO: **ING. ORDO LIZBARRU ARRIOLA GOMEZ**

VALOR DEL CONTRATO: **2.16** MIL MILONES DE DOLARES

UNIDAD	M	UBICACION PROYECTO	DIMENSIONES		M <sup>2</sup> SUPERFICIE	USOS
			ANCHO	ALTO		
<b>COMPRADAS</b>						
LOGARITMICO						
CALLE 7 CARRERA 3						
<b>PROYECTADAS</b>						
CALLE 7 CARRERA 3						
TOTAL: 2.16						

OBSERVACIONES:

**ING. PEDRO PERALTA ARRIOLA GOMEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO  
 INTERINO S.A.S  
 CONCEPCION DEPARTAMENTO DE TIBURCIO

**CONSTRUCION TORO S.A.S**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 INTERINO S.A.S  
 CONCEPCION DEPARTAMENTO DE TIBURCIO



**MEMORIAS DE CALCULO**

ESCALA: DO    1/4" = 1'-0"    CONTRATO: 1

OBJETO DEL CONTRATO: **PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA**  
 DESCRIPCION: **RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA**  
 SUPERVISOR: **ING. DIEGO FERRER**  
 CAPITULO: **III**    SUB-PROYECTO: **3.1**    TEMÁTICA: **RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA PATRIA**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD		CONTRATO NO.	CANTIDAD	MATERIAL	NOMBRE DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD								
CARRERA 143	CONCRETO	ALTO	4170.00	1.00	4170.00	CONCRETO	m <sup>3</sup>	1.00	4170.00	4170.00
		BARRAS	200.00	1.00	200.00	BARRAS	m <sup>3</sup>	1.00	200.00	200.00
CARRERA 143	CONCRETO	ALTO	200.00	1.00	200.00	CONCRETO	m <sup>3</sup>	1.00	200.00	200.00
		BARRAS	100.00	1.00	100.00	BARRAS	m <sup>3</sup>	1.00	100.00	100.00
<b>TOTALES</b>										
										<b>2.00</b>

**ING. DIEGO FERRER**  
 SUPERVISOR  
 BOGOTÁ, COLOMBIA

**ING. DIEGO FERRER**  
 SUPERVISOR  
 BOGOTÁ, COLOMBIA

**CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
 BOGOTÁ, COLOMBIA

**TOTAL: 2.00**  
**4.00**







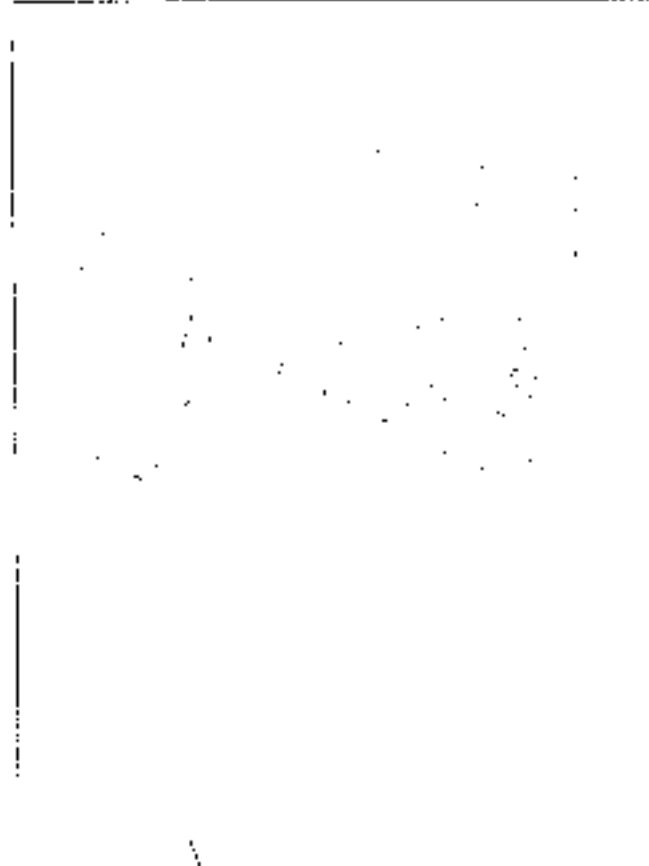








1. NAME OF THE COMPANY: <b>REDEEMER BANK</b>		2. ADDRESS: <b>1000 N. W. 10th St., Miami, Fla. 33136</b>	
3. TYPE OF INVESTMENT: <b>COMMERCIAL</b>		4. DATE OF INVESTMENT: <b>1/15/78</b>	
5. AMOUNT INVESTED: <b>100,000.00</b>		6. PERIOD OF INVESTMENT: <b>12 MONTHS</b>	
7. TYPE OF SECURITY: <b>DEPOSIT</b>		8. RISK FACTOR: <b>LOW</b>	



COMPARISONS					
DESCRIPTION	AMOUNT	PERCENT	PERCENT	PERCENT	PERCENT
<b>COMPARISONS</b>					
1. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
2. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
3. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
<b>PROPERTY</b>					
4. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
5. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
6. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
7. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
8. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
9. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
10. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
11. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
12. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
13. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
14. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
15. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
16. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
17. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
18. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
19. COMMERCIAL	100	100	100	100	100
20. COMMERCIAL	100	100	100	100	100

Prepared by: *[Signature]* Date: *[Date]*  
 Reviewed by: *[Signature]* Date: *[Date]*



CLASSIFICATION	SECRET	GROUP	SECRET	CONTROL	SECRET
CLASSIFICATION	SECRET	GROUP	SECRET	CONTROL	SECRET

OPERATION	PERFORMANCE			STATUS
	START	END	ACTUAL	
OPERATION 1	1950-01-01	1950-01-31	1950-01-31	COMPLETED
OPERATION 2	1950-02-01	1950-02-28	1950-02-28	COMPLETED
OPERATION 3	1950-03-01	1950-03-31	1950-03-31	COMPLETED
OPERATION 4	1950-04-01	1950-04-30	1950-04-30	COMPLETED
OPERATION 5	1950-05-01	1950-05-31	1950-05-31	COMPLETED
OPERATION 6	1950-06-01	1950-06-30	1950-06-30	COMPLETED
OPERATION 7	1950-07-01	1950-07-31	1950-07-31	COMPLETED
OPERATION 8	1950-08-01	1950-08-31	1950-08-31	COMPLETED
OPERATION 9	1950-09-01	1950-09-30	1950-09-30	COMPLETED
OPERATION 10	1950-10-01	1950-10-31	1950-10-31	COMPLETED
OPERATION 11	1950-11-01	1950-11-30	1950-11-30	COMPLETED
OPERATION 12	1950-12-01	1950-12-31	1950-12-31	COMPLETED
OPERATION 13	1951-01-01	1951-01-31	1951-01-31	COMPLETED
OPERATION 14	1951-02-01	1951-02-28	1951-02-28	COMPLETED
OPERATION 15	1951-03-01	1951-03-31	1951-03-31	COMPLETED
OPERATION 16	1951-04-01	1951-04-30	1951-04-30	COMPLETED
OPERATION 17	1951-05-01	1951-05-31	1951-05-31	COMPLETED
OPERATION 18	1951-06-01	1951-06-30	1951-06-30	COMPLETED
OPERATION 19	1951-07-01	1951-07-31	1951-07-31	COMPLETED
OPERATION 20	1951-08-01	1951-08-31	1951-08-31	COMPLETED
OPERATION 21	1951-09-01	1951-09-30	1951-09-30	COMPLETED
OPERATION 22	1951-10-01	1951-10-31	1951-10-31	COMPLETED
OPERATION 23	1951-11-01	1951-11-30	1951-11-30	COMPLETED
OPERATION 24	1951-12-01	1951-12-31	1951-12-31	COMPLETED
OPERATION 25	1952-01-01	1952-01-31	1952-01-31	COMPLETED
OPERATION 26	1952-02-01	1952-02-28	1952-02-28	COMPLETED
OPERATION 27	1952-03-01	1952-03-31	1952-03-31	COMPLETED
OPERATION 28	1952-04-01	1952-04-30	1952-04-30	COMPLETED
OPERATION 29	1952-05-01	1952-05-31	1952-05-31	COMPLETED
OPERATION 30	1952-06-01	1952-06-30	1952-06-30	COMPLETED
OPERATION 31	1952-07-01	1952-07-31	1952-07-31	COMPLETED
OPERATION 32	1952-08-01	1952-08-31	1952-08-31	COMPLETED
OPERATION 33	1952-09-01	1952-09-30	1952-09-30	COMPLETED
OPERATION 34	1952-10-01	1952-10-31	1952-10-31	COMPLETED
OPERATION 35	1952-11-01	1952-11-30	1952-11-30	COMPLETED
OPERATION 36	1952-12-01	1952-12-31	1952-12-31	COMPLETED
OPERATION 37	1953-01-01	1953-01-31	1953-01-31	COMPLETED
OPERATION 38	1953-02-01	1953-02-28	1953-02-28	COMPLETED
OPERATION 39	1953-03-01	1953-03-31	1953-03-31	COMPLETED
OPERATION 40	1953-04-01	1953-04-30	1953-04-30	COMPLETED
OPERATION 41	1953-05-01	1953-05-31	1953-05-31	COMPLETED
OPERATION 42	1953-06-01	1953-06-30	1953-06-30	COMPLETED
OPERATION 43	1953-07-01	1953-07-31	1953-07-31	COMPLETED
OPERATION 44	1953-08-01	1953-08-31	1953-08-31	COMPLETED
OPERATION 45	1953-09-01	1953-09-30	1953-09-30	COMPLETED
OPERATION 46	1953-10-01	1953-10-31	1953-10-31	COMPLETED
OPERATION 47	1953-11-01	1953-11-30	1953-11-30	COMPLETED
OPERATION 48	1953-12-01	1953-12-31	1953-12-31	COMPLETED
OPERATION 49	1954-01-01	1954-01-31	1954-01-31	COMPLETED
OPERATION 50	1954-02-01	1954-02-28	1954-02-28	COMPLETED

SECRET

SECRET

SECRET
